


ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	<div> <div>July</div> <div>January</div> <div>July</div> <div>January</div> </div>			
140	Elaboración, publicacion, analisis de SP, lista corta y aprobacion	25 days	Fri Jul 19	Wed Aug 28	\$0.00				
141	Sol y No Objecion de BID	6 days	Thu Aug 29	Thu Sep 5	\$0.00				
142	Invitación, preparación, Presentación, eval propuestas tecnicas y acta	30 days	Fri Sep 6	Thu Oct 17	\$0.00				
143	Sol y No Objecion de BID	6 days	Fri Oct 18	Fri Oct 25	\$0.00				
144	notificacion resultados, Eval propuestas comb calidad y costo, elab acta de adjudicacion, notificacion, negociacion	30 days	Mon Oct 28	Fri Dec 6	\$0.00				
145	Sol y No Objecion de BID	6 days	Mon Dec 9	Mon Dec 16	\$0.00				
146	Publicacion de la adjudicación, firma de contrato, distribucion a BID, num Prism, presentacion de garantias	22 days	Tue Dec 17	Thu Jan 30	\$0.00				
147	<b>Ejecucion de la Supervision</b>	<b>350 days</b>	<b>Fri Feb 21</b>	<b>Mon Jun 28</b>	<b>\$685,961.00</b>				
148	Orden de inicio	0 days	Fri Feb 21	Fri Feb 21	\$0.00				
149	Pago 1	20 days	Fri Feb 21	Thu Mar 19	\$45,731.00				
150	Pago 2	20 days	Fri Mar 20	Thu Apr 16	\$45,731.00				
151	Pago 3	20 days	Fri Apr 17	Fri May 15	\$45,731.00				
152	Pago 4	20 days	Mon May 18	Fri Jun 12	\$45,731.00				
153	Pago 5	20 days	Mon Jun 15	Mon Jul 13	\$45,731.00				
154	Pago 6	20 days	Tue Jul 14	Mon Aug 10	\$45,731.00				
155	Pago 7	20 days	Tue Aug 11	Mon Sep 7	\$45,731.00				
156	Pago 8	20 days	Tue Sep 8	Mon Oct 5	\$45,731.00				
157	Pago 9	20 days	Tue Oct 6	Mon Nov 2	\$45,731.00				
158	Pago 10	20 days	Tue Nov 3	Mon Nov 30	\$45,731.00				
159	Pago 11	20 days	Tue Dec 1	Mon Dec 28	\$45,731.00				
160	Pago 12	20 days	Tue Dec 29	Mon Jan 25	\$45,731.00				
161	Pago 13	20 days	Tue Jan 26	Mon Feb 22	\$45,731.00				
162	Pago 14	20 days	Tue Feb 23	Mon Mar 22	\$45,731.00				
163	Pago 15	70 days	Tue Mar 23	Mon Jun 28	\$45,727.00				
164	<b>Ejecucion de Construcción (LPN)</b>	<b>500 days</b>	<b>Fri Jun 28</b>	<b>Mon Jun 21</b>	<b>\$9,146,154.00</b>				
165	<b>Proceso de Contratacion</b>	<b>165 days</b>	<b>Fri Jun 28</b>	<b>Thu Mar 5</b>	<b>\$0.00</b>				
166	Elaboración, rev bases de licitación, sol de contratacion, confirmacion fondos	60 days	Fri Jun 28	Wed Sep 25	\$0.00				
167	Sol y No Objecion de BID a documentos y anuncio	15 days	Thu Sep 26	Wed Oct 16	\$0.00				
168	Publicacion, Preparacion, presentacion, apertura, evaluacion y adjudicacion	60 days	Thu Oct 17	Thu Jan 23	\$0.00				
169	Notificacion, firma de contrato y presentacion de garantias	30 days	Fri Jan 24	Thu Mar 5	\$0.00				
170	<b>Ejecución de la obra</b>	<b>335 days</b>	<b>Thu Mar 5</b>	<b>Mon Jun 21</b>	<b>\$9,146,154.00</b>				
171	Orden de Inicio Obra	0 days	Thu Mar 5	Thu Mar 5	\$0.00				
172	Estimación 1	20 days	Fri Mar 6	Thu Apr 2	\$609,744.00				
173	Estimación 2	20 days	Fri Apr 3	Thu Apr 30	\$609,744.00				
174	Estimación 3	20 days	Mon May 4	Fri May 29	\$609,744.00				
175	Estimación 4	20 days	Mon Jun 1	Mon Jun 29	\$609,744.00				
176	Estimación 5	20 days	Tue Jun 30	Mon Jul 27	\$609,744.00				
177	Estimación 6	20 days	Tue Jul 28	Mon Aug 24	\$609,744.00				
178	Estimación 7	20 days	Tue Aug 25	Mon Sep 21	\$609,744.00				
179	Estimación 8	20 days	Tue Sep 22	Mon Oct 19	\$609,744.00				
180	Estimación 9	20 days	Tue Oct 20	Mon Nov 16	\$609,744.00				
181	Estimación 10	20 days	Tue Nov 17	Mon Dec 14	\$609,744.00				
182	Estimación 11	20 days	Tue Dec 15	Mon Jan 11	\$609,744.00				
183	Estimación 12	20 days	Tue Jan 12	Mon Feb 8	\$609,744.00				
184	Estimación 13	20 days	Tue Feb 9	Mon Mar 8	\$609,744.00				
185	Estimación 14	20 days	Tue Mar 9	Mon Apr 5	\$609,744.00				

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	July	January	July	January
186	Liquidación	55 days	Tue Apr 6	Mon Jun 21	\$609,738.00				
187	<b>Construcción Carretera Tramo: Santa Cruz Barillas - río Espiritu</b>	<b>615 days</b>	<b>Fri Mar 20</b>	<b>Mon Aug 1</b>	<b>\$23,350,100.00</b>			6/12/19	
188	<b>Supervision de Obra (SBCC Exante)</b>	<b>570 days</b>	<b>Fri Apr 3</b>	<b>Mon Jun 13</b>	<b>\$1,629,077.00</b>				
189	<b>Proceso de Contratacion</b>	<b>155 days</b>	<b>Fri Apr 3</b>	<b>Mon Nov 9</b>	<b>\$0.00</b>				
190	Elaboración TDRs, presupuesto, sol de contratacion, y confirmacion fondos	30 days	Fri Apr 3	Fri May 15	\$0.00				
191	Elaboracion, publicacion, analisis de SP, lista corta y aprobacion	25 days	Mon May 18	Mon Jun 22	\$0.00				
192	Sol y No Objecion de BID	6 days	Tue Jun 23	Tue Jun 30	\$0.00				
193	Invitación, preparación, Presentación, eval propuestas tecnicas y acta	30 days	Wed Jul 1	Tue Aug 11	\$0.00				
194	Sol y No Objecion de BID	6 days	Wed Aug 12	Wed Aug 19	\$0.00				
195	notificacion resultados, Eval propuestas comb calidad y costo, elab acta de adjudicacion, notificacion, negociacion	30 days	Thu Aug 20	Wed Sep 30	\$0.00				
196	Sol y No Objecion de BID	6 days	Thu Oct 1	Thu Oct 8	\$0.00				
197	Publicacion de la adjudicación, firma de contrato, distribucion a BID, num Prism, presentacion de garantias	22 days	Fri Oct 9	Mon Nov 9	\$0.00				
198	<b>Ejecucion de la Supervision</b>	<b>400 days</b>	<b>Tue Dec 1</b>	<b>Mon Jun 13</b>	<b>\$1,629,077.00</b>				
199	Orden de inicio	0 days	Tue Dec 1	Tue Dec 1	\$0.00				
200	Pago 1	20 days	Tue Dec 1	Mon Dec 28	\$81,453.84				
201	Pago 2	20 days	Tue Dec 29	Mon Jan 25	\$81,453.84				
202	Pago 3	20 days	Tue Jan 26	Mon Feb 22	\$81,453.84				
203	Pago 4	20 days	Tue Feb 23	Mon Mar 22	\$81,453.84				
204	Pago 5	20 days	Tue Mar 23	Mon Apr 19	\$81,453.84				
205	Pago 6	20 days	Tue Apr 20	Mon May 17	\$81,453.84				
206	Pago 7	20 days	Tue May 18	Mon Jun 14	\$81,453.84				
207	Pago 8	20 days	Tue Jun 15	Mon Jul 12	\$81,453.84				
208	Pago 9	20 days	Tue Jul 13	Mon Aug 9	\$81,453.84				
209	Pago 10	20 days	Tue Aug 10	Mon Sep 6	\$81,453.84				
210	Pago 11	20 days	Tue Sep 7	Mon Oct 4	\$81,453.84				
211	Pago 12	20 days	Tue Oct 5	Mon Nov 1	\$81,453.84				
212	Pago 13	20 days	Tue Nov 2	Mon Nov 29	\$81,453.84				
213	Pago 14	20 days	Tue Nov 30	Mon Dec 27	\$81,453.84				
214	Pago 15	20 days	Tue Dec 28	Mon Jan 24	\$81,453.84				
215	Pago 16	20 days	Tue Jan 25	Mon Feb 21	\$81,453.84				
216	Pago 17	20 days	Tue Feb 22	Mon Mar 21	\$81,453.84				
217	Pago 18	20 days	Tue Mar 22	Mon Apr 18	\$81,453.84				
218	Pago 19	20 days	Tue Apr 19	Mon May 16	\$81,453.84				
219	Pago 20	20 days	Tue May 17	Mon Jun 13	\$81,454.04				
220	<b>Ejecucion de Construcción (LPI)</b>	<b>615 days</b>	<b>Fri Mar 20</b>	<b>Mon Aug 1</b>	<b>\$21,721,023.00</b>				
221	<b>Proceso de Contratacion</b>	<b>200 days</b>	<b>Fri Mar 20</b>	<b>Mon Dec 28</b>	<b>\$0.00</b>				
222	Elaboración, rev bases de licitación, sol de contratacion, confirmacion fondos	60 days	Fri Mar 20	Fri Jun 12	\$0.00				
223	Sol y No Objecion de BID a documentos y anuncio	15 days	Mon Jun 15	Mon Jul 6	\$0.00				
224	Publicacion, Preparacion, presentacion, apertura, evaluacion y adjudicacion	75 days	Tue Jul 7	Mon Oct 19	\$0.00				
225	Notificacion, firma de contrato y presentacion de garantias	50 days	Tue Oct 20	Mon Dec 28	\$0.00				
226	<b>Ejecución de la obra</b>	<b>415 days</b>	<b>Mon Dec 28</b>	<b>Mon Aug 1</b>	<b>\$21,721,023.00</b>				
227	Orden de Inicio Obra	0 days	Mon Dec 28	Mon Dec 28	\$0.00				
228	Estimación 1	20 days	Tue Dec 29	Mon Jan 25	\$1,143,211.74				
229	Estimación 2	20 days	Tue Jan 26	Mon Feb 22	\$1,143,211.74				

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	<div> <div>July</div> <div>January</div> <div>July</div> <div>January</div> </div>			
230	Estimación 3	20 days	Tue Feb 23	Mon Mar 22	\$1,143,211.74				
231	Estimación 4	20 days	Tue Mar 23	Mon Apr 19	\$1,143,211.74				
232	Estimación 5	20 days	Tue Apr 20	Mon May 17	\$1,143,211.74				
233	Estimación 6	20 days	Tue May 18	Mon Jun 14	\$1,143,211.74				
234	Estimación 7	20 days	Tue Jun 15	Mon Jul 12	\$1,143,211.74				
235	Estimación 8	20 days	Tue Jul 13	Mon Aug 9	\$1,143,211.74				
236	Estimación 9	20 days	Tue Aug 10	Mon Sep 6	\$1,143,211.74				
237	Estimación 10	20 days	Tue Sep 7	Mon Oct 4	\$1,143,211.74				
238	Estimación 11	20 days	Tue Oct 5	Mon Nov 1	\$1,143,211.74				
239	Estimación 12	20 days	Tue Nov 2	Mon Nov 29	\$1,143,211.74				
240	Estimación 13	20 days	Tue Nov 30	Mon Dec 27	\$1,143,211.74				
241	Estimación 14	20 days	Tue Dec 28	Mon Jan 24	\$1,143,211.74				
242	Estimación 15	20 days	Tue Jan 25	Mon Feb 21	\$1,143,211.74				
243	Estimación 16	20 days	Tue Feb 22	Mon Mar 21	\$1,143,211.74				
244	Estimación 17	20 days	Tue Mar 22	Mon Apr 18	\$1,143,211.74				
245	Estimación 18	20 days	Tue Apr 19	Mon May 16	\$1,143,211.74				
246	Liquidación	55 days	Tue May 17	Mon Aug 1	\$1,143,211.68				
247	<b>Mejoramiento Carretera Ruta RD-ESC-06, Tramo: Bifurcación RN-14, El Rodeo - Bifurcación CA-02 Occidente, Siquinalá, Supervision de Obra (SBCC Exante)</b>	<b>620 days</b>	<b>Tue Apr 30</b>	<b>Mon Oct 11</b>	<b>\$21,682,236.00</b>				
248		<b>610 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Mon Oct 11</b>	<b>\$1,512,714.00</b>				
249	<b>Proceso de Contratacion</b>	<b>155 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Thu Jan 9</b>	<b>\$0.00</b>				
250	Elaboración TDRs, presupuesto, sol de contratacion, y confirmacion fondos	30 days	Thu May 16	Thu Jun 27	\$0.00				
251	Elaboracion, publicacion, analisis de SP, lista corta y aprobacion	25 days	Fri Jun 28	Wed Aug 7	\$0.00				
252	Sol y No Objecion de BID	6 days	Thu Aug 8	Thu Aug 15	\$0.00				
253	Invitación, preparación, Presentación, eval propuestas tecnicas y acta	30 days	Fri Aug 16	Thu Sep 26	\$0.00				
254	Sol y No Objecion de BID	6 days	Fri Sep 27	Fri Oct 4	\$0.00				
255	notificacion resultados, Eval propuestas comb calidad y costo, elab acta de adjudicacion, notificacion, negociacion	30 days	Mon Oct 7	Fri Nov 15	\$0.00				
256	Sol y No Objecion de BID	6 days	Mon Nov 18	Mon Nov 25	\$0.00				
257	Publicacion de la adjudicación, firma de contrato, distribucion a BID, num Prism, presentacion de garantias	22 days	Tue Nov 26	Thu Jan 9	\$0.00				
258	<b>Ejecucion de la Supervision</b>	<b>440 days</b>	<b>Fri Jan 31</b>	<b>Mon Oct 11</b>	<b>\$1,512,714.00</b>				
259	Orden de inicio	0 days	Fri Jan 31	Fri Jan 31	\$0.00				
260	Pago 1	20 days	Fri Jan 31	Thu Feb 27	\$75,635.71				
261	Pago 2	20 days	Fri Feb 28	Thu Mar 26	\$75,635.71				
262	Pago 3	20 days	Fri Mar 27	Thu Apr 23	\$75,635.71				
263	Pago 4	20 days	Fri Apr 24	Fri May 22	\$75,635.71				
264	Pago 5	20 days	Mon May 25	Mon Jun 22	\$75,635.71				
265	Pago 6	20 days	Tue Jun 23	Mon Jul 20	\$75,635.71				
266	Pago 7	20 days	Tue Jul 21	Mon Aug 17	\$75,635.71				
267	Pago 8	20 days	Tue Aug 18	Mon Sep 14	\$75,635.71				
268	Pago 9	20 days	Tue Sep 15	Mon Oct 12	\$75,635.71				
269	Pago 10	20 days	Tue Oct 13	Mon Nov 9	\$75,635.71				
270	Pago 11	20 days	Tue Nov 10	Mon Dec 7	\$75,635.71				
271	Pago 12	20 days	Tue Dec 8	Mon Jan 4	\$75,635.71				
272	Pago 13	20 days	Tue Jan 5	Mon Feb 1	\$75,635.71				
273	Pago 14	20 days	Tue Feb 2	Mon Mar 1	\$75,635.71				
274	Pago 15	20 days	Tue Mar 2	Mon Mar 29	\$75,635.71				
275	Pago 16	20 days	Tue Mar 30	Mon Apr 26	\$75,635.71				

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	<div> <div>July</div> <div>January</div> <div>July</div> <div>January</div> </div>			
276	Pago 17	20 days	Tue Apr 27	Mon May 24	\$75,635.71				
277	Pago 18	20 days	Tue May 25	Mon Jun 21	\$75,635.71				
278	Pago 19	20 days	Tue Jun 22	Mon Jul 19	\$75,635.71				
279	Pago 20	60 days	Tue Jul 20	Mon Oct 11	\$75,635.51				
280	<b>Ejecucion de Construcción (LPI)</b>	<b>615 days</b>	<b>Tue Apr 30</b>	<b>Mon Oct 4</b>	<b>\$20,169,522.00</b>				
281	<b>Proceso de Contratacion</b>	<b>200 days</b>	<b>Tue Apr 30</b>	<b>Thu Feb 27</b>	<b>\$0.00</b>				
282	Elaboración, rev bases de licitación, sol de contratacion, confirmacion fondos	60 days	Tue Apr 30	Thu Jul 25	\$0.00				
283	Sol y No Objecion de BID a documentos y anuncio	15 days	Fri Jul 26	Wed Aug 21	\$0.00				
284	Publicacion, Preparacion, presentacion, apertura, evaluacion y adjudicacion	75 days	Thu Aug 22	Wed Dec 4	\$0.00				
285	Notificacion, firma de contrato y presentacion de garantias	50 days	Thu Dec 5	Thu Feb 27	\$0.00				
286	<b>Ejecucion de la obra</b>	<b>415 days</b>	<b>Thu Feb 27</b>	<b>Mon Oct 4</b>	<b>\$20,169,522.00</b>				
287	Orden de Inicio Obra	0 days	Thu Feb 27	Thu Feb 27	\$0.00				
288	Estimación 1	20 days	Fri Feb 28	Thu Mar 26	\$1,061,553.76				
289	Estimación 2	20 days	Fri Mar 27	Thu Apr 23	\$1,061,553.76				
290	Estimación 3	20 days	Fri Apr 24	Fri May 22	\$1,061,553.76				
291	Estimación 4	20 days	Mon May 25	Mon Jun 22	\$1,061,553.76				
292	Estimación 5	20 days	Tue Jun 23	Mon Jul 20	\$1,061,553.76				
293	Estimación 6	20 days	Tue Jul 21	Mon Aug 17	\$1,061,553.76				
294	Estimación 7	20 days	Tue Aug 18	Mon Sep 14	\$1,061,553.76				
295	Estimación 8	20 days	Tue Sep 15	Mon Oct 12	\$1,061,553.76				
296	Estimación 9	20 days	Tue Oct 13	Mon Nov 9	\$1,061,553.76				
297	Estimación 10	20 days	Tue Nov 10	Mon Dec 7	\$1,061,553.76				
298	Estimación 11	20 days	Tue Dec 8	Mon Jan 4	\$1,061,553.76				
299	Estimación 12	20 days	Tue Jan 5	Mon Feb 1	\$1,061,553.76				
300	Estimación 13	20 days	Tue Feb 2	Mon Mar 1	\$1,061,553.76				
301	Estimación 14	20 days	Tue Mar 2	Mon Mar 29	\$1,061,553.76				
302	Estimación 15	20 days	Tue Mar 30	Mon Apr 26	\$1,061,553.76				
303	Estimación 16	20 days	Tue Apr 27	Mon May 24	\$1,061,553.76				
304	Estimación 17	20 days	Tue May 25	Mon Jun 21	\$1,061,553.76				
305	Estimación 18	20 days	Tue Jun 22	Mon Jul 19	\$1,061,553.76				
306	Liquidación	55 days	Tue Jul 20	Mon Oct 4	\$1,061,554.32				
307	<b>Mejoramiento Carretera, Tramo: Todos Santos Cuchumatán -Aldea San Martín - Concepción Huista, Huehuetenango</b>	<b>625 days</b>	<b>Tue Apr 30</b>	<b>Mon Oct 18</b>	<b>\$15,010,778.00</b>				
308	<b>Supervision de Obra (SBCC Exante)</b>	<b>615 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Mon Oct 18</b>	<b>\$1,047,264.00</b>				
309	<b>Proceso de Contratacion</b>	<b>155 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Thu Jan 9</b>	<b>\$0.00</b>				
310	Elaboración TDRs, presupuesto, sol de contratacion, y confirmacion fondos	30 days	Thu May 16	Thu Jun 27	\$0.00				
311	Elaboracion, publicacion, analisis de SP, lista corta y aprobacion	25 days	Fri Jun 28	Wed Aug 7	\$0.00				
312	Sol y No Objecion de BID	6 days	Thu Aug 8	Thu Aug 15	\$0.00				
313	Invitación, preparación, Presentación, eval propuestas tecnicas y acta	30 days	Fri Aug 16	Thu Sep 26	\$0.00				
314	Sol y No Objecion de BID	6 days	Fri Sep 27	Fri Oct 4	\$0.00				
315	notificacion resultados, Eval propuestas comb calidad y costo, elab acta de adjudicacion, notificacion, negociacion	30 days	Mon Oct 7	Fri Nov 15	\$0.00				
316	Sol y No Objecion de BID	6 days	Mon Nov 18	Mon Nov 25	\$0.00				
317	Publicacion de la adjudicación, firma de contrato, distribucion a BID, num Prism, presentacion de garantias	22 days	Tue Nov 26	Thu Jan 9	\$0.00				
318	<b>Ejecucion de la Supervision</b>	<b>445 days</b>	<b>Fri Jan 31</b>	<b>Mon Oct 18</b>	<b>\$1,047,264.00</b>				
319	Orden de inicio	0 days	Fri Jan 31	Fri Jan 31	\$0.00				

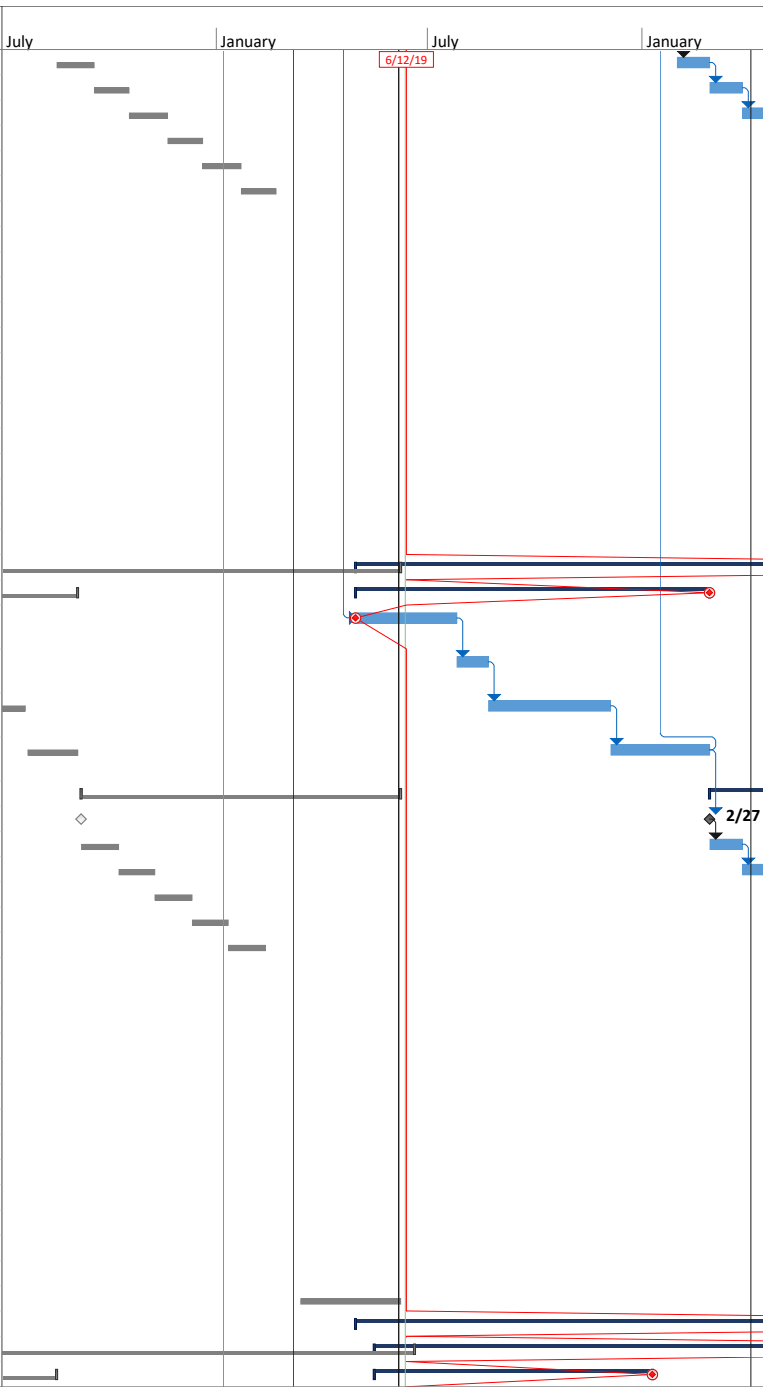


ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost				
320	Pago 1	20 days	Fri Jan 31	Thu Feb 27	\$52,363.18				
321	Pago 2	20 days	Fri Feb 28	Thu Mar 26	\$52,363.18				
322	Pago 3	20 days	Fri Mar 27	Thu Apr 23	\$52,363.18				
323	Pago 4	20 days	Fri Apr 24	Fri May 22	\$52,363.18				
324	Pago 5	20 days	Mon May 25	Mon Jun 22	\$52,363.18				
325	Pago 6	20 days	Tue Jun 23	Mon Jul 20	\$52,363.18				
326	Pago 7	20 days	Tue Jul 21	Mon Aug 17	\$52,363.18				
327	Pago 8	20 days	Tue Aug 18	Mon Sep 14	\$52,363.18				
328	Pago 9	20 days	Tue Sep 15	Mon Oct 12	\$52,363.18				
329	Pago 10	20 days	Tue Oct 13	Mon Nov 9	\$52,363.18				
330	Pago 11	20 days	Tue Nov 10	Mon Dec 7	\$52,363.18				
331	Pago 12	20 days	Tue Dec 8	Mon Jan 4	\$52,363.18				
332	Pago 13	20 days	Tue Jan 5	Mon Feb 1	\$52,363.18				
333	Pago 14	20 days	Tue Feb 2	Mon Mar 1	\$52,363.18				
334	Pago 15	20 days	Tue Mar 2	Mon Mar 29	\$52,363.18				
335	Pago 16	20 days	Tue Mar 30	Mon Apr 26	\$52,363.18				
336	Pago 17	20 days	Tue Apr 27	Mon May 24	\$52,363.18				
337	Pago 18	20 days	Tue May 25	Mon Jun 21	\$52,363.18				
338	Pago 19	20 days	Tue Jun 22	Mon Jul 19	\$52,363.18				
339	Pago 20	65 days	Tue Jul 20	Mon Oct 18	\$52,363.58				
340	<b>Ejecucion de Construcción (LPI)</b>	<b>615 days</b>	<b>Tue Apr 30</b>	<b>Mon Oct 4</b>	<b>\$13,963,514.00</b>				
341	<b>Proceso de Contratacion</b>	<b>200 days</b>	<b>Tue Apr 30</b>	<b>Thu Feb 27</b>	<b>\$0.00</b>				
342	Elaboración, rev bases de licitación, sol de contratacion, confirmacion fondos	60 days	Tue Apr 30	Thu Jul 25	\$0.00				
343	Sol y No Objecion de BID a documentos y anuncio	15 days	Fri Jul 26	Wed Aug 21	\$0.00				
344	Publicacion, Preparacion, presentacion, apertura, evaluacion y adjudicacion	75 days	Thu Aug 22	Wed Dec 4	\$0.00				
345	Notificacion, firma de contrato y presentacion de garantias	50 days	Thu Dec 5	Thu Feb 27	\$0.00				
346	<b>Ejecución de la obra</b>	<b>415 days</b>	<b>Thu Feb 27</b>	<b>Mon Oct 4</b>	<b>\$13,963,514.00</b>				
347	Orden de Inicio Obra	0 days	Thu Feb 27	Thu Feb 27	\$0.00				
348	Estimación 1	20 days	Fri Feb 28	Thu Mar 26	\$734,921.83				
349	Estimación 2	20 days	Fri Mar 27	Thu Apr 23	\$734,921.83				
350	Estimación 3	20 days	Fri Apr 24	Fri May 22	\$734,921.83				
351	Estimación 4	20 days	Mon May 25	Mon Jun 22	\$734,921.83				
352	Estimación 5	20 days	Tue Jun 23	Mon Jul 20	\$734,921.83				
353	Estimación 6	20 days	Tue Jul 21	Mon Aug 17	\$734,921.83				
354	Estimación 7	20 days	Tue Aug 18	Mon Sep 14	\$734,921.83				
355	Estimación 8	20 days	Tue Sep 15	Mon Oct 12	\$734,921.83				
356	Estimación 9	20 days	Tue Oct 13	Mon Nov 9	\$734,921.83				
357	Estimación 10	20 days	Tue Nov 10	Mon Dec 7	\$734,921.83				
358	Estimación 11	20 days	Tue Dec 8	Mon Jan 4	\$734,921.83				
359	Estimación 12	20 days	Tue Jan 5	Mon Feb 1	\$734,921.83				
360	Estimación 13	20 days	Tue Feb 2	Mon Mar 1	\$734,921.83				
361	Estimación 14	20 days	Tue Mar 2	Mon Mar 29	\$734,921.83				
362	Estimación 15	20 days	Tue Mar 30	Mon Apr 26	\$734,921.83				
363	Estimación 16	20 days	Tue Apr 27	Mon May 24	\$734,921.83				
364	Estimación 17	20 days	Tue May 25	Mon Jun 21	\$734,921.83				
365	Estimación 18	20 days	Tue Jun 22	Mon Jul 19	\$734,921.83				
366	Liquidación	55 days	Tue Jul 20	Mon Oct 4	\$734,921.06				
367		<b>625 days</b>	<b>Tue Apr 30</b>	<b>Mon Oct 18</b>	<b>\$30,855,489.00</b>				
368	<b>Supervision de Obra (SBCC Exante)</b>	<b>615 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Mon Oct 18</b>	<b>\$2,152,709.00</b>				
369	<b>Proceso de Contratacion</b>	<b>155 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Thu Jan 9</b>	<b>\$0.00</b>				




ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	<div> <div>July</div> <div>January</div> <div>July</div> <div>January</div> </div>			
370	Elaboración TDRs, presupuesto, sol de contratacion, y confirmacion fondos	30 days	Thu May 16	Thu Jun 27	\$0.00				
371	Elaboracion, publicacion, analisis de SP, lista corta y aprobacion	25 days	Fri Jun 28	Wed Aug 7	\$0.00				
372	Sol y No Objecion de BID	6 days	Thu Aug 8	Thu Aug 15	\$0.00				
373	Invitación, preparación, Presentación, eval propuestas tecnicas y acta	30 days	Fri Aug 16	Thu Sep 26	\$0.00				
374	Sol y No Objecion de BID	6 days	Fri Sep 27	Fri Oct 4	\$0.00				
375	notificacion resultados, Eval propuestas comb calidad y costo, elab acta de adjudicacion, notificacion, negociacion	30 days	Mon Oct 7	Fri Nov 15	\$0.00				
376	Sol y No Objecion de BID	6 days	Mon Nov 18	Mon Nov 25	\$0.00				
377	Publicacion de la adjudicacion, firma de contrato, distribucion a BID, num Prism, presentacion de garantias	22 days	Tue Nov 26	Thu Jan 9	\$0.00				
378	<b>Ejecucion de la Supervision</b>	<b>445 days</b>	<b>Fri Jan 31</b>	<b>Mon Oct 18</b>	<b>\$2,152,709.00</b>				
379	Orden de inicio	0 days	Fri Jan 31	Fri Jan 31	\$0.00				
380	Pago 1	20 days	Fri Jan 31	Thu Feb 27	\$107,635.43				
381	Pago 2	20 days	Fri Feb 28	Thu Mar 26	\$107,635.43				
382	Pago 3	20 days	Fri Mar 27	Thu Apr 23	\$107,635.43				
383	Pago 4	20 days	Fri Apr 24	Fri May 22	\$107,635.43				
384	Pago 5	20 days	Mon May 25	Mon Jun 22	\$107,635.43				
385	Pago 6	20 days	Tue Jun 23	Mon Jul 20	\$107,635.43				
386	Pago 7	20 days	Tue Jul 21	Mon Aug 17	\$107,635.43				
387	Pago 8	20 days	Tue Aug 18	Mon Sep 14	\$107,635.43				
388	Pago 9	20 days	Tue Sep 15	Mon Oct 12	\$107,635.43				
389	Pago 10	20 days	Tue Oct 13	Mon Nov 9	\$107,635.43				
390	Pago 11	20 days	Tue Nov 10	Mon Dec 7	\$107,635.43				
391	Pago 12	20 days	Tue Dec 8	Mon Jan 4	\$107,635.43				
392	Pago 13	20 days	Tue Jan 5	Mon Feb 1	\$107,635.43				
393	Pago 14	20 days	Tue Feb 2	Mon Mar 1	\$107,635.43				
394	Pago 15	20 days	Tue Mar 2	Mon Mar 29	\$107,635.43				
395	Pago 16	20 days	Tue Mar 30	Mon Apr 26	\$107,635.43				
396	Pago 17	20 days	Tue Apr 27	Mon May 24	\$107,635.43				
397	Pago 18	20 days	Tue May 25	Mon Jun 21	\$107,635.43				
398	Pago 19	20 days	Tue Jun 22	Mon Jul 19	\$107,635.43				
399	Pago 20	65 days	Tue Jul 20	Mon Oct 18	\$107,635.83				
400	<b>Ejecucion de Construcción (LPI)</b>	<b>615 days</b>	<b>Tue Apr 30</b>	<b>Mon Oct 4</b>	<b>\$28,702,780.00</b>				
401	<b>Proceso de Contratacion</b>	<b>200 days</b>	<b>Tue Apr 30</b>	<b>Thu Feb 27</b>	<b>\$0.00</b>				
402	Elaboración, rev bases de licitación, sol de contratacion, confirmacion fondos	60 days	Tue Apr 30	Thu Jul 25	\$0.00				
403	Sol y No Objecion de BID a documentos y anuncio	15 days	Fri Jul 26	Wed Aug 21	\$0.00				
404	Publicacion, Preparacion, presentacion, apertura, evaluacion y adjudicacion	75 days	Thu Aug 22	Wed Dec 4	\$0.00				
405	Notificacion, firma de contrato y presentacion de garantias	50 days	Thu Dec 5	Thu Feb 27	\$0.00				
406	<b>Ejecución de la obra</b>	<b>415 days</b>	<b>Thu Feb 27</b>	<b>Mon Oct 4</b>	<b>\$28,702,780.00</b>				
407	Orden de Inicio Obra	0 days	Thu Feb 27	Thu Feb 27	\$0.00				
408	Estimación 1	20 days	Fri Feb 28	Thu Mar 26	\$1,510,672.66				
409	Estimación 2	20 days	Fri Mar 27	Thu Apr 23	\$1,510,672.66				
410	Estimación 3	20 days	Fri Apr 24	Fri May 22	\$1,510,672.66				
411	Estimación 4	20 days	Mon May 25	Mon Jun 22	\$1,510,672.66				
412	Estimación 5	20 days	Tue Jun 23	Mon Jul 20	\$1,510,672.66				
413	Estimación 6	20 days	Tue Jul 21	Mon Aug 17	\$1,510,672.66				
414	Estimación 7	20 days	Tue Aug 18	Mon Sep 14	\$1,510,672.66				

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	July	January	July	January
415	Estimación 8	20 days	Tue Sep 15	Mon Oct 12	\$1,510,672.66				
416	Estimación 9	20 days	Tue Oct 13	Mon Nov 9	\$1,510,672.66				
417	Estimación 10	20 days	Tue Nov 10	Mon Dec 7	\$1,510,672.66				
418	Estimación 11	20 days	Tue Dec 8	Mon Jan 4	\$1,510,672.66				
419	Estimación 12	20 days	Tue Jan 5	Mon Feb 1	\$1,510,672.66				
420	Estimación 13	20 days	Tue Feb 2	Mon Mar 1	\$1,510,672.66				
421	Estimación 14	20 days	Tue Mar 2	Mon Mar 29	\$1,510,672.66				
422	Estimación 15	20 days	Tue Mar 30	Mon Apr 26	\$1,510,672.66				
423	Estimación 16	20 days	Tue Apr 27	Mon May 24	\$1,510,672.66				
424	Estimación 17	20 days	Tue May 25	Mon Jun 21	\$1,510,672.66				
425	Estimación 18	20 days	Tue Jun 22	Mon Jul 19	\$1,510,672.66				
426	Liquidación	55 days	Tue Jul 20	Mon Oct 4	\$1,510,672.12				
427	<b>DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PREINVERSION</b>	<b>1065 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Mon Jul 10</b>	<b>\$4,690,000.00</b>				
428	Estudios de Tramos por definir	500 days	Tue Jul 9	Wed Jun 30	\$1,136,000.00				
429	<b>Empresa consultora gerenciadora</b>	<b>970 days</b>	<b>Fri Jul 12</b>	<b>Mon Apr 24</b>	<b>\$1,000,000.00</b>				
430	Proceso de Contratación	120 days	Fri Jul 12	Thu Jan 16	\$0.00				
431	Ejecución del Contrato	850 days	Fri Jan 17	Mon Apr 24	\$1,000,000.00				
432	<b>Mantenimiento y Remodelación de Instalaciones</b>	<b>488 days</b>	<b>Fri Feb 28</b>	<b>Thu Jan 13</b>	<b>\$110,000.00</b>				
433	<b>Proceso de Contratacion (LPN)</b>	<b>248 days</b>	<b>Fri Feb 28</b>	<b>Thu Feb 11</b>	<b>\$0.00</b>				
434	Elaboración TDRs, presupuesto, sol de contratacion, y confirmacion fondos	30 days	Fri Feb 28	Thu Apr 9	\$0.00				
435	Elaboracion, publicacion, analisis de SP, lista corta y aprobacion	25 days	Fri Apr 10	Fri May 15	\$0.00				
436	Sol y No Objecion de BID	6 days	Mon May 18	Mon May 25	\$0.00				
437	Invitación, preparación, Presentación, eval propuestas tecnicas y acta	80 days	Tue May 26	Tue Sep 15	\$0.00				
438	Sol y No Objecion de BID	6 days	Wed Sep 16	Wed Sep 23	\$0.00				
439	notificacion resultados, Eval propuestas comb calidad y costo, elab acta de adjudicacion, notificacion, negociacion	50 days	Thu Sep 24	Wed Dec 2	\$0.00				
440	Sol y No Objecion de BID	6 days	Thu Dec 3	Thu Dec 10	\$0.00				
441	Publicacion de la adjudicación, firma de contrato, distribucion a BID, num Prism, presentacion de garantias	45 days	Fri Dec 11	Thu Feb 11	\$0.00				
442	<b>Ejecucion</b>	<b>240 days</b>	<b>Thu Feb 11</b>	<b>Thu Jan 13</b>	<b>\$110,000.00</b>				
443	Orden de inicio	0 days	Thu Feb 11	Thu Feb 11	\$0.00				
444	Pago 1	20 days	Fri Feb 12	Thu Mar 11	\$9,166.67				
445	Pago 2	20 days	Fri Mar 12	Thu Apr 8	\$9,166.67				
446	Pago 3	20 days	Fri Apr 9	Thu May 6	\$9,166.67				
447	Pago 4	20 days	Fri May 7	Thu Jun 3	\$9,166.67				
448	Pago 5	20 days	Fri Jun 4	Thu Jul 1	\$9,166.67				
449	Pago 6	20 days	Fri Jul 2	Thu Jul 29	\$9,166.67				
450	Pago 7	20 days	Fri Jul 30	Thu Aug 26	\$9,166.67				
451	Pago 8	20 days	Fri Aug 27	Thu Sep 23	\$9,166.67				
452	Pago 9	20 days	Fri Sep 24	Thu Oct 21	\$9,166.67				
453	Pago 10	20 days	Fri Oct 22	Thu Nov 18	\$9,166.67				
454	Pago 11	20 days	Fri Nov 19	Thu Dec 16	\$9,166.67				
455	Pago 12	20 days	Fri Dec 17	Thu Jan 13	\$9,166.63				
456	<b>Consultores Especialistas (8 procesos)</b>	<b>1045 days</b>	<b>Thu Jun 13</b>	<b>Mon Jul 10</b>	<b>\$739,000.00</b>				
457	Proceso de Contratación	45 days	Thu Jun 13	Wed Aug 21	\$0.00				
458	Ejecución del Contrato	1000 days	Thu Aug 22	Mon Jul 10	\$739,000.00				
459	<b>Equipamiento</b>	<b>195 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Thu Mar 5</b>	<b>\$1,065,000.00</b>				
460	<b>Compra de Vehiculos</b>	<b>195 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Thu Mar 5</b>	<b>\$168,000.00</b>				
461	Proceso de adquisición (LPN)	165 days	Thu May 16	Thu Jan 23	\$0.00				

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	July	January	July	January
462	Proceso de pago	30 days	Fri Jan 24	Thu Mar 5	\$168,000.00				
463	<b>Equipo Informatico y Software</b>	<b>195 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Thu Mar 5</b>	<b>\$97,000.00</b>				
464	Proceso de adquisición (LPN)	165 days	Thu May 16	Thu Jan 23	\$0.00				
465	Proceso de pago	30 days	Fri Jan 24	Thu Mar 5	\$97,000.00				
466	<b>Adquisición de equipamiento técnico (pesaje en movimiento, entre otros)</b>	<b>195 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Thu Mar 5</b>	<b>\$800,000.00</b>				
467	Proceso de adquisición (LPN)	165 days	Thu May 16	Thu Jan 23	\$0.00				
468	Proceso de pago	30 days	Fri Jan 24	Thu Mar 5	\$800,000.00				
469	<b>Capacitación</b>	<b>150 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Wed Dec 18</b>	<b>\$360,000.00</b>				
470	Proceso de contratación (SCC)	50 days	Thu May 16	Thu Jul 25	\$0.00				
471	Ejecución capacitación	100 days	Fri Jul 26	Wed Dec 18	\$360,000.00				
472	<b>Evaluación</b>	<b>1060 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Mon Jul 3</b>	<b>\$280,000.00</b>				
473	<b>Determinación de Línea Base del Programa</b>	<b>210 days</b>	<b>Thu May 16</b>	<b>Thu Mar 26</b>	<b>\$150,000.00</b>				
474	Proceso de contratación (SBCC)	120 days	Thu May 16	Wed Nov 6	\$0.00				
475	Proceso de pago	90 days	Thu Nov 7	Thu Mar 26	\$150,000.00				
476	<b>Evaluación Intermedia</b>	<b>210 days</b>	<b>Tue Apr 13</b>	<b>Mon Jan 31</b>	<b>\$50,000.00</b>				
477	Proceso de contratación (SBCC)	120 days	Tue Apr 13	Mon Sep 27	\$0.00				
478	Proceso de pago	90 days	Tue Sep 28	Mon Jan 31	\$50,000.00				
479	<b>Evaluación Final</b>	<b>210 days</b>	<b>Tue Sep 13</b>	<b>Mon Jul 3</b>	<b>\$80,000.00</b>				
480	Proceso de contratación (SBCC)	120 days	Tue Sep 13	Mon Feb 27	\$0.00				
481	Proceso de pago	90 days	Tue Feb 28	Mon Jul 3	\$80,000.00				
482	<b>ADMINISTRACION Y GESTION</b>	<b>890 days</b>	<b>Fri Mar 13</b>	<b>Mon Aug 14</b>	<b>\$310,000.00</b>				
483	<b>Auditoría Financiera</b>	<b>890 days</b>	<b>Fri Mar 13</b>	<b>Mon Aug 14</b>	<b>\$300,000.00</b>				
484	Proceso de contratación (SBCC)	120 days	Fri Mar 13	Mon Aug 31	\$0.00				
485	Proceso de pago	770 days	Tue Sep 1	Mon Aug 14	\$300,000.00				
486	<b>Papelería y consumibles de oficina</b>	<b>360 days</b>	<b>Fri Apr 24</b>	<b>Mon Sep 13</b>	<b>\$10,000.00</b>				
487	Proceso de adquisición	40 days	Fri Apr 24	Mon Jun 22	\$0.00				
488	Orden de compra 1	10 days	Tue Jun 23	Mon Jul 6	\$5,000.00				
489	Orden de compra 2	10 days	Tue Aug 31	Mon Sep 13	\$5,000.00				
490	INICIO (EFECTIVIDAD)	0 days	Mon Jan 7	Mon Jan 7	\$0.00				
491	ELEGIBILIDAD	0 days	Mon May 13	Mon May 13	\$0.00				
492	FECHA DE PRIMER DESEMBOLSO	0 days	Thu May 16	Thu May 16	\$0.00				
493	FECHA DE ULTIMO DESEMBOLSO	0 days	Mon Aug 21	Mon Aug 21	\$0.00				
494	FIN DEL PROYECTO	0 days	Mon Aug 21	Mon Aug 21	\$0.00				

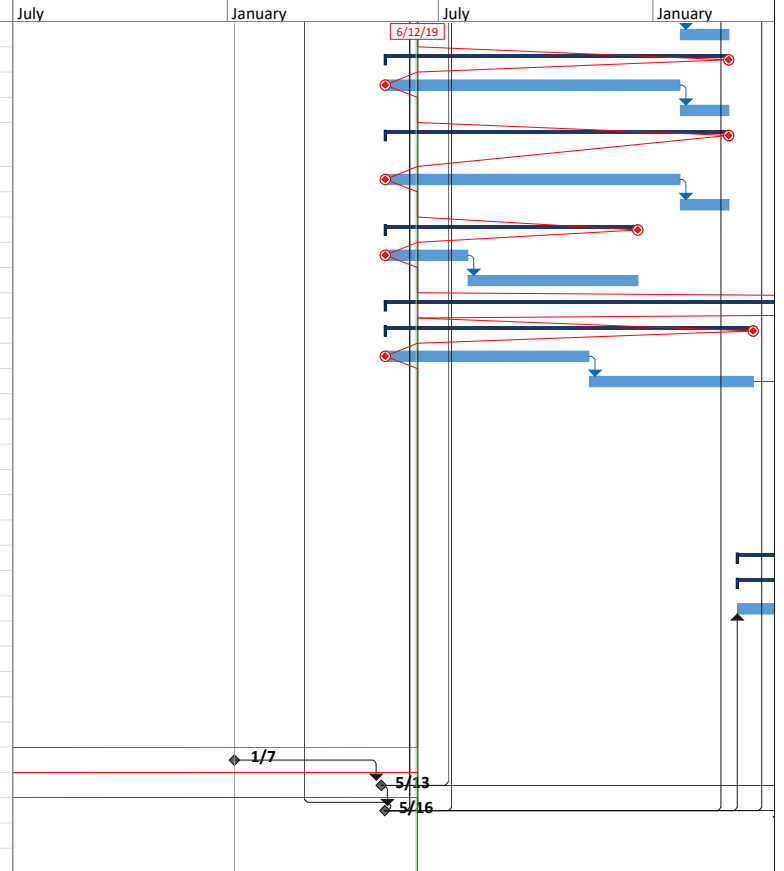



12/5

