
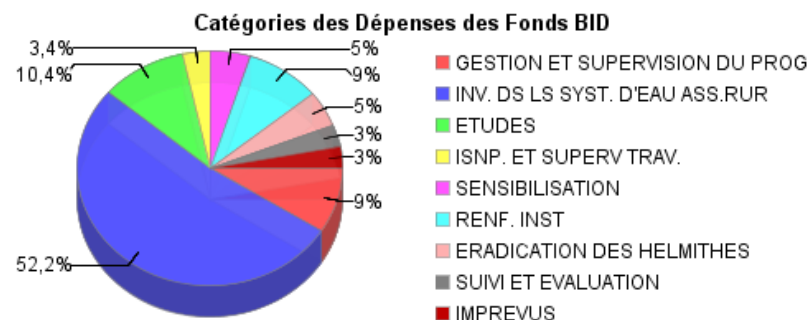
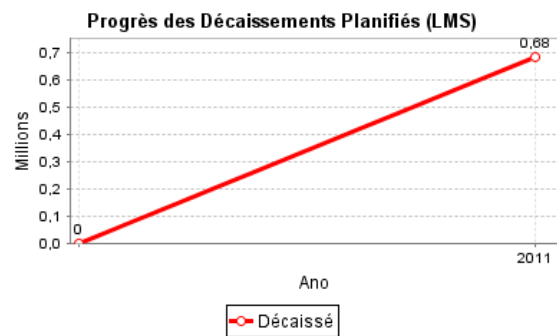



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement		
Secteur:	WATER AND SANITATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/WS-12147-HA	Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	679.833,33
Type d' Opération:	SFW - SFW	% Décaissé:	6,80
Opération(s) Connexe(s):	HA-L1062	Solde:	9.320.166,67
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans		
		Initial BID:	10.000.000,00
		Courant BID:	10.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	10.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 29, 2011
		Validé par le Représentant: Sep 29, 2011

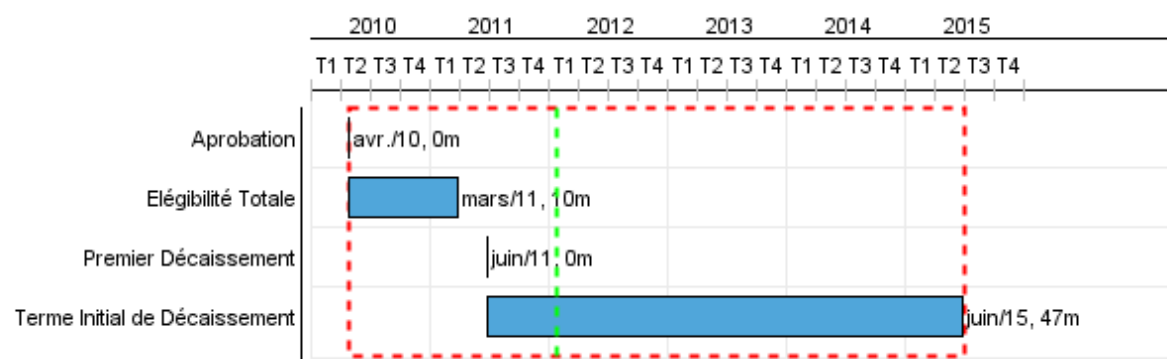

## Progrès Cumulé à 2011

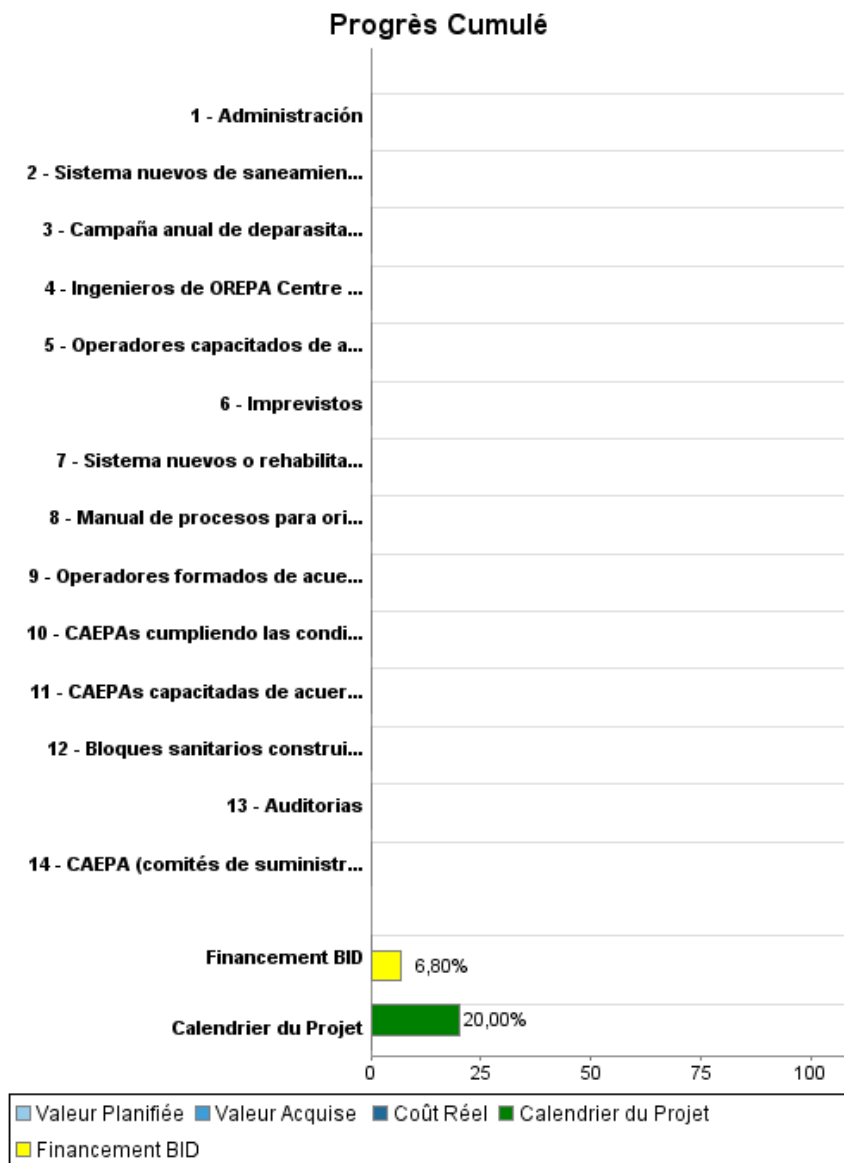

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Nuevos consumidores que reciben servicios de agua potable a través de sistemas nuevos o rehabilitados
<b>Suposições:</b>	Se constata la necesidad de la DINEPA de avanzar hacia la formulacion de una normativa local de desarrollo de proyectos rurales.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
3.2.1 Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares		2011	P A			5.000,00	10.000,00	10.000,00

<b>Résultat:</b>	Nuevos consumidores que reciben servicios de saneamiento a través de sistemas nuevos o rehabilitados
<b>Suposições:</b>	Se constata la necesidad de la DINEPA de avanzar hacia la formulacion de una normativa local de desarrollo de proyectos rurales.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
3.2.2 Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares		2011	P A			834,00	1.667,00	1.667,00

<b>Résultat:</b>	Metodologia para la realizacion de Proyectos rurales (diseño, construcción, operación y mantenimiento).
<b>Suposições:</b>	Se constata la necesidad de la DINEPA de avanzar hacia la formulacion de una normativa local de desarrollo de proyectos rurales.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Metodologia publicada	Metodologia		2011	P A	1,00				1,00

<b>Résultat:</b>	CAEPA funcionando de forma sostenible de acuerdo a la metodologia
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
CAEPA funcionando de forma sostenible	Comite (CAEPA)		2011	P A				12,00	12,00

<b>Résultat:</b>	La OREPA (Oficina Regional de Agua y Saneamiento) Centro cumpliendo sus actividades y el personal formado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
OREPA Centro en funcionamiento	OREPA		2011	P A			1,00		1,00

<b>Résultat:</b>	Poblacion afectada por geohelminthos.
------------------	---------------------------------------

<b>Suposições:</b>	El Ministerio de la Salud publicara los datos.
--------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Población de las comunidades beneficiarias del programa infectada por geohelminths en Artibonite	Porcentaje	33,00	2011	P A	25,00	20,00	15,00	10,00	10,00

<b>Résultat:</b>	Rentabilidad Interna del Proyecto
------------------	-----------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Tasa Interna de rentabilidad Economica	Porcentaje	12,00	2011	P A				12,00	12,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Inversiones en Sistemas de agua y saneamiento en el medio rural</b>									
Sistema nuevos o rehabilitados de agua potable se han construido y operan según especificaciones de diseño	Sistema				12,00				5.260.000,00
Sistema nuevos de saneamiento se han construido y operan según especificaciones de diseño	Sistema				12,00				1.072.000,00
Bloques sanitarios construidos y operativos en escuelas públicas y hospitales	Bloques sanitarios				10,00				268.000,00
<b>Promoción, extensión comunitaria e iniciación y seguimiento de proyectos</b>									
Manual de procesos para orientar las intervenciones de agua y saneamiento en el sector rural	Manual				1,00				20.000,00
CAEPA (comités de suministro de agua potable y saneamiento) formadas de acuerdo metodología	CAEPA				15,00				120.000,00
Operadores formados de acuerdo metodología	Operador				15,00				40.000,00
CAEPAs cumpliendo las condiciones del programa	CAEPA				15,00				160.000,00
CAEPAs capacitadas de acuerdo a la metodología	CAEPA				15,00				120.000,00
Operadores capacitados de acuerdo a la metodología	Operador				15,00				40.000,00
<b>Fortalecimiento institucional</b>									
Ingenieros de OREPA Centre capacitados	ingeniero Capacitado				3,00				900.000,00
<b>Erradicacion de helmintos transmitidos por el contacto con el suelo</b>									
Campaña anual de deparasitación (de geohelmintos) realizada.	Campaña				5,00				500.000,00
<b>Administración, auditorias e imprevistos.</b>									
Administración	Anualidad				5,00				900.000,00
Auditorias	Anualidad				2,00				300.000,00
Imprevistos	Anualidad				4,00				300.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>10.000.000,00</b>
