


Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	2017	2018	Total														
							S2	2016 S1	S2	2017 S1	S2	2018 S1	S2	2019 S1	S2	2020 S1	S2	2021 S1	S2	2022 S1
1	PEP Programa de Saneamiento Lago Titicaca	jue 09/06/16	lun 27/12/21	\$2.048.760	\$14.775.210	\$16.823.970														
2	Actividades previas	mar 15/11/16	lun 19/06/17	\$0	\$0	\$0														
3	Condiciones Previas (Informe Inicial)	mar 15/11/16	lun 19/06/17	\$0	\$0	\$0														
4	Autorización firma de Contrato de Préstamo	mar 15/11/16	mar 15/11/16	\$0	\$0	\$0														
5	Firma de Contrato de Prestamo	mar 22/11/16	mar 22/11/16	\$0	\$0	\$0														
6	Aprobacion Contrato de Préstamo	mar 22/11/16	lun 02/01/17	\$0	\$0	\$0														
7	Elegibilidad	mar 03/01/17	lun 19/06/17	\$0	\$0	\$0														
8	Informe Inicial	lun 27/03/17	lun 08/05/17	\$0	\$0	\$0														
9	Aprobación de Reglamento Operativo	lun 27/03/17	lun 08/05/17	\$0	\$0	\$0														
10	Ajustes al PMR presentacion de Informe Inicial	jue 06/04/17	lun 08/05/17	\$0	\$0	\$0														
11	Componente I. Obras y equipamientos para el control de la contaminación	mar 20/06/17	lun 22/11/21	\$528.500	\$9.531.419	\$10.059.919														
76	Componente II. Gestion Integral de RSU en la CK	mar 27/06/17	lun 15/11/21	\$0	\$1.899.826	\$1.899.826														
77	Firma de Convenio Interbugernativo	mar 27/06/17	lun 07/08/17	\$0	\$0	\$0														
78	Contrato de Obras de Relleno Sanitarios y obras complementarias	vie 18/08/17	jue 10/10/19	\$0	\$482.833	\$482.833														
79	Revision de informacion existente	vie 18/08/17	jue 28/09/17	\$0	\$0	\$0														
80	Preparacion de datos tecnicos	vie 29/09/17	jue 07/12/17	\$0	\$0	\$0														
81	Proceso de contratacion	vie 08/12/17	jue 05/07/18	\$0	\$0	\$0														
82	Ejecucion de obras	vie 17/08/18	jue 10/10/19	\$0	\$482.833	\$482.833														
83	Contrato de Obras para Cierre de Botaderos	vie 18/08/17	jue 20/12/18	\$0	\$630.000	\$630.000														
84	Revision de informacion existente	vie 18/08/17	jue 28/09/17	\$0	\$0	\$0														
85	Preparacion de datos tecnicos	vie 29/09/17	jue 07/12/17	\$0	\$0	\$0														
86	Proceso de contratacion	vie 08/12/17	jue 24/05/18	\$0	\$0	\$0														
87	Ejecucion de obras	vie 06/07/18	jue 20/12/18	\$0	\$630.000	\$630.000														
88	Contrato Firma Consultora para Supervision de Obras	vie 18/08/17	jue 14/11/19	\$0	\$19.313	\$19.313														
89	Proceso de Lista Corta	vie 18/08/17	jue 19/10/17	\$0	\$0	\$0														
90	Proceso de contratacion	vie 20/10/17	jue 19/04/18	\$0	\$0	\$0														
91	Ejecucion del servicio	vie 01/06/18	jue 14/11/19	\$0	\$19.313	\$19.313														
92	Contrato Firma Consultora para DESCOM	vie 18/08/17	jue 24/06/21	\$0	\$53.750	\$53.750														
93	Proceso de Lista Corta	vie 18/08/17	jue 19/10/17	\$0	\$0	\$0														
94	Proceso de contratacion	vie 20/10/17	jue 19/04/18	\$0	\$0	\$0														
95	Ejecucion del servicio	vie 01/06/18	jue 24/06/21	\$0	\$53.750	\$53.750														
96	Apoyo al funcionamiento de las Unidades Municipales	mar 08/08/17	lun 18/09/17	\$0	\$60.000	\$60.000														
97	Salarios y combustible	mar 08/08/17	lun 18/09/17	\$0	\$60.000	\$60.000														
98	Adquisicion de Vehiculos para recoleccion de residuos solidos	mar 31/10/17	vie 02/07/21	\$0	\$309.230	\$309.230														
99	Adquisicion de 8 Vehiculos	mar 31/10/17	lun 04/03/19	\$0	\$309.230	\$309.230														
100	Preparacion de datos tecnicos	mar 31/10/17	lun 08/01/18	\$0	\$0	\$0														
101	Proceso de contratacion	mar 09/01/18	lun 06/08/18	\$0	\$0	\$0														
102	Entrega de bienes	mar 18/09/18	lun 04/03/19	\$0	\$309.230	\$309.230														
103	Adquisicion de 5 Vehiculos	lun 15/06/20	vie 02/07/21	\$0	\$0	\$0														
104	Preparacion de datos tecnicos	lun 15/06/20	vie 21/08/20	\$0	\$0	\$0														
105	Proceso de contratacion	lun 24/08/20	vie 19/03/21	\$0	\$0	\$0														
106	Entrega de bienes	lun 03/05/21	vie 02/07/21	\$0	\$0	\$0														
107	Adquisicion de Maquinas pesadas para la operación de rellenos sanitarios	mar 31/10/17	vie 02/07/21	\$0	\$224.000	\$224.000														
108	Adquisicion de 4 maquinas pesadas	mar 31/10/17	lun 04/03/19	\$0	\$224.000	\$224.000														

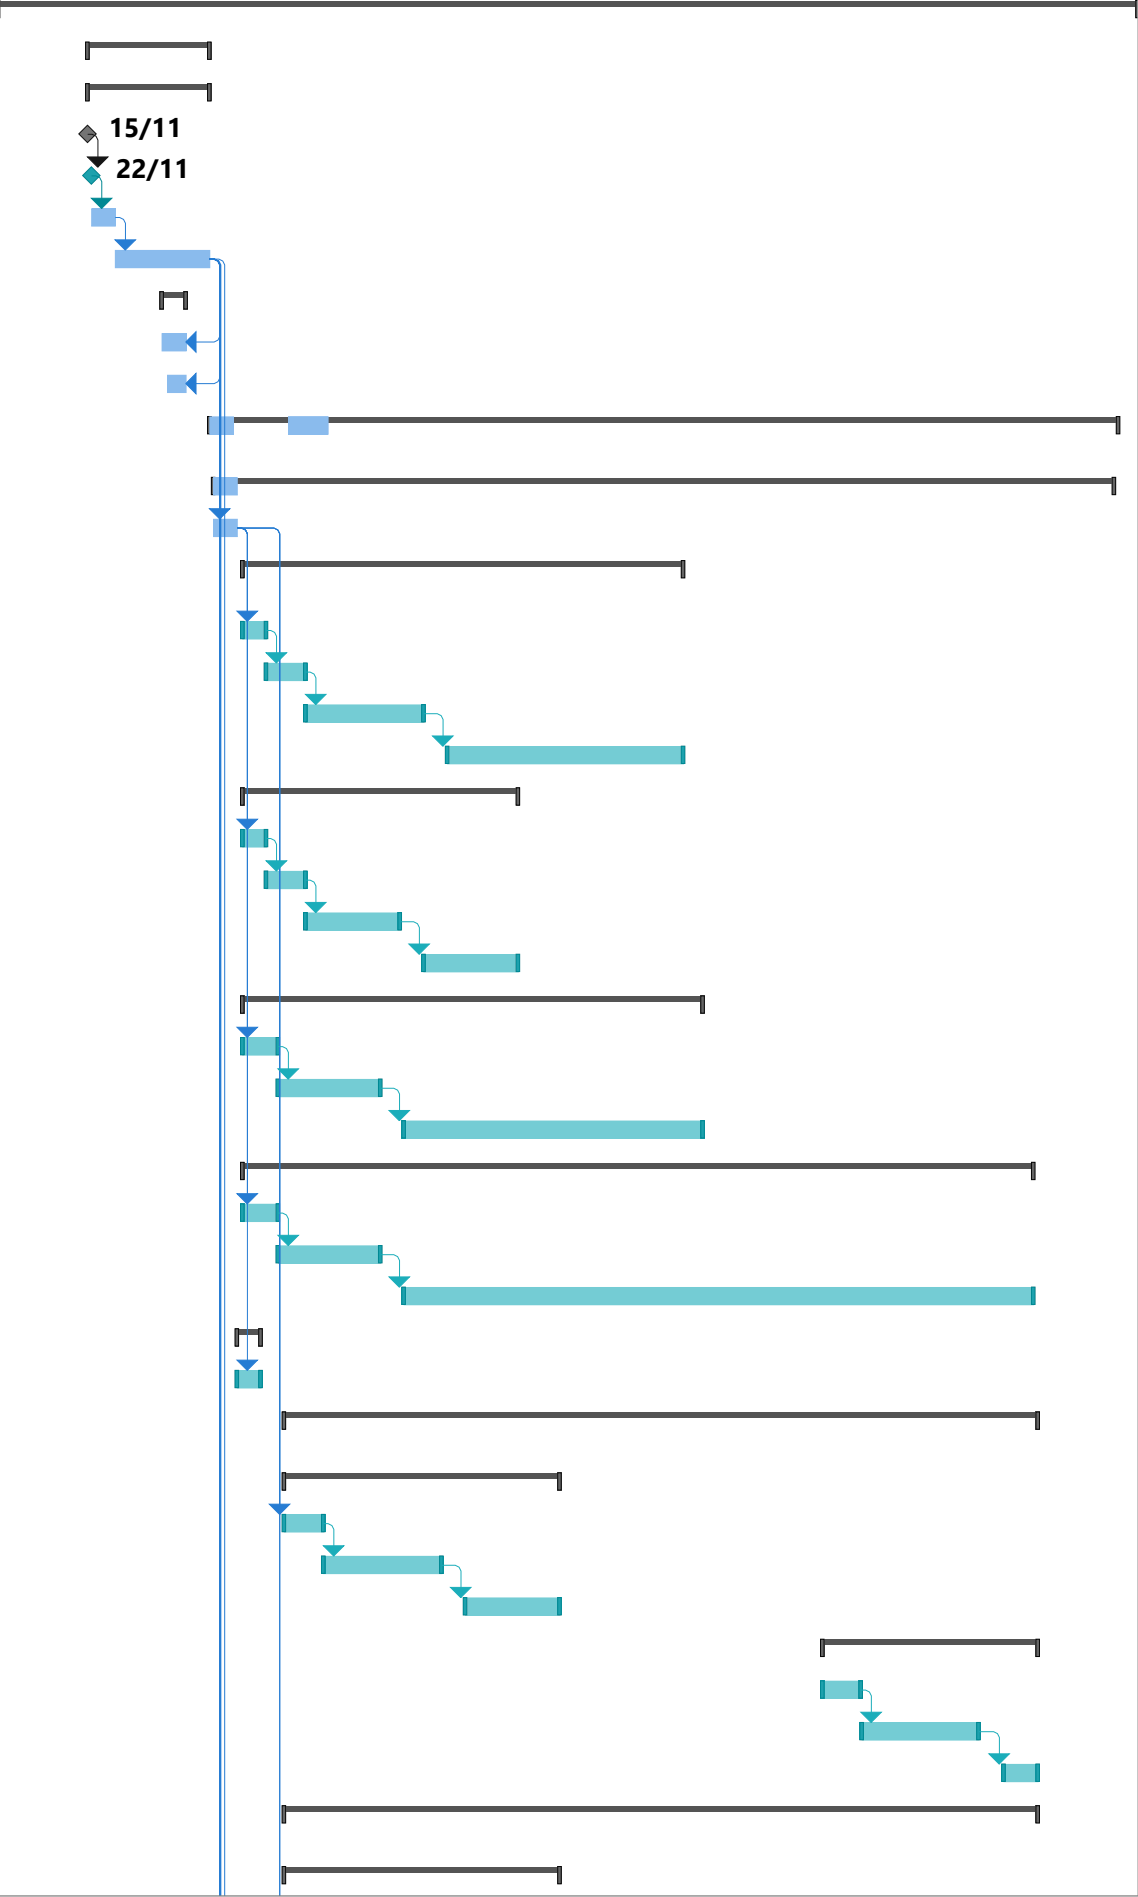

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	2017	2018	Total	S2	2016	S2	2017	S2	2018	S2	2019	S2	2020	S2	2021	S2	2022
							S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
109	Preparacion de datos tecnicos	mar 31/10/17	lun 08/01/18	\$0	\$0	\$0														
110	Proceso de contratacion	mar 09/01/18	lun 06/08/18	\$0	\$0	\$0														
111	Entrega de bienes	mar 18/09/18	lun 04/03/19	\$0	\$224.000	\$224.000														
112	Adquisiciones de 1 maquina pesada	lun 15/06/20	vie 02/07/21	\$0	\$0	\$0														
113	Preparacion de datos tecnicos	lun 15/06/20	vie 21/08/20	\$0	\$0	\$0														
114	Proceso de contratacion	lun 24/08/20	vie 19/03/21	\$0	\$0	\$0														
115	Entrega de bienes	lun 03/05/21	vie 02/07/21	\$0	\$0	\$0														
116	Adquisicion de contenedores para recoleccion de RSU en localidades de la CK	mar 31/10/17	vie 02/07/21	\$0	\$83.200	\$83.200														
117	Adquisicion de 320 contenedores	mar 31/10/17	lun 04/03/19	\$0	\$83.200	\$83.200														
118	Preparacion de datos tecnicos	mar 31/10/17	lun 08/01/18	\$0	\$0	\$0														
119	Proceso de contratacion	mar 09/01/18	lun 06/08/18	\$0	\$0	\$0														
120	Entrega de bienes	mar 18/09/18	lun 04/03/19	\$0	\$83.200	\$83.200														
121	Adquisicion de 200 contenedores	lun 15/06/20	vie 02/07/21	\$0	\$0	\$0														
122	Preparacion de datos tecnicos	lun 15/06/20	vie 21/08/20	\$0	\$0	\$0														
123	Proceso de contratacion	lun 24/08/20	vie 19/03/21	\$0	\$0	\$0														
124	Entrega de bienes	lun 03/05/21	vie 02/07/21	\$0	\$0	\$0														
125	Implementacion de la Estrategia de Comunicación del Componente 2	mar 05/06/18	lun 15/11/21	\$0	\$37.500	\$37.500														
126	Componente III. Fortalecimiento de la Gestion de la CK	jue 09/06/16	lun 15/11/21	\$394.000	\$1.653.662	\$2.047.662														
127	Institucionalizacion de la Gestion de la Cuenca Katari (financiamiento UE)	jue 09/06/16	mié 01/08/18	\$94.000	\$282.000	\$376.000														
128	Contrato de servicio para la implementacion de la Estrategia de Comunicación y Gestion Social.	mar 18/07/17	lun 15/11/21	\$300.000	\$0	\$300.000														
129	Preparacion de datos tecnicos	mar 18/07/17	lun 25/09/17	\$0	\$0	\$0														
130	Proceso de contratacion	mar 26/09/17	lun 23/04/18	\$0	\$0	\$0														
131	Ejecucion del servicio	mar 05/06/18	lun 15/11/21	\$300.000	\$0	\$300.000														
132	Sistema de Gestion de Informacion y Monitoreo de la Cuenca (financiamiento UE)	mar 25/07/17	lun 24/05/21	\$0	\$1.371.662	\$1.371.662														
133	Desarrollo e implementacion	mar 25/07/17	lun 24/05/21	\$0	\$1.371.662	\$1.371.662														
134	Componente IV. Acciones Estrategicas para la Gestion de la CK	mar 11/07/17	mar 19/10/21	\$240.000	\$580.000	\$820.000														
135	Proyectos Demostrativos para MIC (financiamiento UE)	mar 11/07/17	vie 03/09/21	\$240.000	\$480.000	\$720.000														
136	MIC Puerto Perez	mar 11/07/17	lun 03/09/18	\$240.000	\$240.000	\$480.000														
137	MIC Pucarani	mié 11/07/18	mar 03/09/19	\$0	\$240.000	\$240.000														
138	MIC Suriqui	jue 11/07/19	mié 02/09/20	\$0	\$0	\$0														
139	MIC Katari	sáb 11/07/20	jue 02/09/21	\$0	\$0	\$0														
140	MIC Pallina Medio	lun 13/07/20	vie 03/09/21	\$0	\$0	\$0														
141	Manejo de Residuos Industriales	lun 13/07/20	vie 03/09/21	\$0	\$0	\$0														
142	Contrato Firma Consultora para la Actualizacion del Censo Industrial e identificacion de las industrias mas contaminantes	mié 10/01/18	mar 08/10/19	\$0	\$0	\$0														
143	Proceso de Lista Corta	mié 10/01/18	mar 13/03/18	\$0	\$0	\$0														
144	Proceso de contratacion	mié 14/03/18	mar 11/09/18	\$0	\$0	\$0														
145	Ejecucion de obras	mié 24/10/18	mar 08/10/19	\$0	\$0	\$0														
146	Contrato Firma para la ealboracion de la Caracterizacion de Cuerpos Receptores del Area de Proyecto	mié 05/02/20	mar 19/10/21	\$0	\$0	\$0														
147	Proceso de Lista Corta	mié 05/02/20	mar 07/04/20	\$0	\$0	\$0														
148	Proceso de contratacion	mié 08/04/20	mar 06/10/20	\$0	\$0	\$0														
149	Ejecucion de obras	mié 18/11/20	mar 19/10/21	\$0	\$0	\$0														
150	Plan de Adaptacion y gestion de riesgo para la CK (financiamiento UE)	jue 01/03/18	mié 11/09/19	\$0	\$100.000	\$100.000														

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	2017	2018	Total														
							S2	2016	S2	2017	S2	2018	S2	2019	S2	2020	S2	2021	S2	2022
151	Elaboracion del Plan	jue 01/03/18	mié 11/09/19	\$0	\$100.000	\$100.000														
152	Administracion y FI	mar 20/06/17	lun 27/12/21	\$736.260	\$920.303	\$1.656.563														
153	Personal UCP	mar 20/06/17	lun 20/12/21	\$301.860	\$357.903	\$659.763														
154	Asesorias Especificas	mar 20/06/17	lun 20/05/19	\$100.000	\$100.000	\$200.000														
155	Gastos de Funcionamiento	mar 20/06/17	lun 27/12/21	\$72.400	\$72.400	\$144.800														
156	Equipamiento, mobiliario y vehiculos	mar 04/07/17	lun 18/06/18	\$152.000	\$0	\$152.000														
157	Adquision de equipo de oficina y muebles	mar 04/07/17	lun 25/12/17	\$32.000	\$0	\$32.000														
158	Preparacion de datos tecnicos	mar 04/07/17	lun 31/07/17	\$0	\$0	\$0														
159	Proceso de contratacion	mar 01/08/17	lun 02/10/17	\$0	\$0	\$0														
160	Entrega de bienes	mar 14/11/17	lun 25/12/17	\$32.000	\$0	\$32.000														
161	Adquisicion de equipos de computacion	mar 04/07/17	lun 25/12/17	\$32.000	\$0	\$32.000														
162	Preparacion de datos tecnicos	mar 04/07/17	lun 31/07/17	\$0	\$0	\$0														
163	Proceso de contratacion	mar 01/08/17	lun 02/10/17	\$0	\$0	\$0														
164	Entrega de bienes	mar 14/11/17	lun 25/12/17	\$32.000	\$0	\$32.000														
165	Contratacion de servicio tecnico para extension de redes y conexiones	mar 04/07/17	lun 25/12/17	\$10.000	\$0	\$10.000														
166	Preparacion de datos tecnicos	mar 04/07/17	lun 31/07/17	\$0	\$0	\$0														
167	Proceso de contratacion	mar 01/08/17	lun 02/10/17	\$0	\$0	\$0														
168	Ejecucion del servicio	mar 14/11/17	lun 25/12/17	\$10.000	\$0	\$10.000														
169	Adquisicion de impresoras y fotocopiadora	mar 04/07/17	lun 25/12/17	\$8.000	\$0	\$8.000														
170	Preparacion de datos tecnicos	mar 04/07/17	lun 31/07/17	\$0	\$0	\$0														
171	Proceso de contratacion	mar 01/08/17	lun 02/10/17	\$0	\$0	\$0														
172	Entrega de bienes	mar 14/11/17	lun 25/12/17	\$8.000	\$0	\$8.000														
173	Adquisicion de vehiculos	mar 04/07/17	lun 18/06/18	\$70.000	\$0	\$70.000														
174	Preparacion de datos tecnicos	mar 04/07/17	lun 28/08/17	\$0	\$0	\$0														
175	Proceso de contratacion	mar 29/08/17	lun 26/03/18	\$0	\$0	\$0														
176	Entrega de bienes	mar 08/05/18	lun 18/06/18	\$70.000	\$0	\$70.000														
177	Adquisicion de servidor, equipamiento auxiliares, software para la UCP	mar 04/07/17	lun 18/06/18	\$0	\$200.000	\$200.000														
178	Preparacion de datos tecnicos	mar 04/07/17	lun 28/08/17	\$0	\$0	\$0														
179	Proceso de contratacion	mar 29/08/17	lun 26/03/18	\$0	\$0	\$0														
180	Entrega de bienes	mar 08/05/18	lun 18/06/18	\$0	\$200.000	\$200.000														
181	Contrato de Firma Consultora para el diseño, desarrollo e implementaacion de un tablero control para la gestion de programas UCP	mar 04/07/17	lun 28/10/19	\$60.000	\$140.000	\$200.000														
182	Proceso de Lista Corta	mar 04/07/17	lun 04/09/17	\$0	\$0	\$0														
183	Proceso de contratacion	mar 05/09/17	lun 05/03/18	\$0	\$0	\$0														
184	Ejecucion del servicio	mar 17/04/18	lun 28/10/19	\$60.000	\$140.000	\$200.000														
185	Fortalecimiento Institucional SENASBA	mar 20/06/17	lun 27/12/21	\$50.000	\$50.000	\$100.000														
186	Auditoria, Monitoreo y Evaluacion	mar 20/06/17	lun 27/12/21	\$150.000	\$190.000	\$340.000														
187	Asesoría Externa en temas legales y adquisiciones	mar 20/06/17	lun 27/12/21	\$20.000	\$20.000	\$40.000														
188	Contrato de Firma para Auditoria Externa	mar 04/07/17	lun 27/12/21	\$50.000	\$50.000	\$100.000														
189	Proceso de Lista Corta	mar 04/07/17	lun 04/09/17	\$0	\$0	\$0														
190	Proceso de contratacion	mar 05/09/17	lun 05/03/18	\$0	\$0	\$0														
191	Ejecucion del servicio	mar 17/04/18	lun 27/12/21	\$50.000	\$50.000	\$100.000														
192	Contrato de Firma Consultora para el levantamiento de linea de base	mar 04/07/17	lun 01/10/18	\$80.000	\$120.000	\$200.000														
193	Proceso de Lista Corta	mar 04/07/17	lun 04/09/17	\$0	\$0	\$0														
194	Proceso de contratacion	mar 05/09/17	lun 05/03/18	\$0	\$0	\$0														

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	2017	2018	Total														
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
195	Ejecucion del servicio	mar 17/04/18	lun 01/10/18	\$80.000	\$120.000	\$200.000														
196	Contrato de Firma Consultora para la evaluaciòn medio termino	mié 04/07/18	mar 03/09/19	\$0	\$0	\$0														
197	Proceso de Lista Corta	mié 04/07/18	mar 04/09/18	\$0	\$0	\$0														
198	Proceso de contratacion	mié 05/09/18	mar 05/02/19	\$0	\$0	\$0														
199	Ejecucion del servicio	mié 20/03/19	mar 03/09/19	\$0	\$0	\$0														
200	Contrato Firma Consultora para Evaluacion Final y economica expost	vie 03/07/20	jue 30/09/21	\$0	\$0	\$0														
201	Proceso de Lista Corta	vie 03/07/20	jue 03/09/20	\$0	\$0	\$0														
202	Proceso de contratacion	vie 04/09/20	jue 04/03/21	\$0	\$0	\$0														
203	Ejecucion del servicio	vie 16/04/21	jue 30/09/21	\$0	\$0	\$0														
