
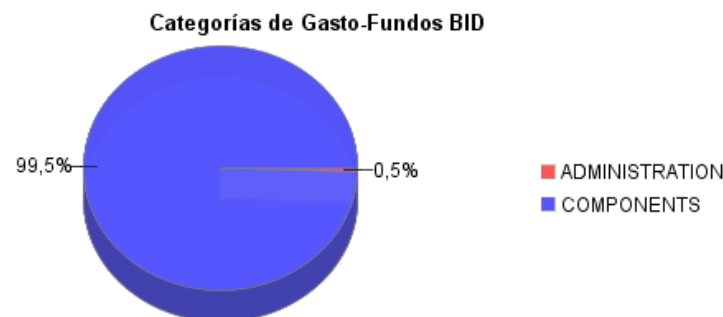
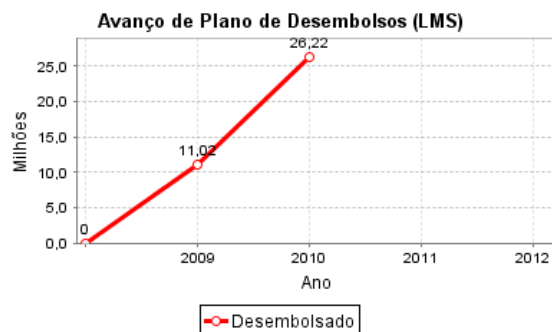



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Prefeitura Municipal de Vitoria		
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT		
Número da Operação: 1986/OC-BR	Atual: 39.100.000,00	Original BID: 39.100.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 26.221.285,31	Corrente BID: 39.100.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 67,06	Pari-passu: 9,43
Operação Relacionada: BR-L1043	Saldo: 12.878.714,69	Cofinanciamento/País: 26.100.000,00
Subtipo de Operação: GCR - Global Credit Operation		Original Estimado: 65.200.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 19, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011

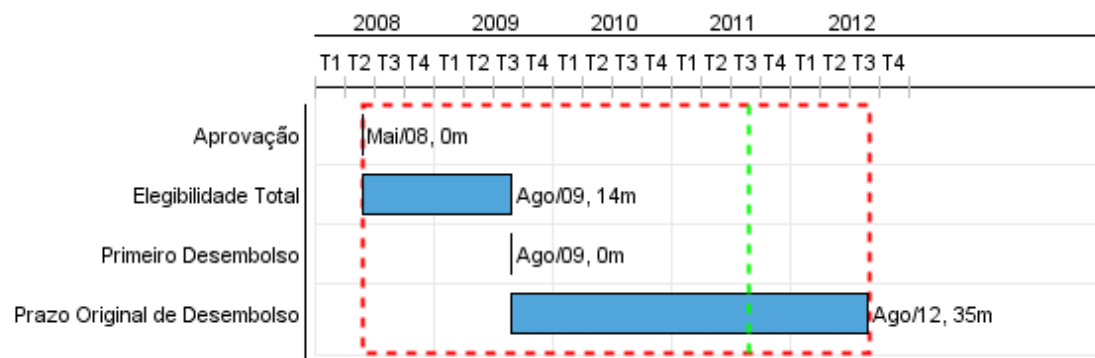

Progresso Acumulado até 2010

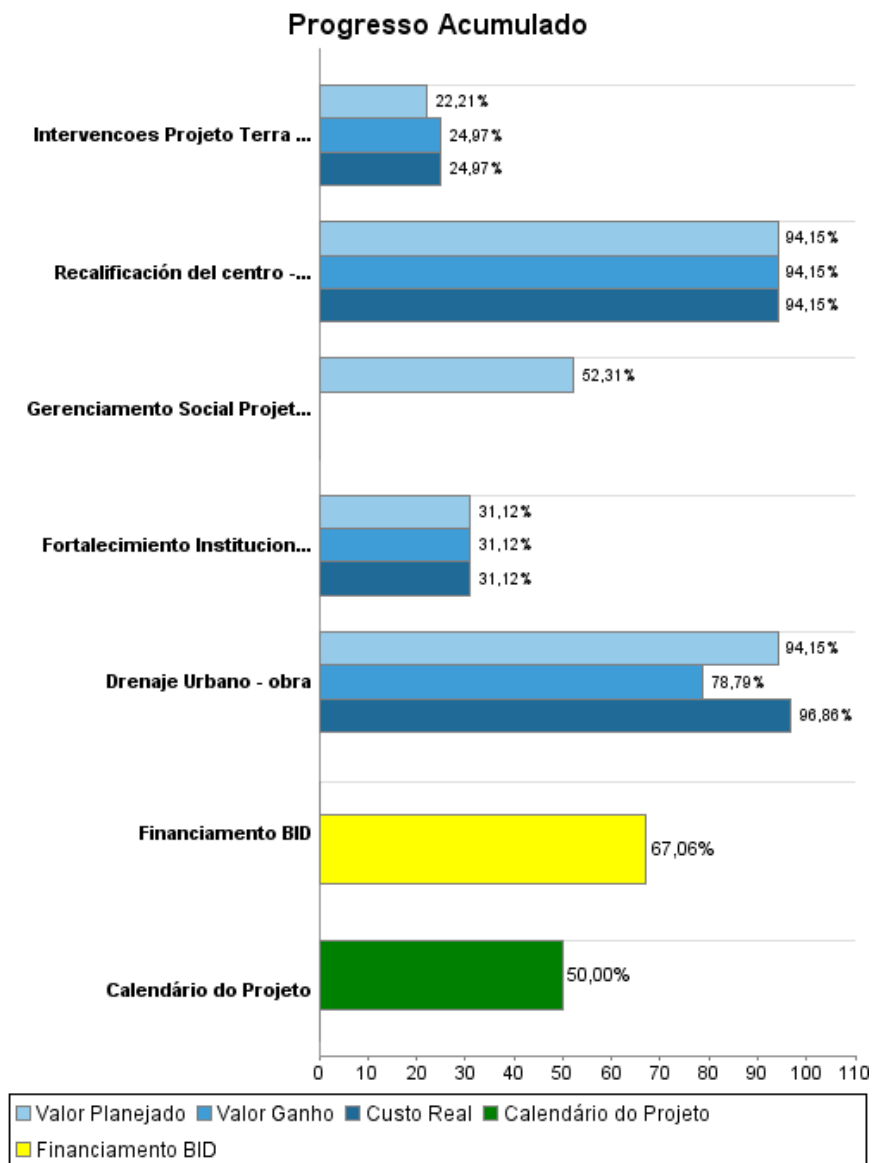

Resultados

Resultado:	Infraestrutura urbana y las condiciones ambientales del municipio mejorada y el acceso de su población a servicios sociales básicos ampliados
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
ICVU medio de las áreas intervenidas en el componente de Apoyo al Proyecto ¿Terra Mais Igual¿.	ICVU	0,52	2000	P	0,68	0,68
				A		
ICVU medio de las áreas intervenidas en el componente de Revitalización del Centro	ICVU	0,73	2000	P	0,80	0,80
				A		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Apoyo al proyecto ¿Terra Mais Igual¿									
Intervencoes Projeto Terra - obra	obra				1,00	9.446.821,00	10.505.361,00		46.499.010,66
Gerenciamento Social Projeto Terra - programa	programa social				1,00	1.224.238,00			2.340.529,00
Recalificación del centro									
Recalificación del centro - obra	obra				1,00				529.411,76
Drenaje Urbano									
Drenaje Urbano - obra	#	1,00	1,00		1,00	9.776.695,00	13.580.352,00		21.052.800,00
Fortalecimiento Institucional									
Fortalecimiento Institucional - programa	programa				1,00		44.890,00		4.800.000,00
Administracion del programa									
others									
TOTAL						20.447.754,00	24.130.603,00		75.221.751,42
