

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Prefeitura Municipal de Vitoria
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s): 1986/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): BR-L1043
Sous-Type de l'Opération: GCR - Global Credit Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 39.100.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 26.221.285,31
% Décaissé: 67,06
Solde: 12.878.714,69

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 39.100.000,00
Courant BID: 39.100.000,00
Pari Passu: 9,43
Cofinancement/Pays: 26.100.000,00
Estimation Initiale: 65.200.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation


Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Apr 19, 2011
Validé par le Représentant: Apr 19, 2011

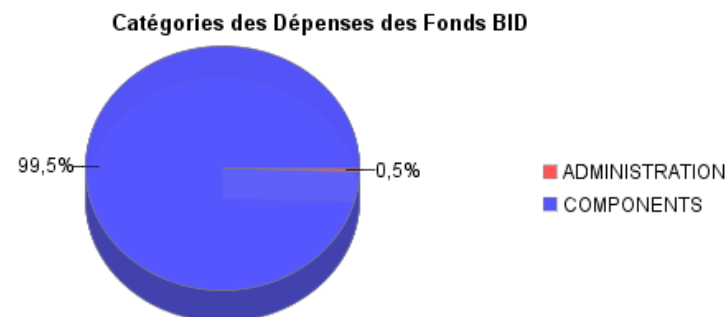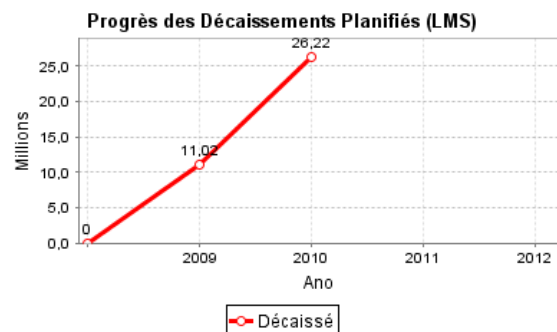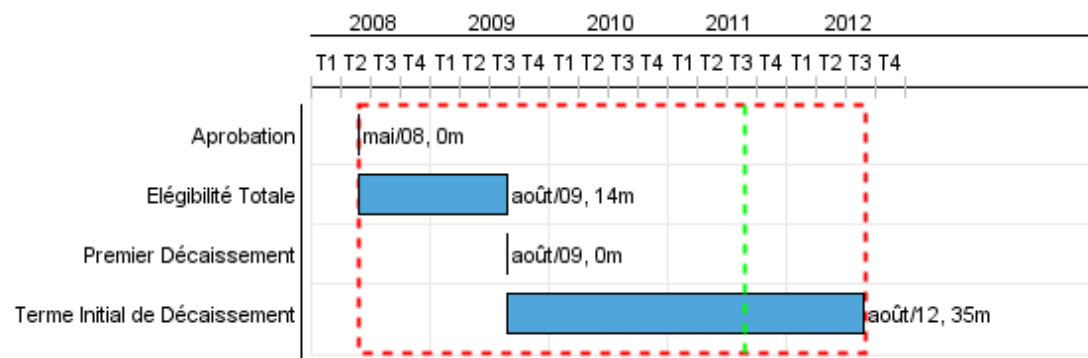

Progrès Cumulé à 2010

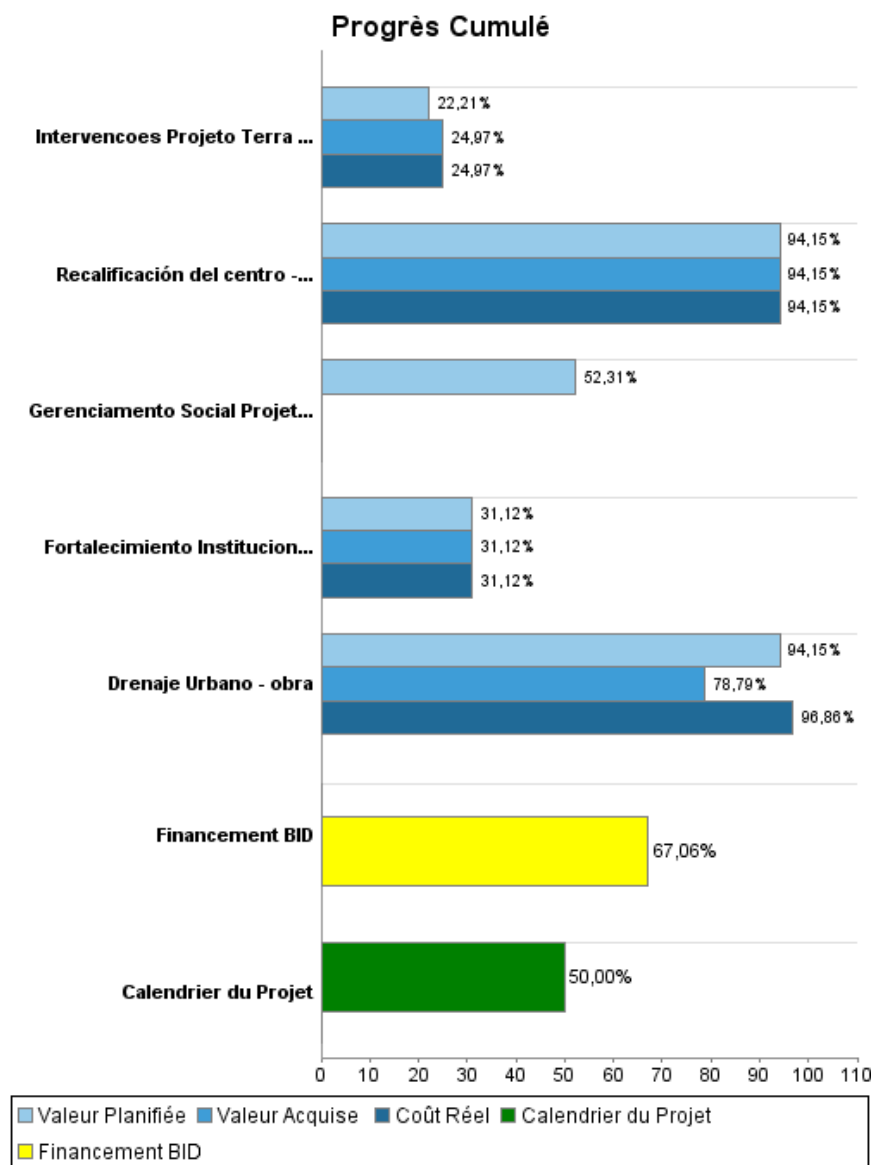

Résultats

Résultat:	Infraestructura urbana y las condiciones ambientales del municipio mejorada y el acceso de su población a servicios sociales básicos ampliados
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
ICVU medio de las áreas intervenidas en el componente de Apoyo al Proyecto ¿Terra Mais Igual¿.	ICVU	0,52	2000	P A	0,68	0,68
ICVU medio de las áreas intervenidas en el componente de Revitalización del Centro	ICVU	0,73	2000	P A	0,80	0,80

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Apoyo al proyecto ¿Terra Mais Igual¿									
Intervencoes Projeto Terra - obra	obra				1,00	9.446.821,00	10.505.361,00		46.499.010,66
Gerenciamento Social Projeto Terra - programa	programa social				1,00	1.224.238,00			2.340.529,00
Recalificación del centro									
Recalificación del centro - obra	obra				1,00				529.411,76
Drenaje Urbano									
Drenaje Urbano - obra	#	1,00	1,00		1,00	9.776.695,00	13.580.352,00		21.052.800,00
Fortalecimiento Institucional									
Fortalecimiento Institucional - programa	programa				1,00		44.890,00		4.800.000,00
Administracion del programa									
others									
TOTAL						20.447.754,00	24.130.603,00		75.221.751,42
