
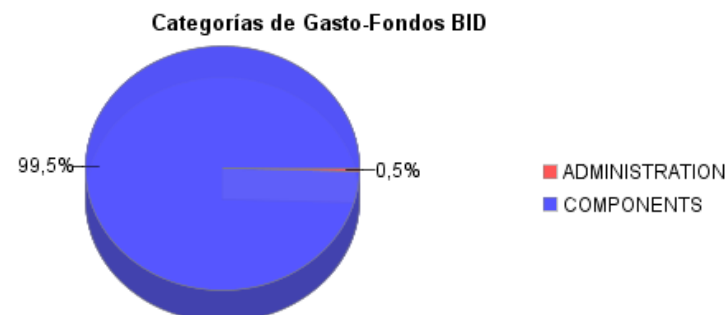
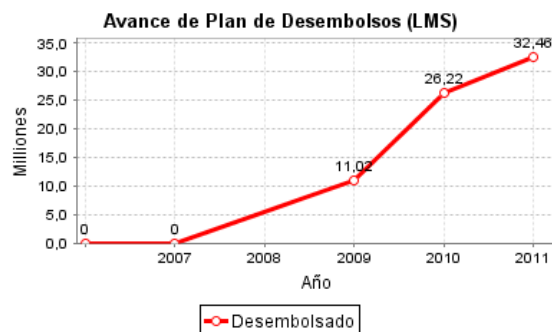



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Prefeitura Municipal de Vitoria		
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT		
Número(s) de Préstamo:	1986/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	39.100.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	32.455.645,87
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	83,01
Operación(es) Relacionada(s):	BR-L1043	Saldo:	6.644.354,13
Subtipo de Operación:	GCR - Operación Global de Crédito		
		BID Original:	39.100.000,00
		Actual BID:	39.100.000,00
		Pari-passu:	60,00
		Co-financiamiento/País:	26.100.000,00
		Estimado Original:	65.200.000,00
		Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 23, 2011 Validado por Representante de País: Sep 25, 2011

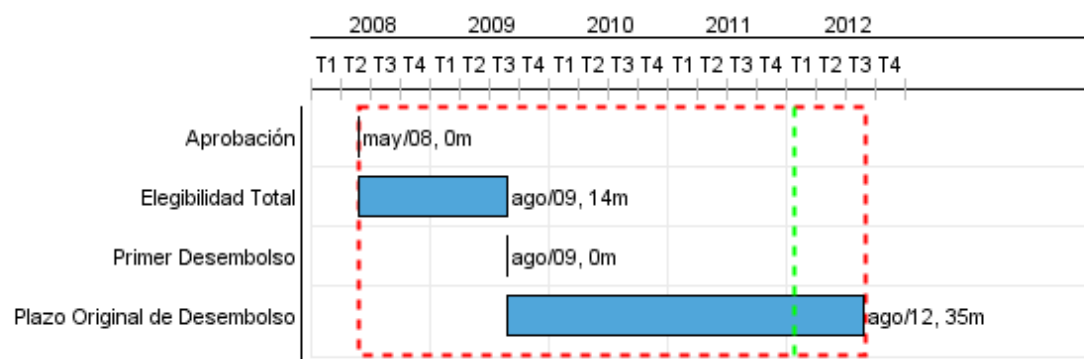

Progreso Acumulado al 2011

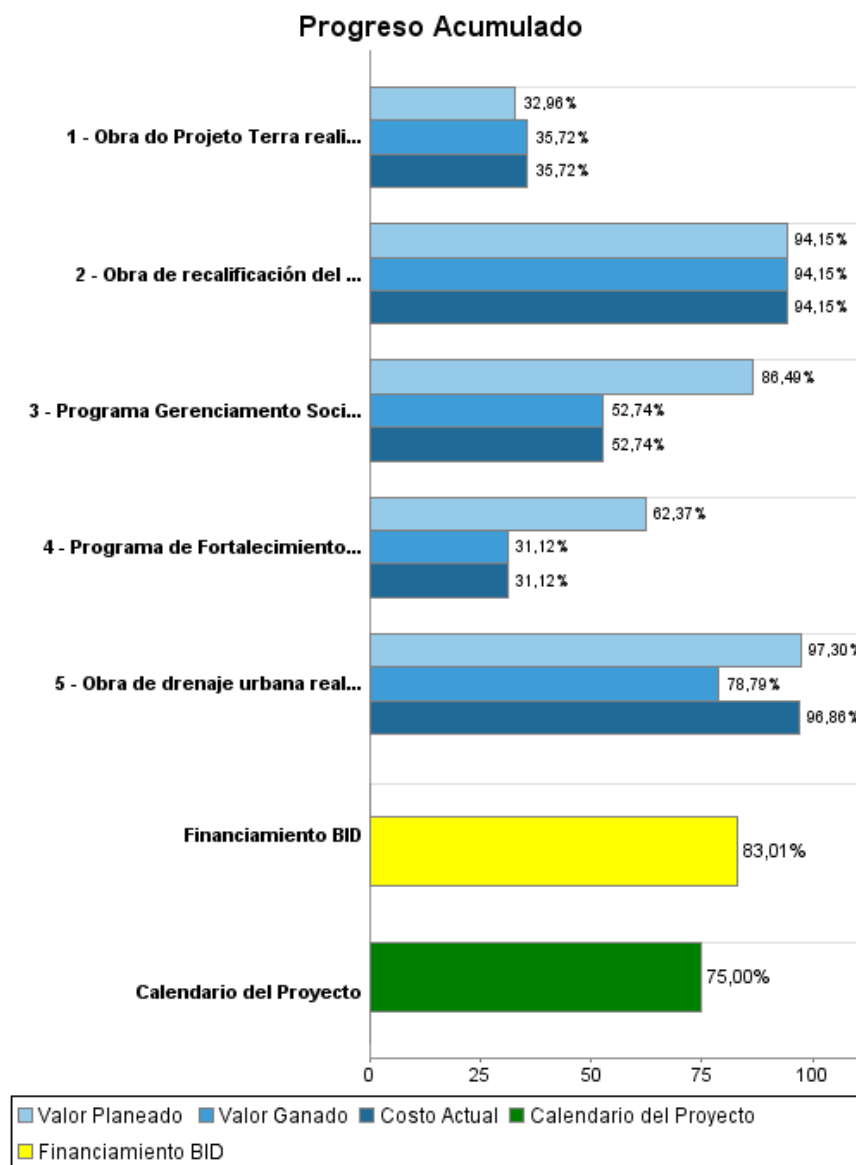

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1057 - PROCIDADES - Programa de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de Vitoria
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 16/09/2011

Resultados

Resultado:	Infraestructura urbana y las condiciones ambientales del municipio mejorada y el acceso de su población a servicios sociales básicos ampliados
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Indice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) medio de las áreas intervenidas en el componente de Apoyo al Proyecto ¿Terra Mais Igual¿ mejorado	indice	0,52	2000	P	0,68	0,68
				A		
Indice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) medio de las áreas intervenidas en el componente de Revitalización del Centro mejorado	indice	0,73	2000	P	0,80	0,80
				A		

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1057 - PROCIDADES - Programa de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de Vitoria
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 16/09/2011

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Apoyo al proyecto ¿Terra Mais Igual¿									
Obra do Projeto Terra realizada	obra				1,00	5.000.000,00	5.000.000,00		46.499.010,66
Programa Gerenciamento Social Projeto Terra implementado	programa				1,00	800.000,00	1.234.360,56		2.340.529,00
Recalificación del centro									
Obra de recalificación del centro realizada	obra	1,00	1,00		1,00				529.411,76
Drenaje Urbano									
Obra de drenaje urbana realizada	#				1,00	661.934,00			21.052.800,00
Fortalecimiento Institucional									
Programa de Fortalecimiento Institucional implementado	programa				1,00	1.500.000,00			4.800.000,00
Administracion del programa									
others									
TOTAL						7.961.934,00	6.234.360,56		75.221.751,42
