

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):
Sector: WATER AND SANITATION-SEWERAGE
Número(s) de Préstamo: 2322/OC-VE
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): VE-T1017, VE-T1021, RG-P1400
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 140.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 3.390.527,59
% Desembolsado: 2,42
Saldo: 136.609.472,41

Costo total y Fuente

BID Original: 140.000.000,00
Actual BID: 140.000.000,00
Pari-passu: 70,00
Co-financiamiento/País: 60.000.000,00
Estimado Original: 200.000.000,00
Período de Amortización (meses): 234




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 10-may-2012
Validado por Representante de País: 10-may-2012

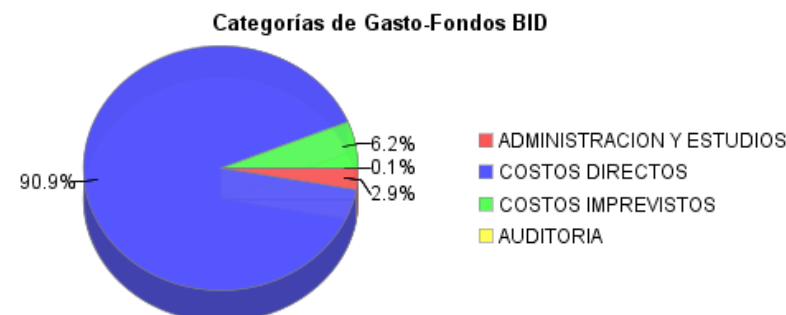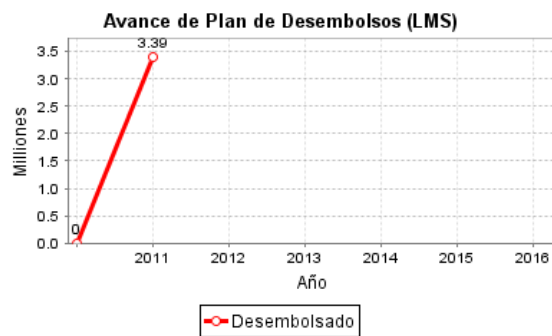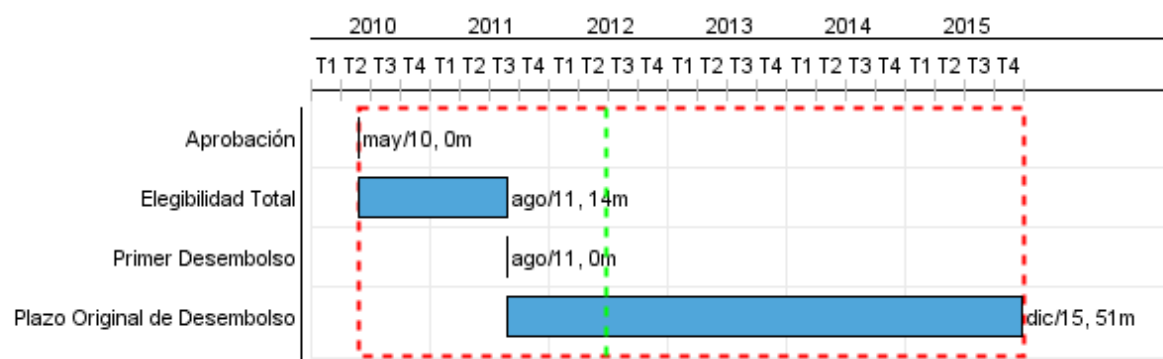

Progreso Acumulado al 2011

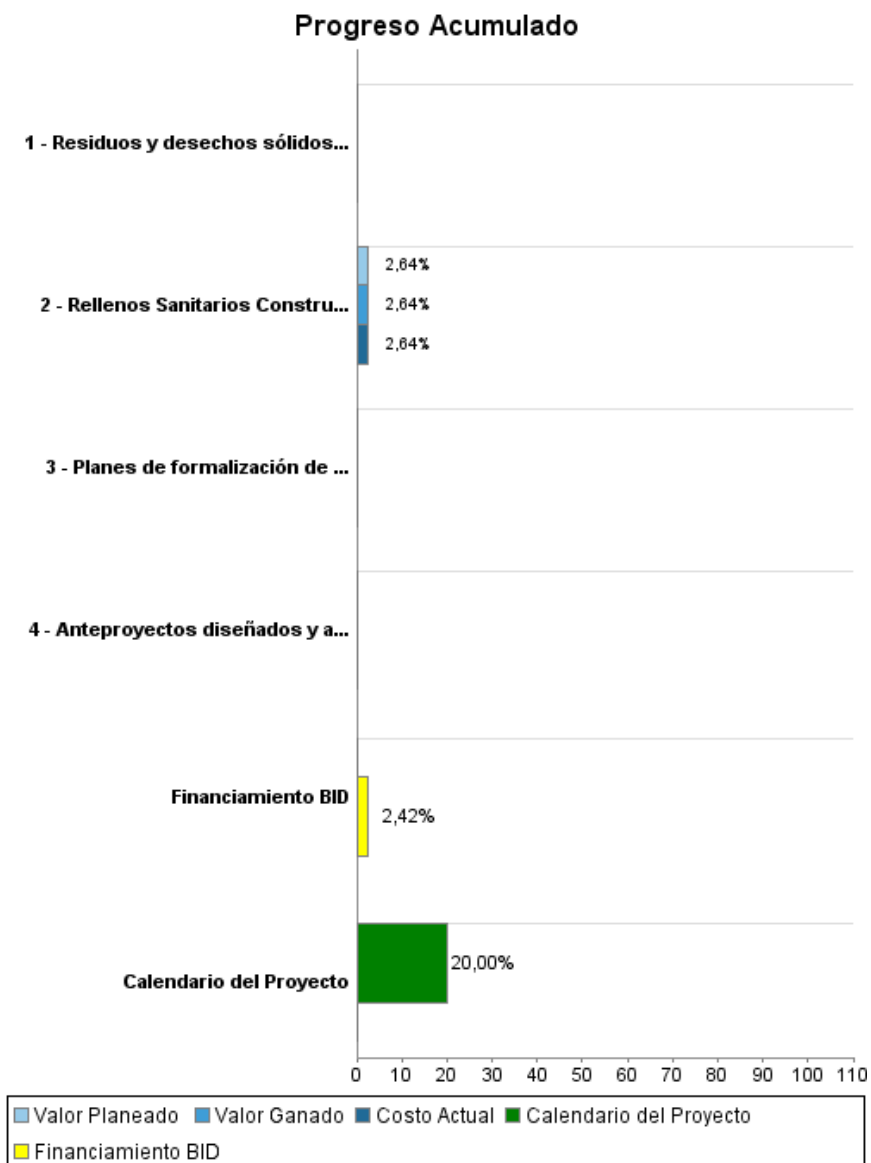

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

VE-L1031 - Fort. Capacidades Nacionales para Gestión Integral de Residuos y Desecho Sólidos
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 10/05/2012

Resultados

Resultado:	Residuos y desechos sólidos (RDS) dispuestos adecuadamente en los proyectos beneficiados con el Programa.
Observaciones:	Datos de línea base y logrados son acumulativos en relación a los proyectos elegibles del Programa.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Residuos y desechos sólidos (RDS) enviados a vertederos a cielo abierto no controlados.	ton/día	1,100.00	2011	P A	0,00

Resultado:	Sustentabilidad Ambiental y Social lograda en lo que a Residuos y Desechos (RDS) se refiere en los proyectos beneficiados por el Programa.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Residuos y desechos sólidos (RDS) separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.	ton/día	0.20	2011	P A	4,00

Resultado:	Fortalecimiento Institucional facilitado en las zonas beneficiadas por el Programa.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Planes de Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.	Plan		2011	P A	5,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

VE-L1031 - Fort. Capacidades Nacionales para Gestión Integral de Residuos y Desecho
Sólidos
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 10/05/2012

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional									
Anteproyectos diseñados y aprobados.	Anteproyecto				3,00				3.800.000,00
Planes de formalización de segregadores elaborados.	Plan				4,00				800.000,00
Infraestructura y Mejora Operacional									
Rellenos Sanitarios Construidos.	Relleno				5,00		3.571.115,06		135.200.000,00
Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Ton/día				1.100,00				39.600.000,00
Costos administrativos y de supervisión									
Costos imprevistos									
Auditoría									
TOTAL							3.571.115,06		179.400.000,00
