
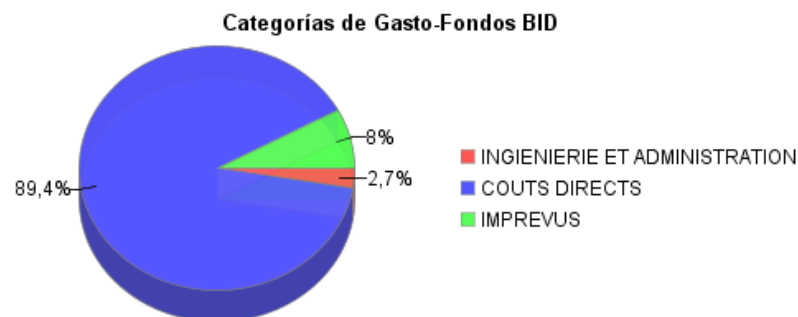
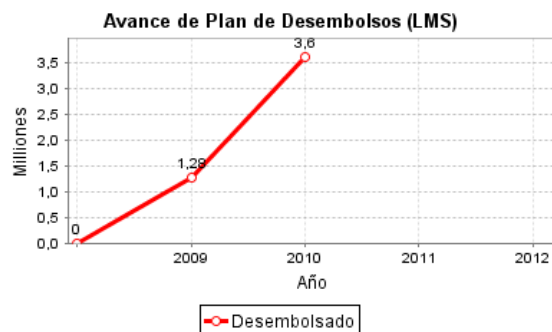



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS		
Sector:	ENERGY		
Número(s) de Préstamo:	1813/SF-HA;2394/GR-HA	Monto Aprobado Actual:	18.328.400,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	4.325.879,85
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	23,60
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	14.002.520,15
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	34.100.510,84
		Actual BID:	18.328.400,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	160.000,00
		Estimado Original:	34.260.510,84
		Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 7, 2011 Validado por Representante de País: Apr 27, 2011

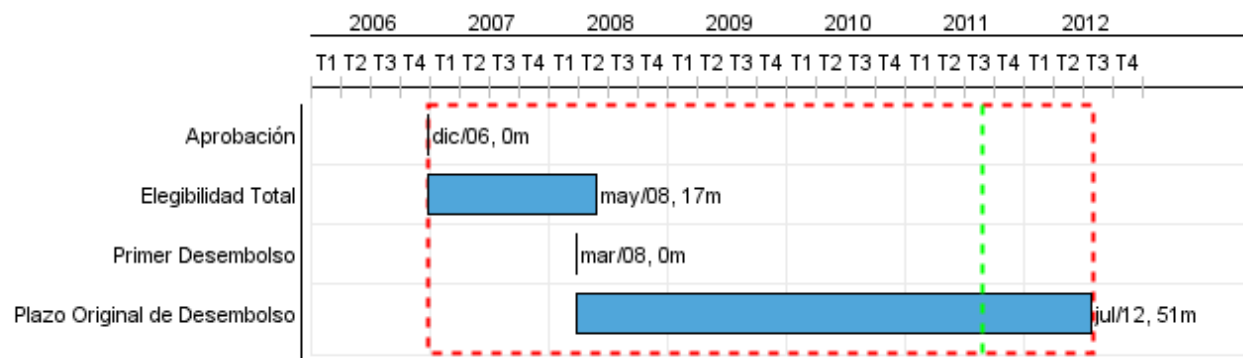

Progreso Acumulado al 2010

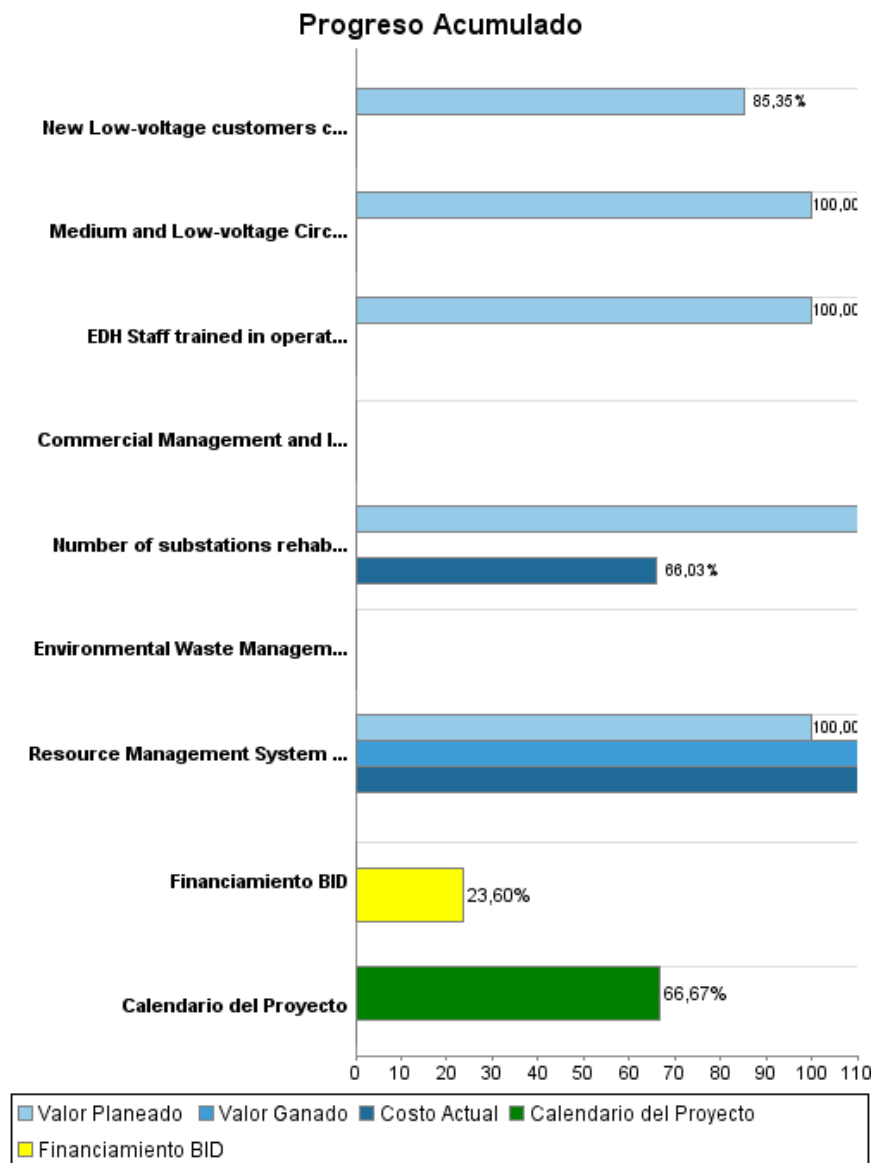

Resultados

Resultado: Technical and non-technical losses in the distribution system reduced.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2012	Fin de Proyecto
Technical losses reduced	MWh/Semestre	48,05	2007	P	30,00	20,05	20,05
				A	48,05		
Billing rate increased	%	75,00	2007	P	80,00	95,00	95,00
				A	75,00		
Cash recovery rate increased	%	30,00	2007	P	45,00	68,00	68,00
				A	30,00		
Number of regular clients increased	Number	57.052,00	2008	P	45,00	22,00	0,00
				A	126,00		

Resultado: Basic distribution system infrastructure improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2012	Fin de Proyecto
Number of electrical outages reduced	number	126,00	2007	P			22,00
				A			

Resultado: Quality of client service improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2012	Fin de Proyecto
Hours of electrical service per day increased in the project zone	number	12,00	2007	P			24,00
				A			

Resultado: EDH Management capacity improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2012	Fin de Proyecto
Increase in Cash Recovery Index	number	32,00	2008	P	99,00	60,00	60,00
				A	96,00		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Rehabilitation of medium and low-voltage works and retailing components									
Number of substations rehabilitated	Number	2,00			6,00	632.000,00			2.632.000,00
Medium and Low-voltage Circuits Rehabilitated	Number	7,00			15,00	72,00			1.811.072,00
New Low-voltage customers connected	Number				55.000,00	1.000.000,00			5.858.000,00
Set up Commercial Management and Institutional Reinforcement System									
Commercial Management and Institutional Reinforcement System set-up	number				1,00				
Resource Management System Operational	number	1,00	1,00		1,00	120.000,00			1.400.000,00
EDH Staff trained in operation of RMS System	number	10,00	4,00		20,00				515.000,00
Environmental Waste Management System	Number of Facilities Built				1,00				300.000,00
TOTAL						1.752.072,00			12.516.072,00
