
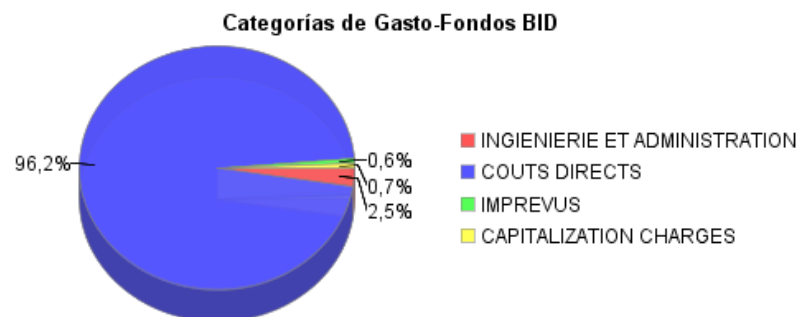
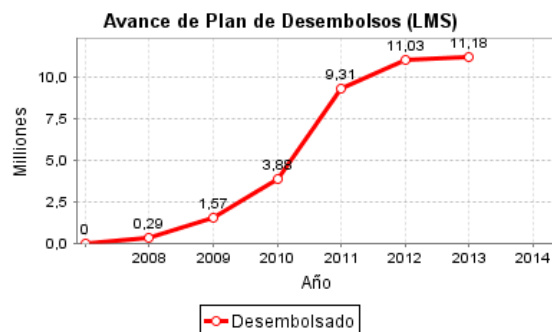



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ENERGIE ET COMMUNICATIONS		
Sector:	ENERGY		
Número(s) de Préstamo:	1813/SF-HA;2394/GR-HA	Monto Aprobado Actual:	18.090.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	11.180.354,36
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	61,80
Operación(es) Relacionada(s):	HA-L1035, HA-L1084	Saldo:	6.909.645,64
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	33.862.110,84
		Actual BID:	18.090.000,00
		Pari-passu:	99,00
		Co-financiamiento/País:	160.000,00
		Estimado Original:	34.022.110,84
		Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 09-abr-2013 Validado por Representante de País: 12-abr-2013

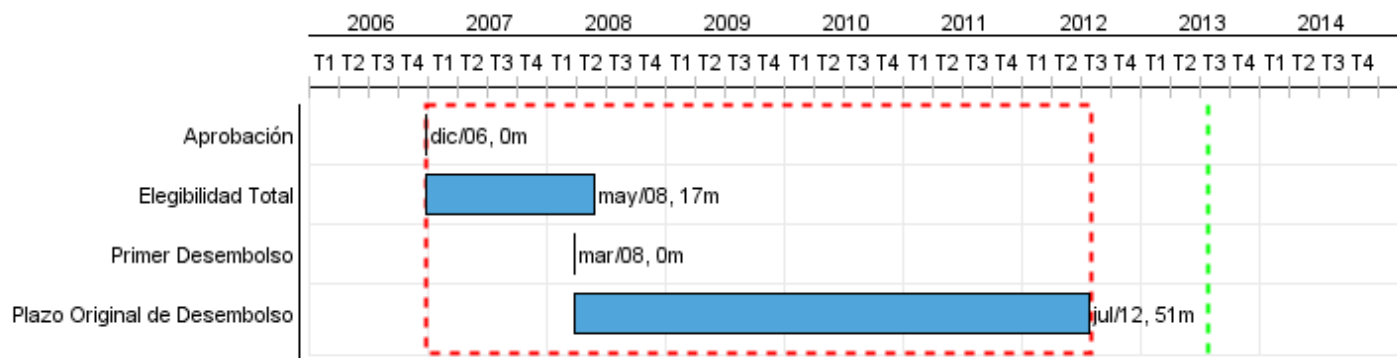

Progreso Acumulado al 2012

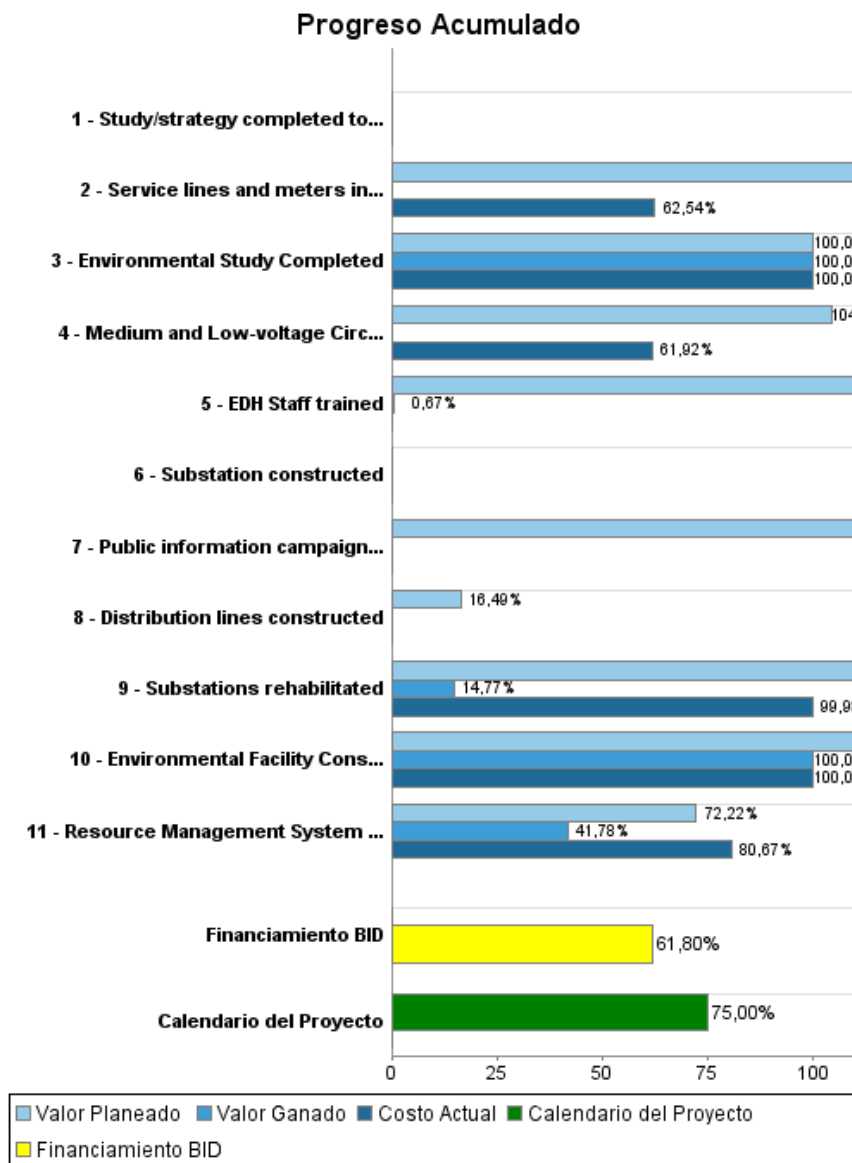

Resultados

Resultado: Technical and non-technical losses in the distribution system reduced.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Technical losses	MWh	48,05	2007	P A	30,05	30,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05
Billing rate	%/month	75,00	2007	P A	80,00	80,00	80,00	84,00	84,00		84,00
Cash recovery rate	%/month	30,00	2007	P A	45,00	45,00	45,00	68,00	68,00	68,00	68,00
									33,10		

Resultado: Basic distribution system infrastructure improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Electrical outages	outages	126,00	2007	P A	33,00	21,00	15,00	15,00	15,00	15,00	22,00

Resultado: Quality of client service improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Energy delivered in the program area	MWh	287,00	2007	P A	287,00	287,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
									285,96		

Resultado: EDH Management capacity improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Transfers from the central government to EDH recorded in the budget	MUSD	50,00	2006	P A	45,00	45,00	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Rehabilitation of medium and low-voltage works and retailing components									
Substations rehabilitated	Substations	1,00	1,00		2.031,00	200.000,00	292.600,00		2.031.000,00
Medium and Low-voltage Circuits Rehabilitated	Circuits	1,00			3,00	1.000.000,00	856.978,00		7.615.000,00
Service lines and meters installed	Meters	10.000,00			35.000,00	924.000,00	469.646,00		3.205.000,00
Substation constructed	Substation				1,00				8.338.000,00
Distribution lines constructed	Kilometers				38,60				2.395.000,00
Set up Commercial Management and Institutional Reinforcement System									
Resource Management System Operational	System				1,00				4.320.000,00
EDH Staff trained	Staff	15,00			54,00	90.000,00			595.000,00
Environmental Facility Constructed	Facility				1,00		17.139,00		221.000,00
Environmental Study Completed	Study				1,00				28.000,00
Study/strategy completed to implement the medium-and long-term investment plan	Study	1,00				250.000,00			
Public information campaign conducted	Campaign	1,00			1,00	75.000,00			80.000,00
Project Administration									
Engineering and Administration	N/A					162.000,00	169.844,00		1.679.000,00
Contingency	N/A								1.180.000,00
Financial Expenses	N/A					15.000,00	5.000,00		65.000,00
TOTAL						2.716.000,00	1.811.207,00		31.752.000,00
