
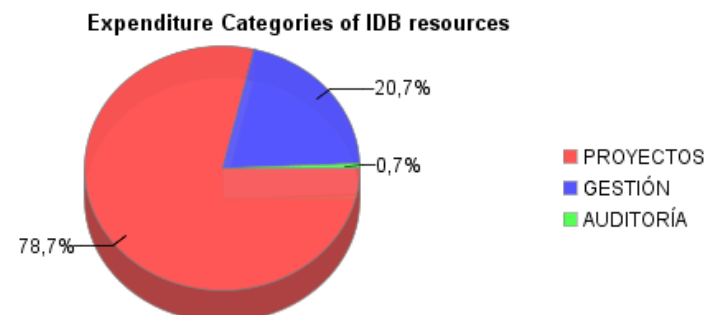




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Ministerio del Ambiente				
Sector:	WATER AND SANITATION-SOLID WASTE, SOCIAL PROJECTS				
Loan Number(s):	2759/OC-PE	Current Approved Amount:	15.000.000,00	Original IDB:	15.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	15.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	81,00
Related Operation(s):	RG-P1400, PE-T1273, RG-P1478	Balance:	15.000.000,00	Co-Financing/Country:	3.500.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	18.500.000,00
				Amortization Period (months):	0

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 11-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013

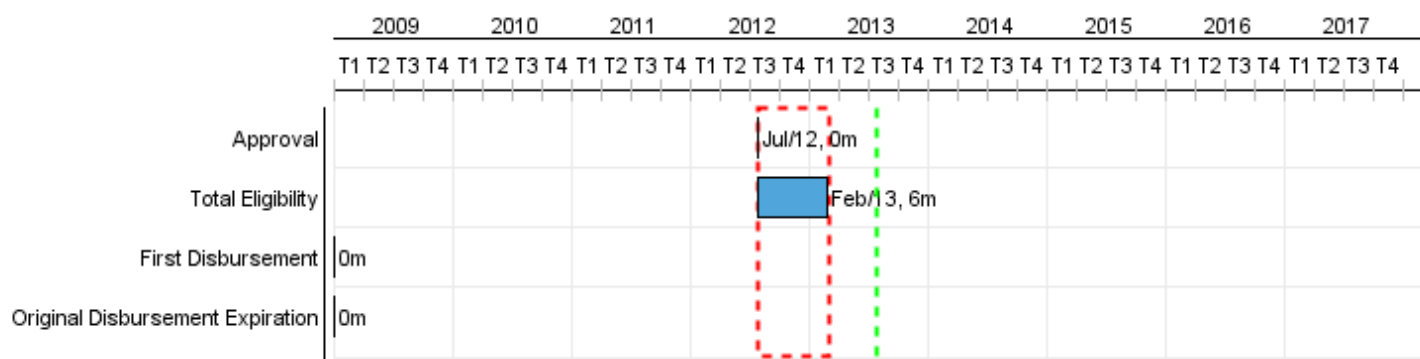

Accumulated Progress as of 2012

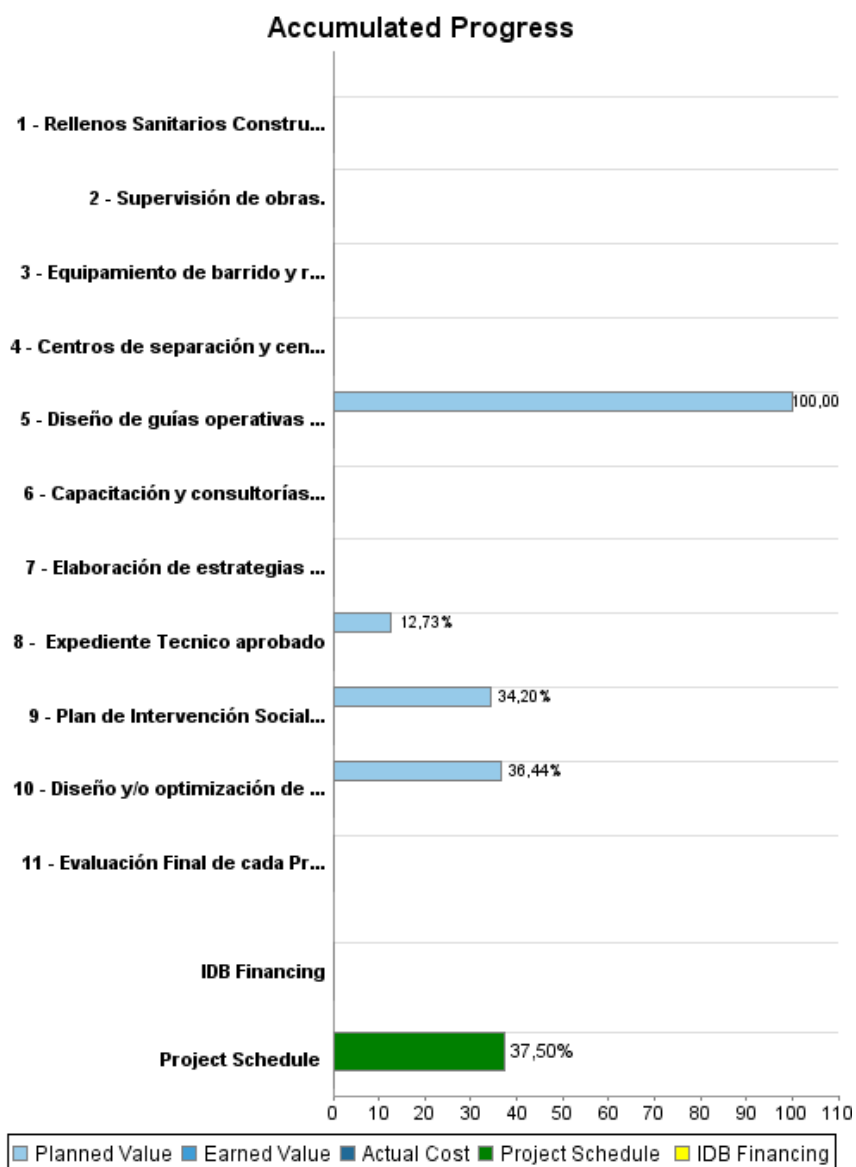

Outcomes

Outcome:	Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en 8 municipalidades operando.
Suppositions:	Municipalidades fortalecidas para operar el Sistema Integral de Residuos Sólidos.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	End of project
Porcentaje de cobertura de barrido de RSU para el proyecto	%	55,00	2012	P A	55,00	62,00	70,00	78,00	85,00
Porcentaje de capacidad de almacenamiento público de RSU en los uno de los ocho proyectos de inversión.	%	22,00	2012	P A	22,00	50,00	65,00	75,00	90,00
Porcentaje de cobertura de prestación del servicio de recolección y transporte de RSU en los ocho proyectos de inversión.	%	76,00	2013	P A	76,00	80,00	84,00	88,00	90,00
Cobertura de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables para los ocho proyectos de inversión.	%		2012	P A		2,00	4,00	6,00	10,00
Toneladas de RSU enviadas a Rellenos Sanitarios en los ocho proyectos de inversión.	Ton/día		2012	P A		10,00	70,00	240,00	342,00
Porcentaje de recuperación de los gastos corrientes de provisión del servicio con recaudación propia del sistema de gestión de residuos sólidos (ingresos por recaudación tarifaria/costos de operación y mantenimiento de los servicios).	%	35,60	2010	P A	36,00	39,00	42,00	48,00	55,00
Reducción de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos domésticos.	%	100,00	2012	P A	95,00	85,00	70,00	60,00	50,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Proyectos									
Equipamiento de barrido y recolección adquiridos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Equipamiento				8,00				2.251.000,00
Diseño y/o optimización de rutas de recolección por cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Plan				8,00				118.000,00
Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Centros				7,00				601.000,00
Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Obras				8,00				10.142.000,00
Capacitación y consultorías técnica, financiera y administrativa, para cada uno de los ocho proyectos.	Municipalidad fortalecida				8,00				399.000,00
Elaboración de estrategias de comunicación social y ambiental para cada uno de los ocho proyectos.	Plan Ejecutado				8,00				629.000,00
Supervisión de obras.	Informe				8,00				710.000,00
Evaluación Final de cada Proyecto de Inversión Pública (PIP).	Informe				8,00				250.000,00
Gestión									
Expediente Técnico aprobado	Expediente Técnico				8,00				2.200.000,00
Diseño de guías operativas para el manejo de los residuos sólidos.	Guía				4,00				31.000,00
Plan de Intervención Social implementado.	Plan				1,00				769.000,00
Gestión del Proyecto y Auditorías.	N/A								400.000,00
TOTAL									18.500.000,00
