

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Sector:	ENERGY-POWER LINES
Número(s) de Préstamo:	2016/BL-HO
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	28.550.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	4.650.183,00
% Desembolsado:	16,29
Saldo:	23.899.817,00

### Costo total y Fuente

BID Original:	28.550.000,00
Actual BID:	28.550.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	2.760.000,00
Estimado Original:	31.310.000,00
Período de Amortización (meses):	282




### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

### Reformulación


### Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Mar 30, 2011  
Validado por Representante de País: Apr 15, 2011

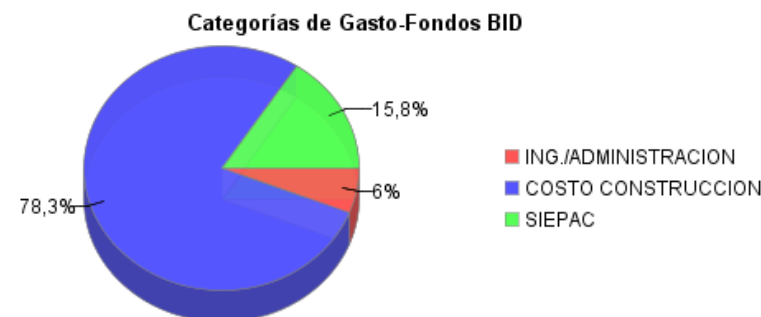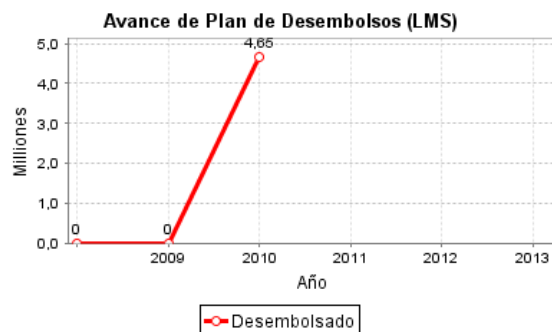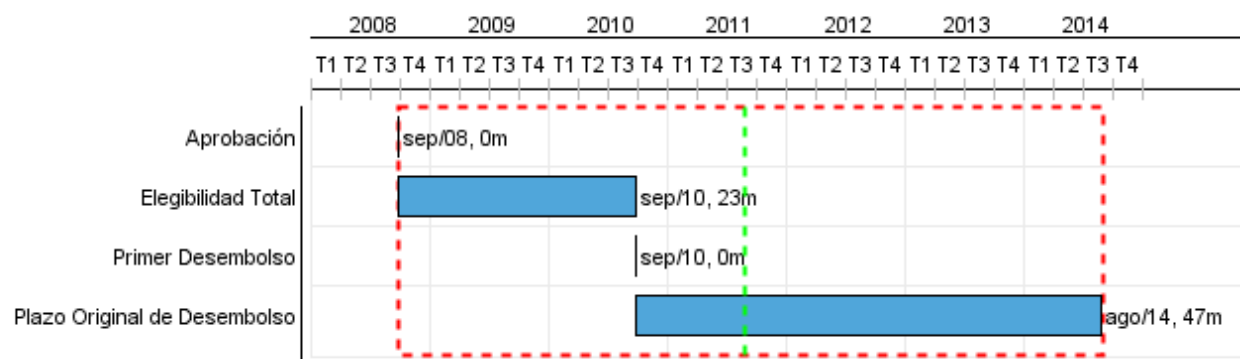

## Progreso Acumulado al 2010

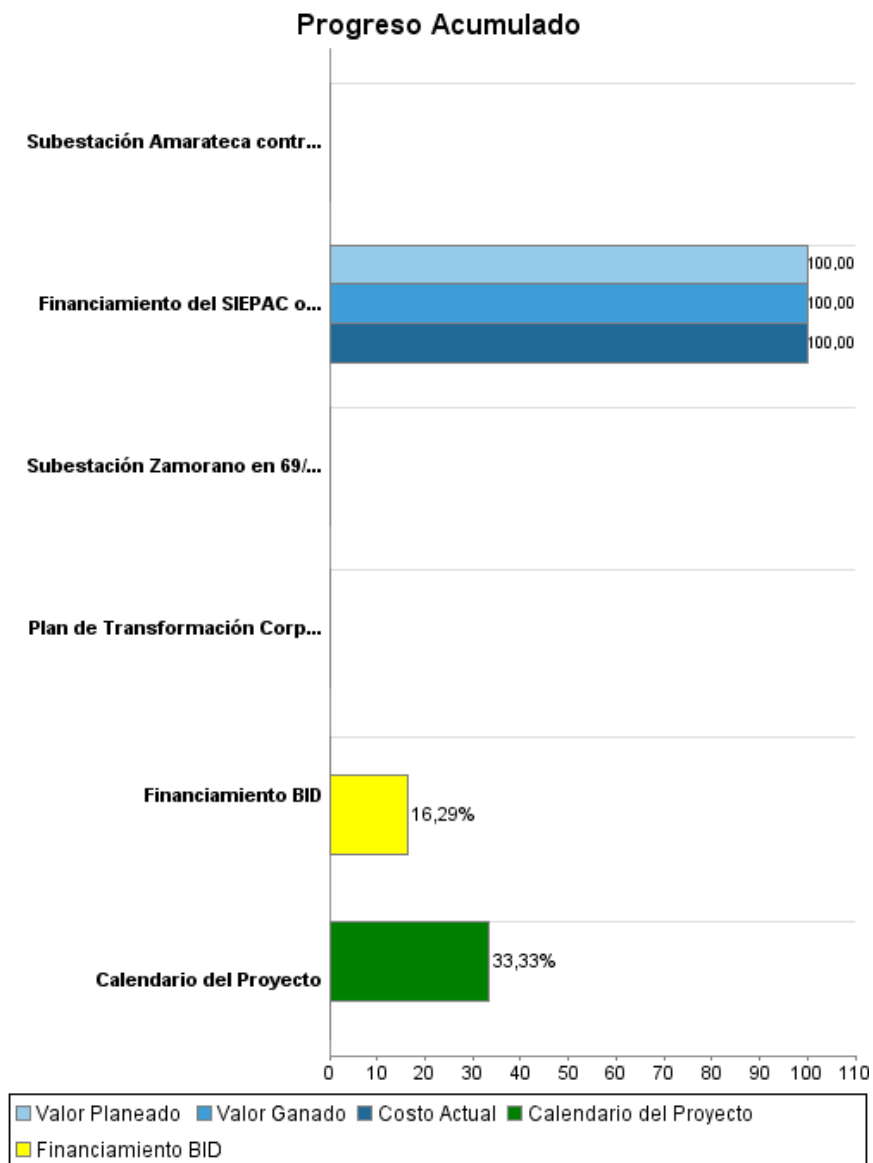

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Suministro de electricidad del país asegurado para satisfacer el crecimiento de la demanda.
<b>Observaciones:</b>	ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Electricidad suministrada a la demanda conectada al sistema interconectado nacional.	GWh	6.227,50	2007	P	7.775,80
				A	
Cash Recovery Index (CRI) global de la ENEE incrementado	Porcentaje	72,00	2007	P	82,00
				A	

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.</b>									
Subestación Amarateca contruida y en operación	Subestación				1,00				21.551.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00				1.359.000,00
<b>Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.</b>									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00				
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia	1,00	1,00		1,00	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>27.410.000,00</b>
