
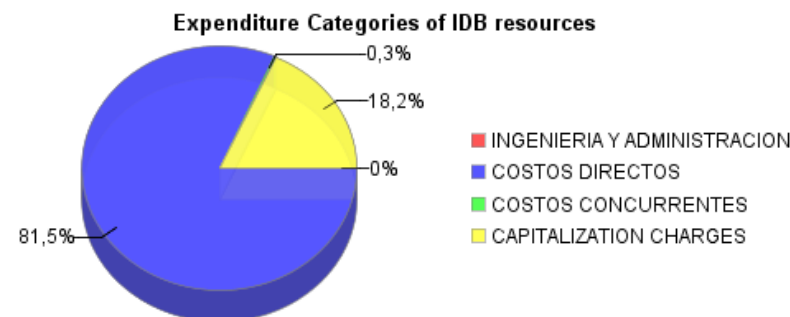
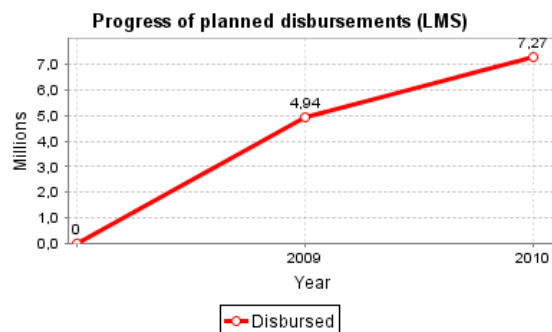



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.E.S.P.				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	1199/OC-CO	Current Approved Amount:	25.090.000,02	Original IDB:	38.600.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	25.090.000,02	Current IDB:	25.090.000,02
Operation Type:	LON - Loan Operation	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	49,06
Related Operation(s):	TC9607419	Balance:		Co-Financing/Country:	10.959.345,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	49.559.345,00
				Amortization Period (months):	240

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 24, 2011 Validated by Country Representative: Apr 15, 2011

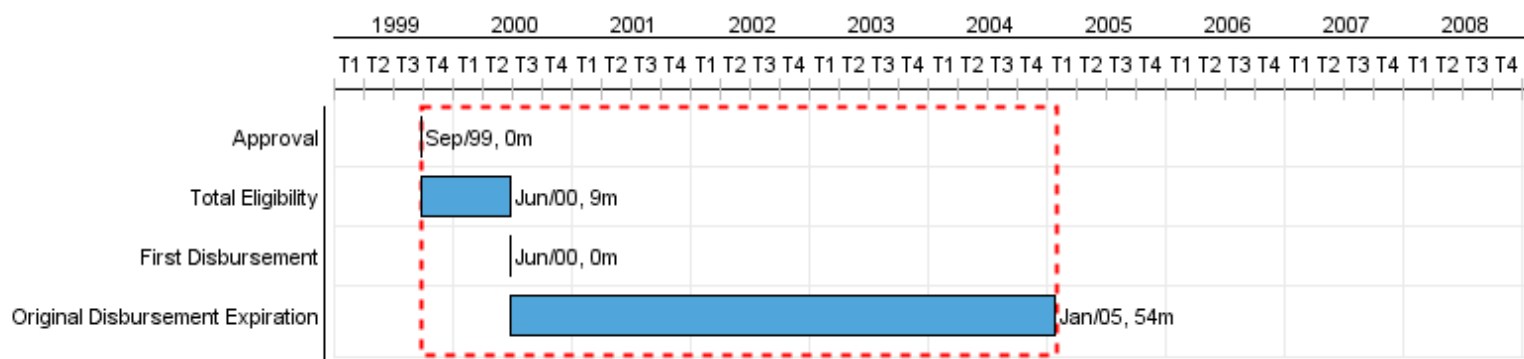

## Accumulated Progress as of 2010

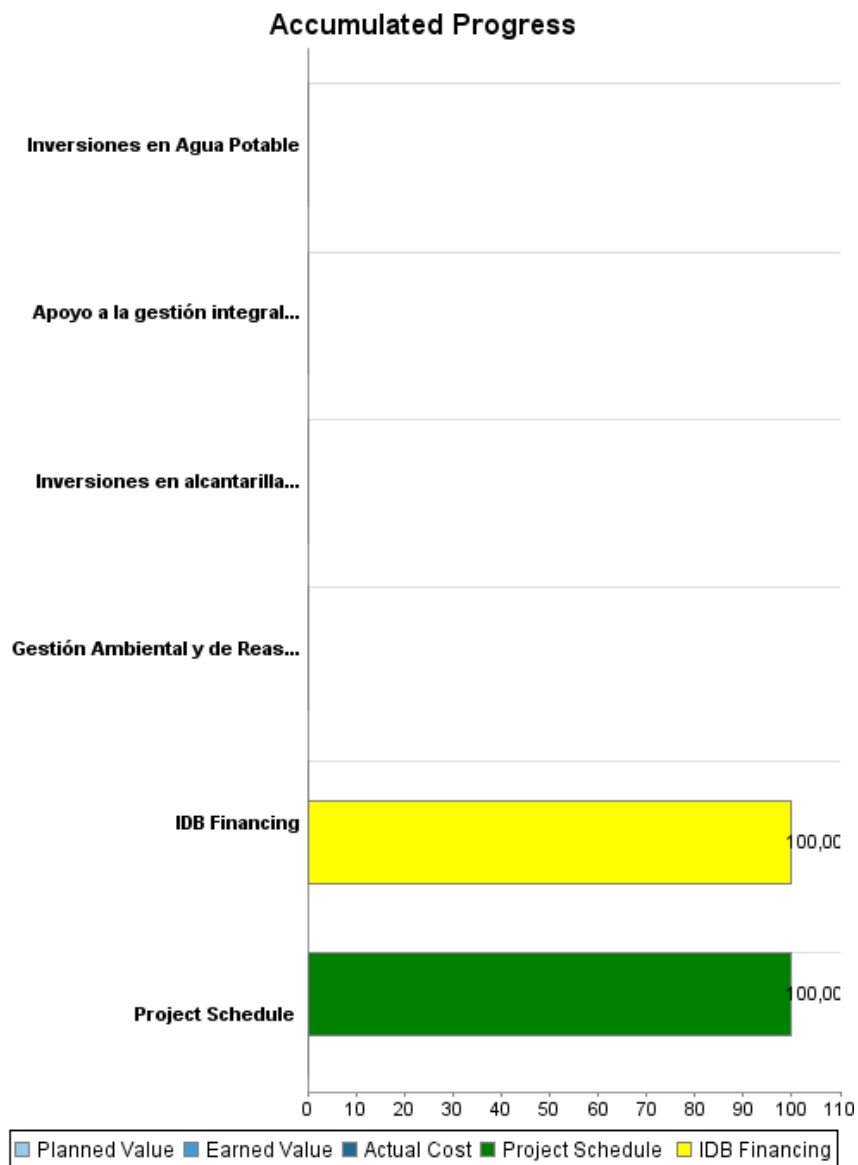

## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Pereira, proporcionando servicios de agua potable y saneamiento eficientes y de alta calidad bajo un esquema empresarial operativo y financieramente sustentable.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2006	2008	2009	End of project
1.1 A. Cobertura de agua potable.	% de cobertura	98,39		P	96,87		99,00	99,00
				A		99,04	100,00	
1.1.B. Cobertura de alcantarillado.	% de cobertura	94,63		P	93,25		96,00	96,00
				A		94,58	96,88	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos	% Índice de continuidad	99,61		P	99,00		99,00	99,00
1.2.A. Continuidad del Servicio				A		99,36	99,38	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos	%	25,00		P	25,00		25,00	25,00
1.2. B. Generación Interna de Caja				A		25,00	25,00	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos.	% Margen	61,34		P	57,50		56,00	56,00
1.2.C. Margen de Operación				A		56,15	58,83	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos.	%	99,28		P	97,00		96,65	96,65
1.2.D. Eficiencia de Recaudo.				A		98,17	99,20	
1.3 Capacidad de almacenamiento de agua potable.	*1000 M3			P	3,20		8,20	8,20
				A		8,30	8,30	
1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas.	%	38,00		P	42,00		75,00	75,00
1.4.A. Quebradas o ríos saneados				A		71,00	90,00	
1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas.	%	19,00		P			70,00	70,00
1.4.B. Aguas Residuales Interceptadas.				A		49,80	88,00	
1.5 Agua no contabilizada (IANC).	%	36,72		P	34,00		30,00	30,00
				A		31,68	29,94	
1.6 Familias marginadas de la zona suroccidental de la ciudad con servicios de agua potable.	%	100,00		P	100,00		100,00	100,00
				A		100,00	100,00	

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Inversiones en alcantarillado realizadas.</b>									
Inversiones en alcantarillado realizadas.									
<b>Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas</b>									
Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas									
<b>Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira</b>									
Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira									
<b>Inversiones en Agua Potable</b>									
Inversiones en Agua Potable									
<b>TOTAL</b>									
