
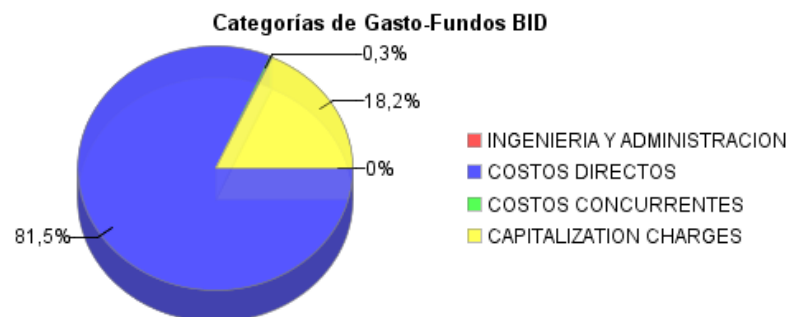
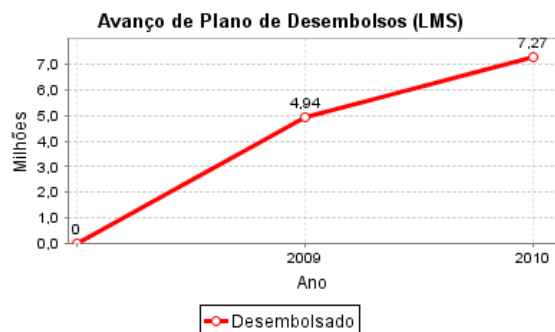



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.E.S.P.	
Sector:	WATER AND SANITATION	
Número da Operação:	1199/OC-CO	Atual: 25.090.000,02
Estágio:	Approved	Desembolsado: 25.090.000,02
Tipo Operação:	LON - Loan Operation	% Desembolsado: 100,00
Operação Relacionada:	TC9607419	Saldo:
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation	
		Original BID: 38.600.000,00
		Corrente BID: 25.090.000,02
		Pari-passu: 49,06
		Cofinanciamento/País: 10.959.345,00
		Original Estimado: 49.559.345,00
		Período de Amortização (meses): 240

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 24, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011

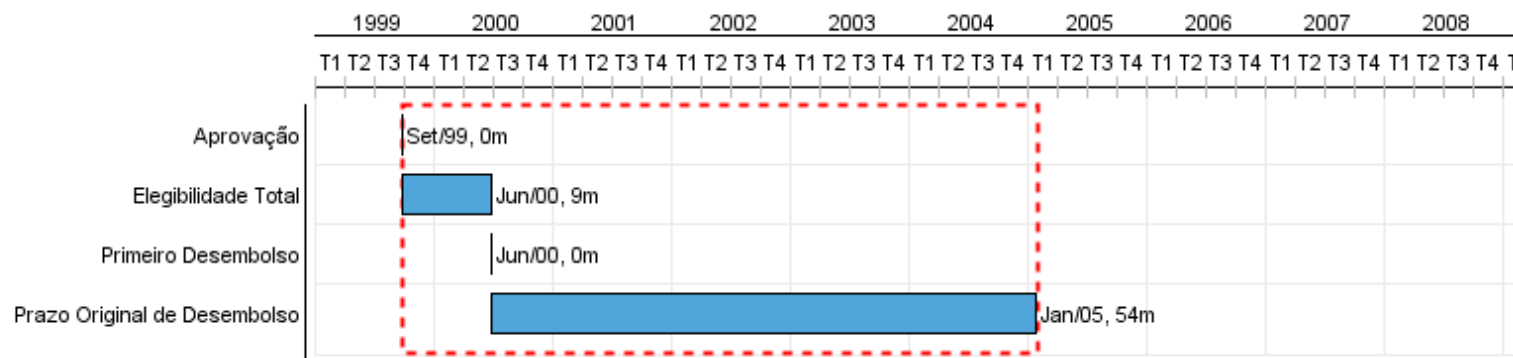

## Progresso Acumulado até 2010

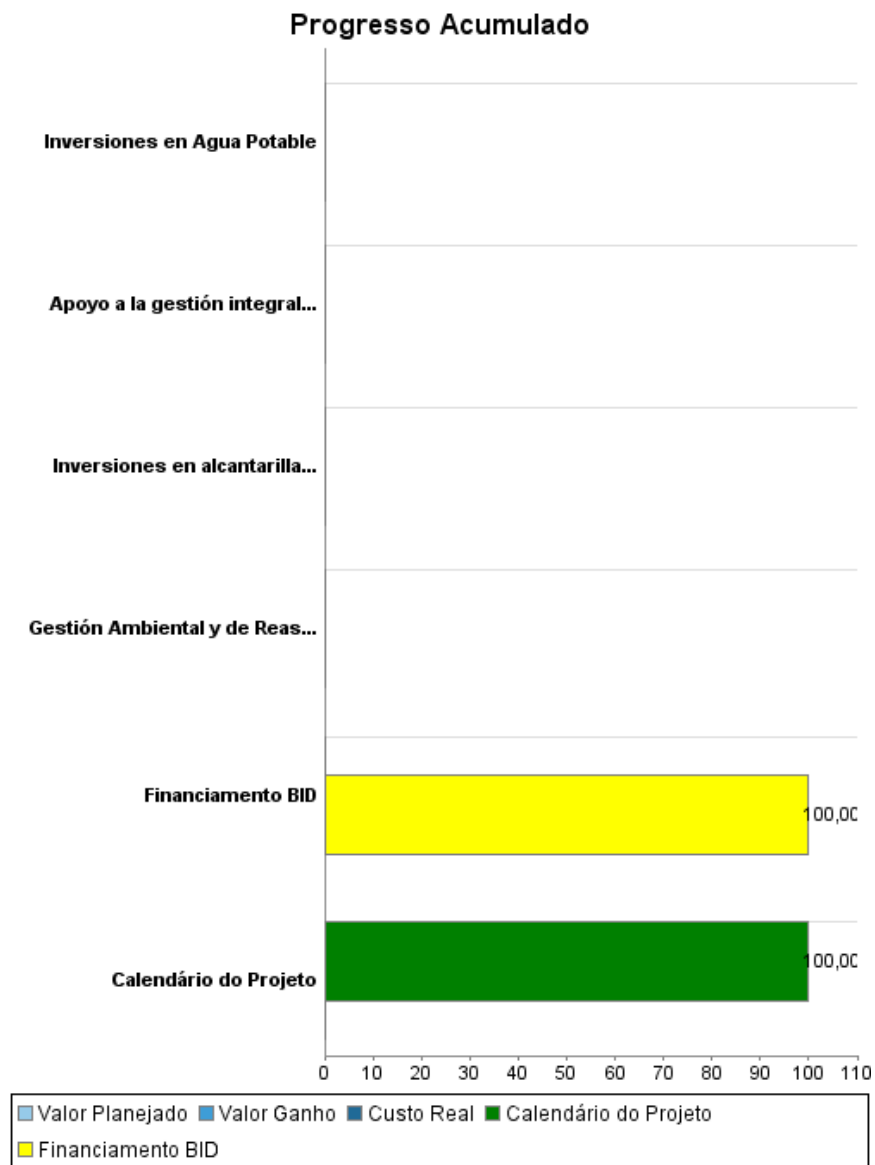

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Pereira, proporcionando servicios de agua potable y saneamiento eficientes y de alta calidad bajo un esquema empresarial operativo y financieramente sustentable.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2008	2009	Final do Projeto
1.1 A. Cobertura de agua potable.	% de cobertura	98,39		P	96,87		99,00	99,00
				A		99,04	100,00	
1.1.B. Cobertura de alcantarillado.	% de cobertura	94,63		P	93,25		96,00	96,00
				A		94,58	96,88	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos	% Índice de continuidad	99,61		P	99,00		99,00	99,00
1.2.A. Continuidad del Servicio				A		99,36	99,38	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos	%	25,00		P	25,00		25,00	25,00
1.2. B. Generación Interna de Caja				A		25,00	25,00	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos.	% Margen	61,34		P	57,50		56,00	56,00
1.2.C. Margen de Operación				A		56,15	58,83	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos.	%	99,28		P	97,00		96,65	96,65
1.2.D. Eficiencia de Recaudo.				A		98,17	99,20	
1.3 Capacidad de almacenamiento de agua potable.	*1000 M3			P	3,20		8,20	8,20
				A		8,30	8,30	
1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas.	%	38,00		P	42,00		75,00	75,00
1.4.A. Quebradas o ríos saneados				A		71,00	90,00	
1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas.	%	19,00		P			70,00	70,00
1.4.B. Aguas Residuales Interceptadas.				A		49,80	88,00	
1.5 Agua no contabilizada (IANC).	%	36,72		P	34,00		30,00	30,00
				A		31,68	29,94	
1.6 Familias marginadas de la zona suroccidental de la ciudad con servicios de agua potable.	%	100,00		P	100,00		100,00	100,00
				A		100,00	100,00	

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Inversiones en alcantarillado realizadas.</b>									
Inversiones en alcantarillado realizadas.									
<b>Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas</b>									
Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas									
<b>Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira</b>									
Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira									
<b>Inversiones en Agua Potable</b>									
Inversiones en Agua Potable									
<b>TOTAL</b>									
