
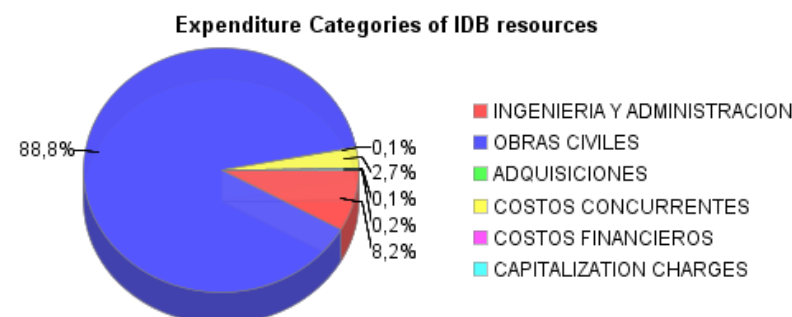
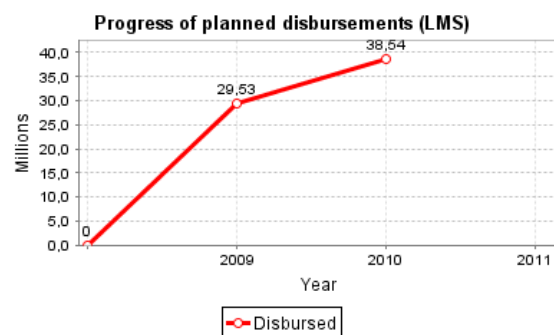


Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES				
Sector:	TRANSPORTATION-MAJOR HIGHWAYS				
Loan Number(s):	1278/OC-PR-2;1278/OC-PR-1;1278/OC-PR-1-CPS ;1278/OC-PR-2-CPS	Current Approved Amount:	99.615.396,27	Original IDB:	200.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	99.615.396,27	Current IDB:	99.615.396,27
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	83,62
Related Operation(s):		Balance:		Co-Financing/Country:	30.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	230.000.000,00
				Amortization Period (months):	168

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 26, 2011 Validated by Country Representative: Apr 26, 2011

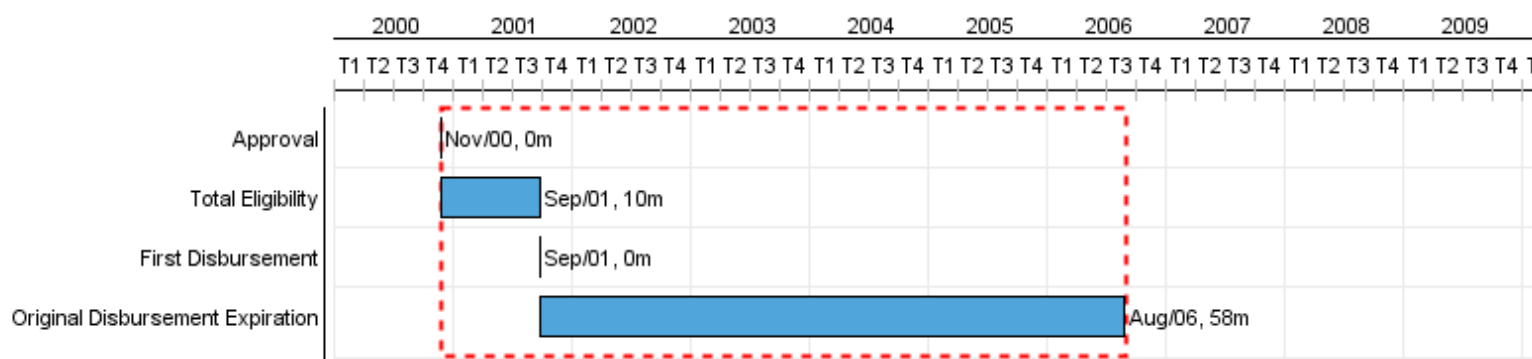

Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	Reducir los costos de transportes y tiempos de viaje de las áreas de producción agrícola y pecuaria de la Región Occidental del Chaco hasta Asunción y las fronteras con Bolivia , Argentina y Brasil
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	End of project
El volumen de tráfico de la Ruta 9 aumentará en 30%	%	100,00	2001	P A	130,00	130,00
Los costos de flete de transporte en la ruta N°9 se reducirán en términos reales 20%	%	100,00	2001	P A	80,00	80,00
El tiempo de viaje de la Ruta N°9 hasta la patria se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P A	60,00	60,00
Los accidentes en la Ruta N°9 se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P A	50,00	50,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN									
Apoyo a la Administración del Programa	Consultorías		1,00		12,00		455.471,00		
Supervisión de Obras	Nº de Obras fiscalizadas				12,00		11.685.803,00		
Estudio de Auscultación de Pavimentos	Consultoría				1,00		199.717,00		
OBRAS CIVILES									
Rehabilitación de la Ruta Nº 9	km				495,00		19.361.003,00		
Mejoramiento de la Ruta 9, tramo Mcal Estigarribia - La Patria	km				123,00		31.667.215,00		
Mejoramiento de Corredores de Integración de la Región Occidental	km				647,00		71.895.588,00		
Mantenimiento Vial de la Región Occidental	km				2.000,00		11.412.521,00		
Edificación y equipamiento de Casetas de Control de peso, y Sedes Distritales	obras				4,00		3.189.067,00		
Pavimentación del Tramo Yuty-Leandro Oviedo (Ruta 8)	km				14,00		3.375.957,00		
ADQUISICIONES									
Equipos para control de peso	equipo				2,00				
Materiales para ejecución de tramos piloto	etapas de impl ementación del convenio		1,00		3,00				
GASTOS CONCURRENTES									
Entrenamiento y Capacitación de personal	Grupos fortalecidos				3,00				
Protección ambiental y desarrollo de comunidades	hectáreas				12.000,00		824.445,00		
Fortalecimiento institucional y asesoramiento	personal incremental para la DV						800.416,00		
Apoyo para el programa de Investigación del Tramo Piloto	consultorías				1,00		33.427,00		
Imprevisto y Escalamiento	-								
GASTOS FINANCIEROS									
Intereses, Gastos Administrativos, Comisión de Crédito y gastos de inspección y Vigilancia.	-						12.190.195,00		
TOTAL							167.090.825,00		
