
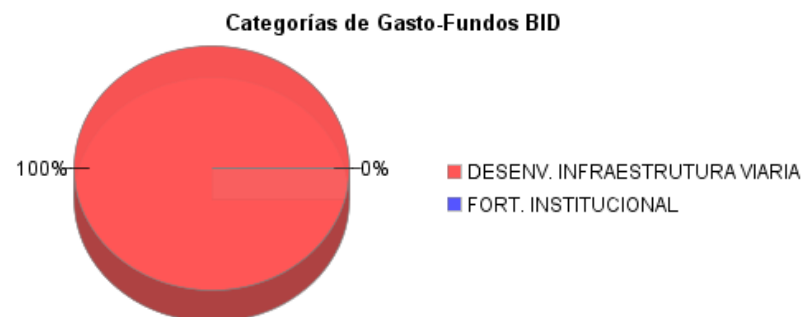
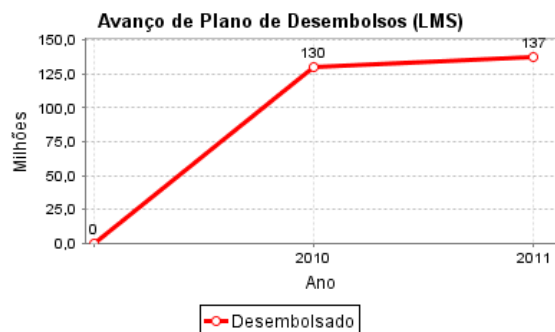



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MINAS GERAIS		
Sector: TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS		
Número da Operação: 2306/OC-BR	Atual: 137.000.000,00	Original BID: 137.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 130.000.000,00	Corrente BID: 137.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 94,89	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada:	Saldo: 7.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: GOM - Global of Multiple Works Operation		Original Estimado: 137.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 23, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 28, 2011

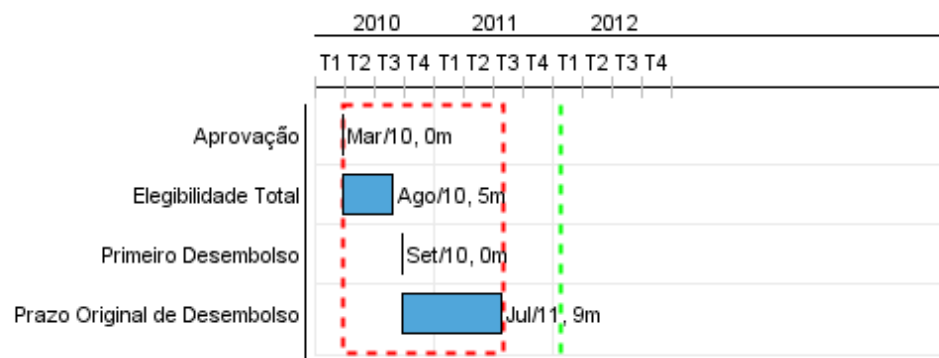

Progresso Acumulado até 2011

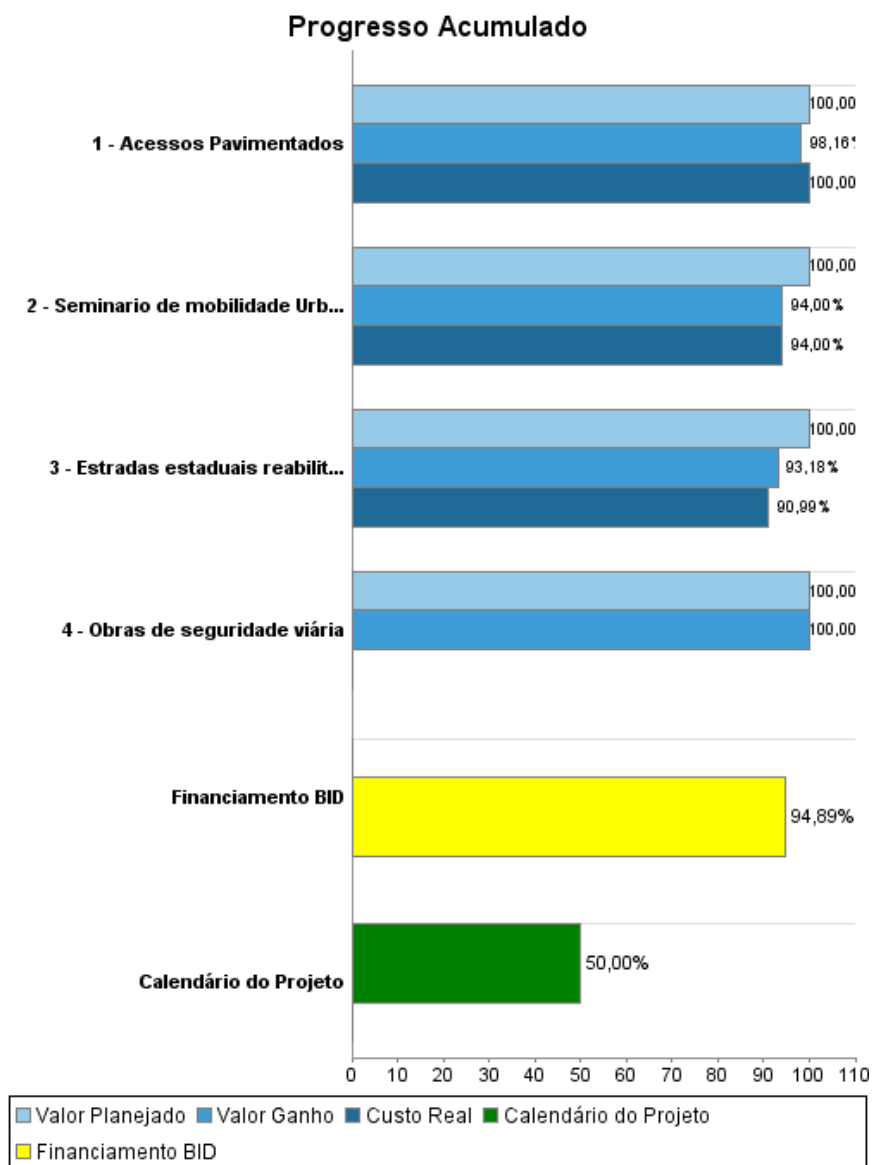

Resultados

Resultado:	Condições de transitabilidade melhoradas
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Rede viária pavimentada do Estado mantida com contratos do PROMG	km	15.700,00	2008	P A	22.294,00
Número de municípios com acesso pavimentado	Unidade	737,00	2008	P A	847,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Infraestrutura viária estadual desenvolvida.									
Acessos Pavimentados	Quilômetro	1.020,00	500,00		5.100,00	3.735.000,00			103.735.000,00
Estradas estaduais reabilitadas	Quilômetro	2.510,00	1.000,00		9.340,00	3.265.000,00			28.815.000,00
Obras de seguridade viária	Quilômetro	60,00	40,00		120,00				4.400.000,00
Fortalecimento Institucional									
Seminário de mobilidade Urbana da RMBH realizado	seminario	1,00			1,00				50.000,00
TOTAL						7.000.000,00			137.000.000,00
