
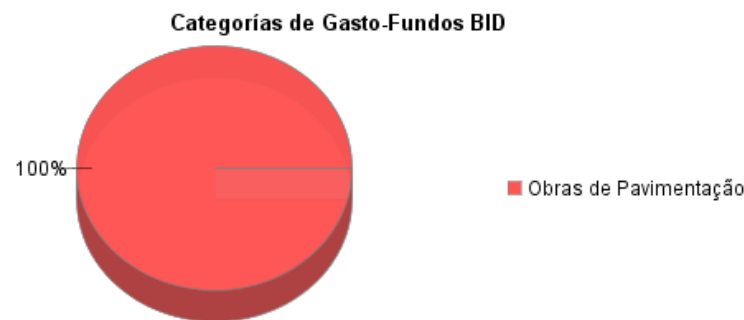
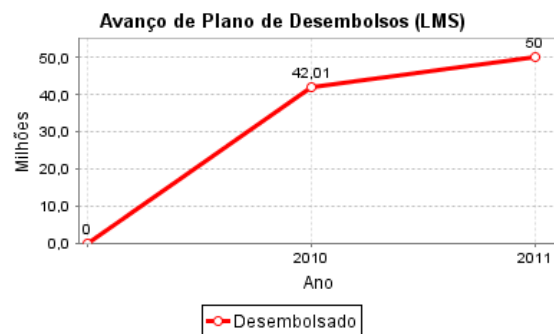



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MINAS GERAIS		
Sector:	TRANSPORTATION-SECONDARY ROADS		
Número da Operação:	2281/OC-BR	Atual:	50.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	48.427.645,36
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	96,86
Operação Relacionada:	BR-L1027, BR-X1002	Saldo:	1.572.354,64
Subtipo de Operação:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)		
		Original BID:	50.000.000,00
		Corrente BID:	50.000.000,00
		Pari-passu:	60,00
		Cofinanciamento/País:	33.335.000,00
		Original Estimado:	83.335.000,00
		Período de Amortização (meses):	246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 23, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 28, 2011

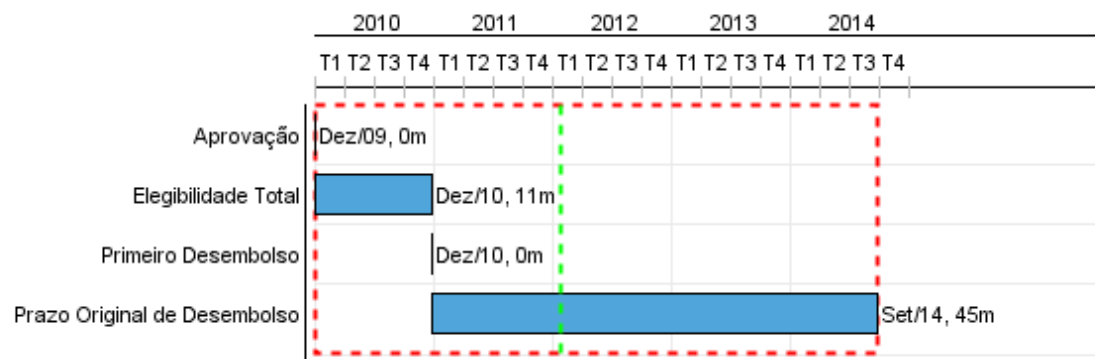

Progresso Acumulado até 2011

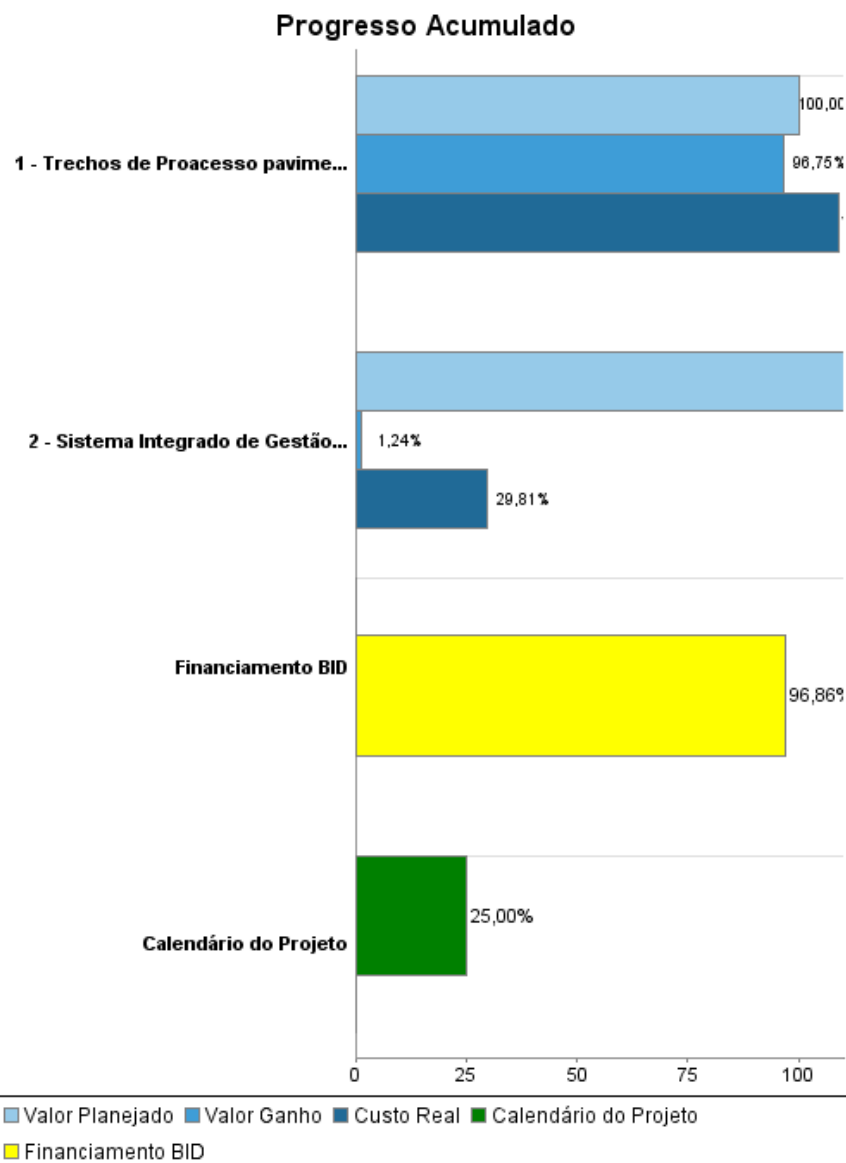

Resultados

Resultado: Condições de transitabilidade melhoradas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Custo Operacional médio de veículos	US\$/veiculo-km	0,78	2007	P A	0,51
Tempo de viagem	min	56,00	2007	P A	38,00

Resultado: Fortalecimento Institucional do DER_MG

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Indice de Partidas Programadas - IPP - Incrementado	%	83,05	2007	P A	91,40
Tarifas de transporte interurbano	R\$	0,23	2007	P A	0,20

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1231 - Acesso Viário a Pequenos Municípios de Minas Gerais - Segundo Programa
CCLIP
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 26/08/2011

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Investimentos para a melhora da infraestrutura viária									
Trechos de Processo pavimentados	Quilômetro	117,00	90,04		362,00	10.166.000,00	14.191.904,36		71.997.000,00
Fortalecimento Institucional do DER (Departamento de Estradas de Rodagem - Minas Gerais)									
Sistema Integrado de Gestão implementado	sistema	1,00			2,00		1.229.184,31		4.303.000,00
Gastos financeiros e de administração									
TOTAL						10.166.000,00	15.421.088,67		76.300.000,00
