
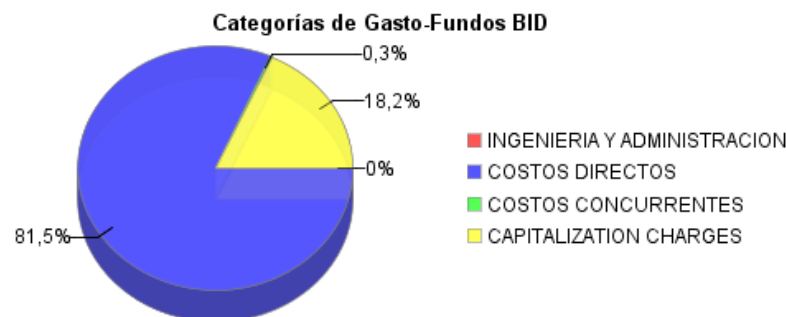
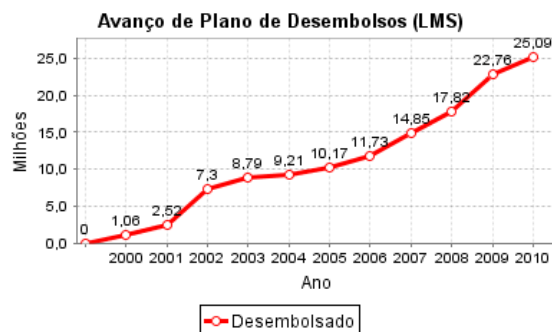



Relatório Resumido

| Dados Gerais | | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| Executor: | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.E.S.P. | | |
| Sector: | WATER AND SANITATION | | |
| Número da Operação: | 1199/OC-CO | Atual: | 25.090.000,02 |
| Estágio: | Approved | Desembolsado: | 25.090.000,02 |
| Tipo Operação: | LON - Loan Operation | % Desembolsado: | 100,00 |
| Operação Relacionada: | TC9607419 | Saldo: | |
| Subtipo de Operação: | ESP - Specific Investment Operation | | |
| | | Original BID: | 38.600.000,00 |
| | | Corrente BID: | 25.090.000,02 |
| | | Pari-passu: | 49,06 |
| | | Cofinanciamento/País: | 10.959.345,00 |
| | | Original Estimado: | 49.559.345,00 |
| | | Período de Amortização (meses): | 240 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|------------------------------|--|---|
| Categoria do impacto social: | B(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: Oct 17, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 24, 2011 |

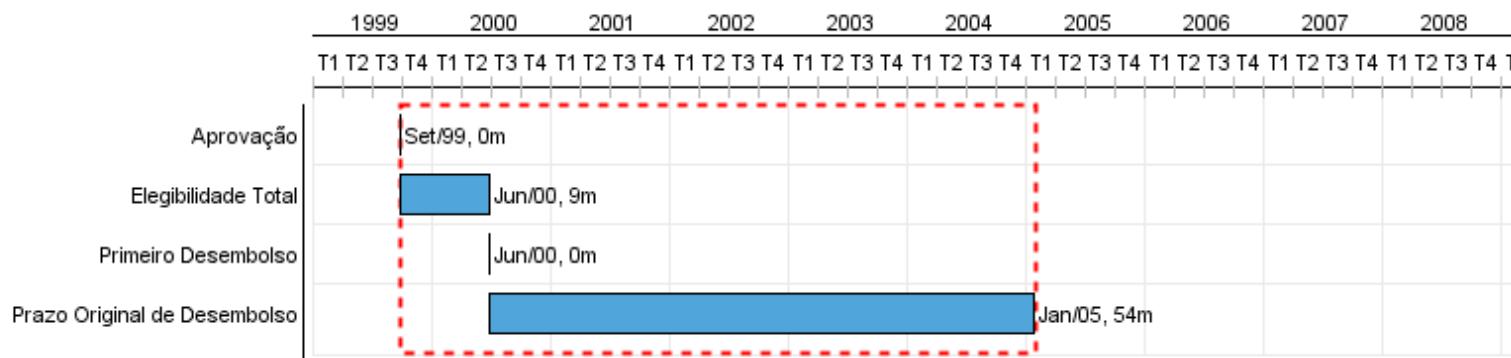

Progresso Acumulado até 2011

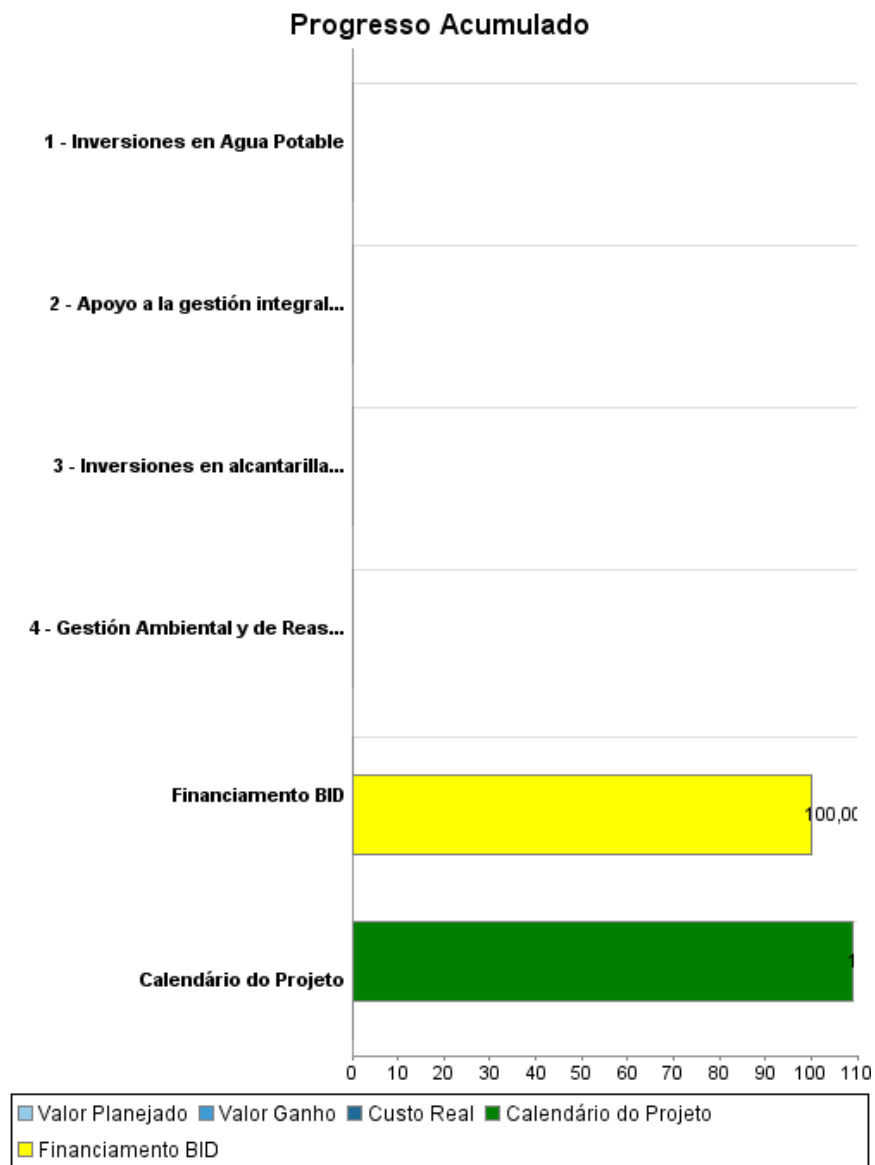

Resultados

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Pereira, proporcionando servicios de agua potable y saneamiento eficientes y de alta calidad bajo un esquema empresarial operativo y financieramente sustentable. |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2006 | 2008 | 2009 | Final do Projeto |
|--|-------------------------|------------|----------------|---|--------|--------|--------|------------------|
| 1.1 A. Cobertura de agua potable. | % de cobertura | 98,39 | | P | 96,87 | | 99,00 | 99,00 |
| | | | | A | | 99,04 | 100,00 | |
| 1.1.B. Cobertura de alcantarillado. | % de cobertura | 94,63 | | P | 93,25 | | 96,00 | 96,00 |
| | | | | A | | 94,58 | 96,88 | |
| 1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos | % Índice de continuidad | 99,61 | | P | 99,00 | | 99,00 | 99,00 |
| 1.2.A. Continuidad del Servicio | | | | A | | 99,36 | 99,38 | |
| 1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos | % | 25,00 | | P | 25,00 | | 25,00 | 25,00 |
| 1.2. B. Generación Interna de Caja | | | | A | | 25,00 | 25,00 | |
| 1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos. | % Margen | 61,34 | | P | 57,50 | | 56,00 | 56,00 |
| 1.2.C. Margen de Operación | | | | A | | 56,15 | 58,83 | |
| 1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos. | % | 99,28 | | P | 97,00 | | 96,65 | 96,65 |
| 1.2.D. Eficiencia de Recaudo. | | | | A | | 98,17 | 99,20 | |
| 1.3 Capacidad de almacenamiento de agua potable. | *1000 M3 | | | P | 3,20 | | 8,20 | 8,20 |
| | | | | A | | 8,30 | 8,30 | |
| 1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas. | % | 38,00 | | P | 42,00 | | 75,00 | 75,00 |
| 1.4.A. Quebradas o ríos saneados | | | | A | | 71,00 | 90,00 | |
| 1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas. | % | 19,00 | | P | | | 70,00 | 70,00 |
| 1.4.B. Aguas Residuales Interceptadas. | | | | A | | 49,80 | 88,00 | |
| 1.5 Agua no contabilizada (IANC). | % | 36,72 | | P | 34,00 | | 30,00 | 30,00 |
| | | | | A | | 31,68 | 29,94 | |
| 1.6 Familias marginadas de la zona suroccidental de la ciudad con servicios de agua potable. | % | 100,00 | | P | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | A | | 100,00 | 100,00 | |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|--|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|------------|-------|-------------------|------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Inversiones en alcantarillado realizadas. | | | | | | | | | |
| Inversiones en alcantarillado realizadas. | | | | | | | | | |
| Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas | | | | | | | | | |
| Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas | | | | | | | | | |
| Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira | | | | | | | | | |
| Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira | | | | | | | | | |
| Inversiones en Agua Potable | | | | | | | | | |
| Inversiones en Agua Potable | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
