
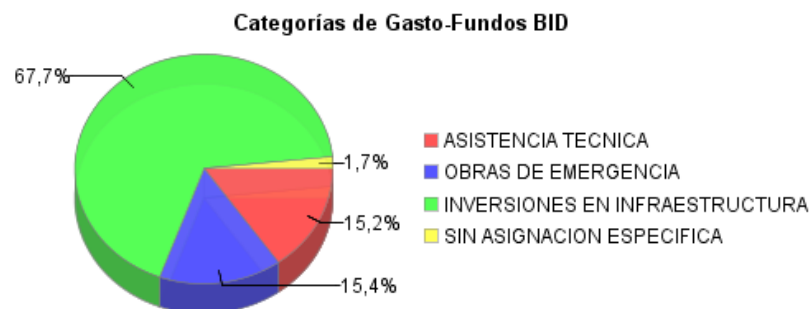
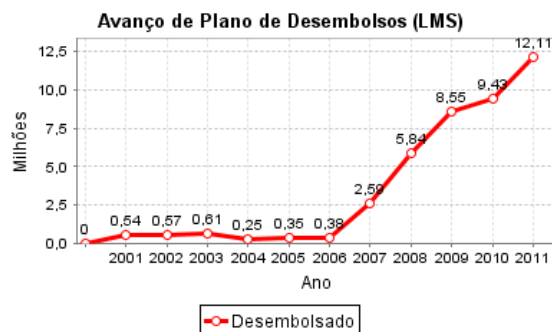



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO		
Sector: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: 1198/OC-DR-1;1198/OC-DR-2	Atual: 31.300.000,00	Original BID: 71.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 11.507.627,09	Corrente BID: 31.300.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 36,77	Pari-passu: 80,00
Operação Relacionada: TC9610389	Saldo: 19.792.372,91	Cofinanciamento/País: 18.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 89.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 102

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 28, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011

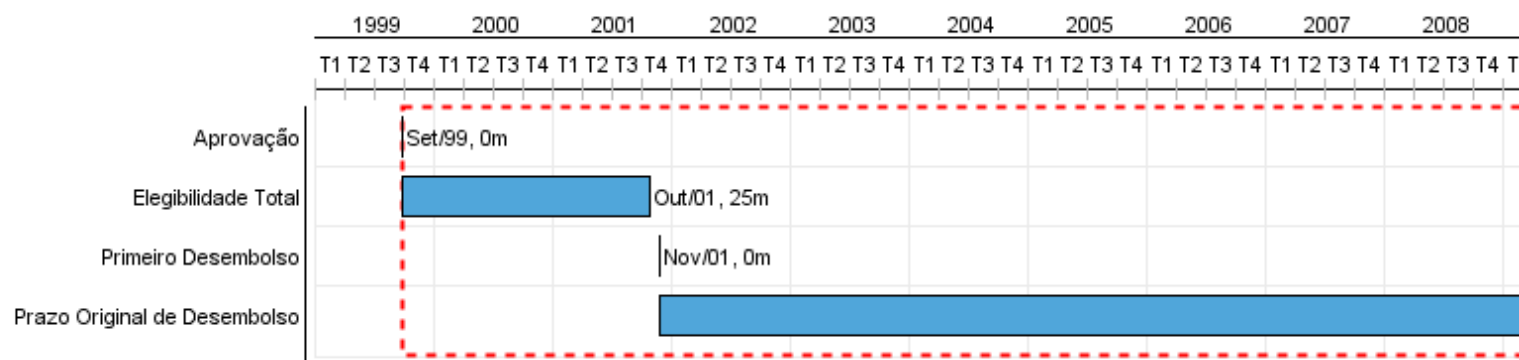

Progresso Acumulado até 2011

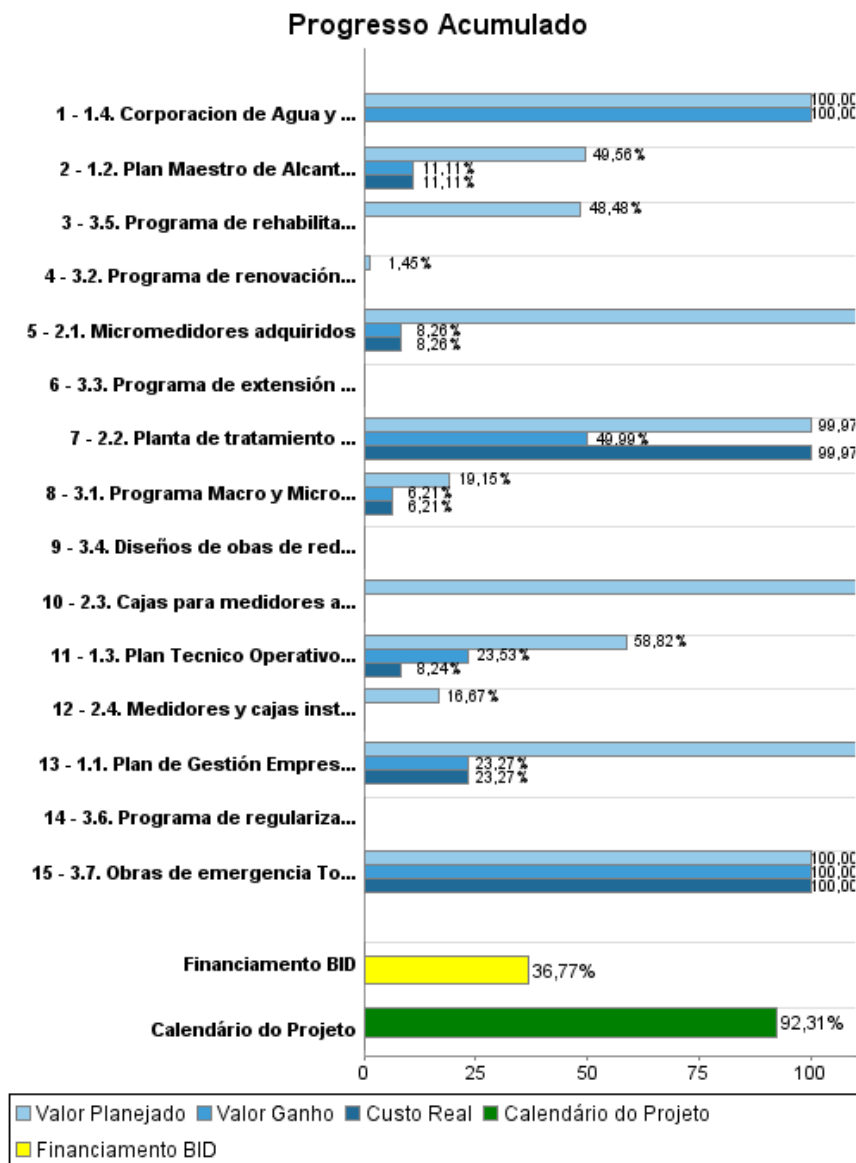

Resultados

Resultado: Capacidad técnica y comercial de la Corporación de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Clientes registrados en sistemas comerciales	%	60,00	2009	P	60,00	60,00	70,00	70,00
				A	60,00			
Clientes registrados con micromedición	%	27,00	2009	P	27,00	27,00	40,00	40,00
				A	27,00			
Índice de Agua No Contabilizada	%	63,00	2010	P	63,00	63,00	50,00	50,00
				A	63,00			

Resultado: Cobertura de agua potable de la CAASD incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Cobertura de agua potable	%	89,00	2010	P	89,00	89,00	91,00	91,00
				A	89,00			

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Fortalecimiento de la Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo									
1.1. Plan de Gestión Empresarial implementado	Plan	1,00			1,00	600.000,00			782.000,00
1.2. Plan Maestro de Alcantarillado implementado	Plan				1,00	1.000.000,00			4.500.000,00
1.3. Plan Tecnico Operativo implementado.	Plan	1,00			1,00	150.000,00			425.000,00
1.4. Corporacion de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo fortalecida financieramente (auditorias)	Organización	1,00			5,00				260.000,00
2. Obras de Emergencia									
2.1. Micromedidores adquiridos	micromedidores				20.000,00	100.000,00			109.000,00
2.2. Planta de tratamiento de aguas servidas Los Ríos y Los Jardines rehabilitada	Plantas				2,00				1.279.000,00
2.3. Cajas para medidores adquiridas	cajas				20.000,00	100.000,00			450.000,00
2.4. Medidores y cajas instalados.	Medidores				20.000,00	200.000,00			1.200.000,00
3. Obras de infraestructura									
3.1. Programa Macro y Micro-medición y control de fugas ejecutado	Programas				1,00	200.000,00			1.546.000,00
3.2. Programa de renovación y rehabilitación de redes troncales de agua potable existentes ejecutado	Programa				1,00	200.000,00			13.746.000,00
3.3. Programa de extensión en barrios carenciados de agua potable ejecutado	Programa				1,00				1.000.000,00
3.4. Diseños de obras de redes de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales preparados.	Programa				1,00				
3.5. Programa de rehabilitación de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas ejecutado	Programa				1,00	800.000,00			1.650.000,00
3.6. Programa de regularización de servicios a comunidades rurales conectadas a sistemas urbanos ejecutado	Programa								
3.7. Obras de emergencia Tormenta Noel implementada.	Obra				1,00				4.571.186,00
Otros Costos									
TOTAL						3.350.000,00			31.518.186,00
