
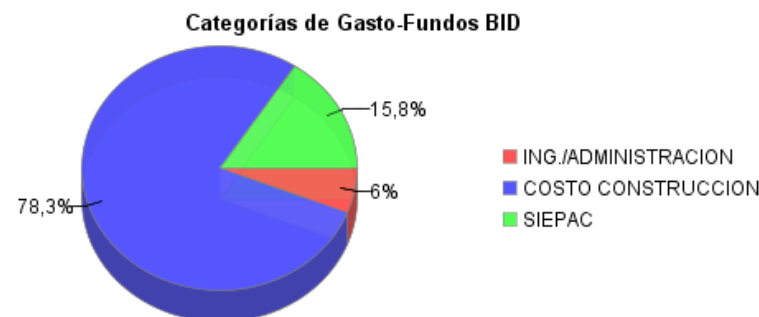
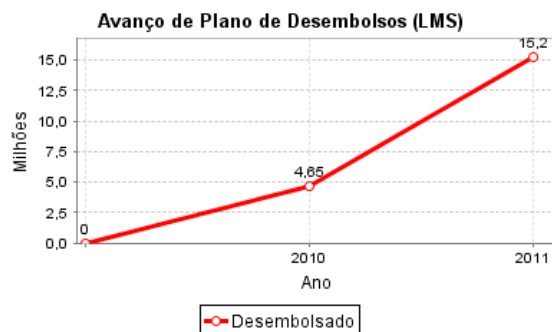



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		
Sector:	ENERGY-POWER LINES		
Número da Operação:	2016/BL-HO	Atual:	28.550.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	10.276.467,27
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	35,99
Operação Relacionada:	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039	Saldo:	18.273.532,73
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	28.550.000,00
		Corrente BID:	28.550.000,00
		Pari-passu:	91,00
		Cofinanciamento/País:	2.760.000,00
		Original Estimado:	31.310.000,00
		Período de Amortização (meses):	282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011

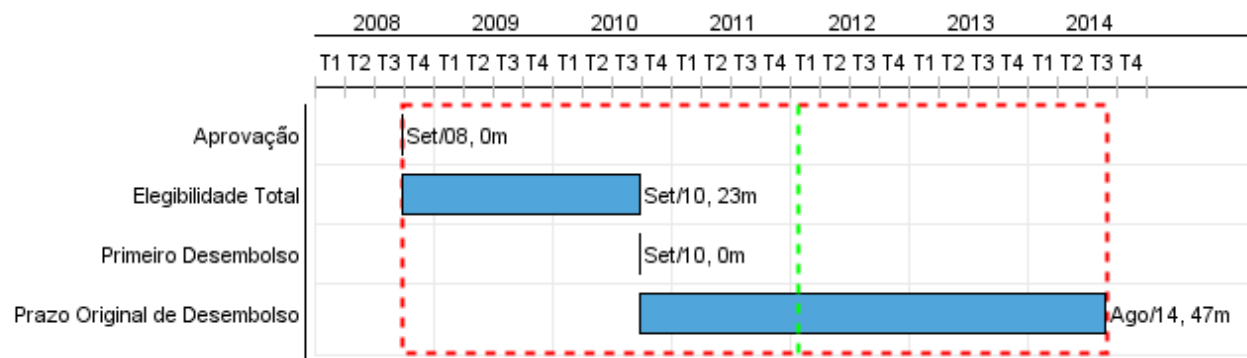

Progresso Acumulado até 2011

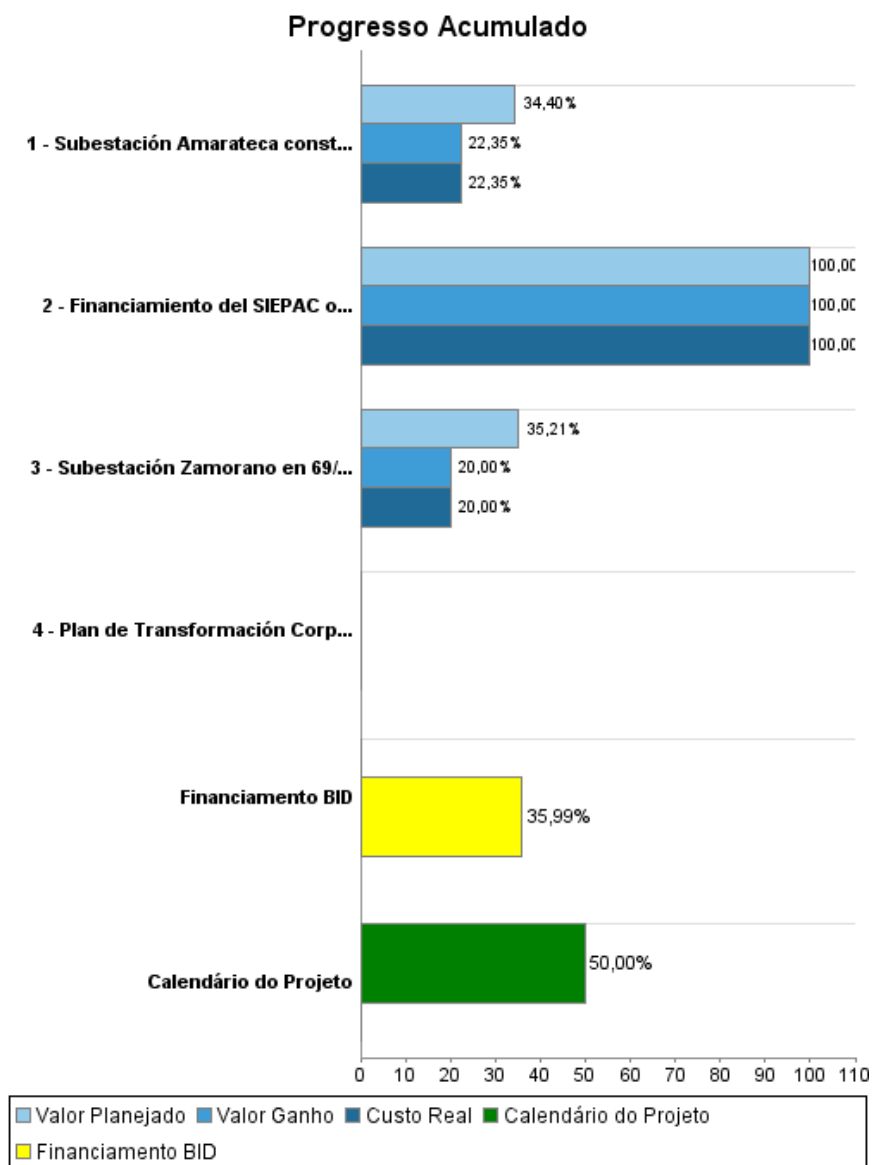

Resultados

Resultado:	Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca	MW		2007	P A	132,10
Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano	MW	6,40	2007	P A	8,40

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.									
Subestación Amarateca construida y en operación	Subestación				1,00	7.000.000,00	4.547.000,00		20.346.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00	440.300,00	250.102,80		1.250.500,00
Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00				750.000,00
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia				1,00				4.500.000,00
Gestión del Programa									
TOTAL						7.440.300,00	4.797.102,80		26.846.500,00
