
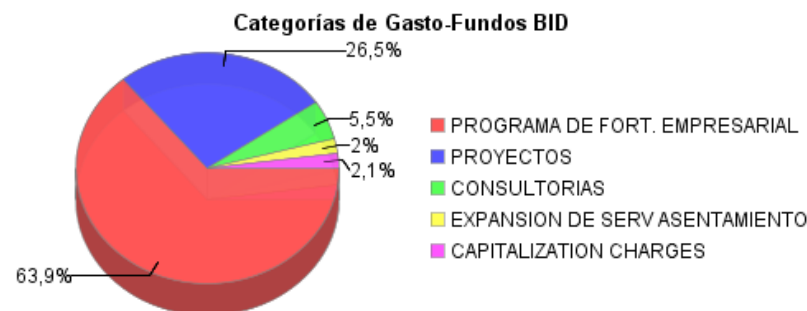
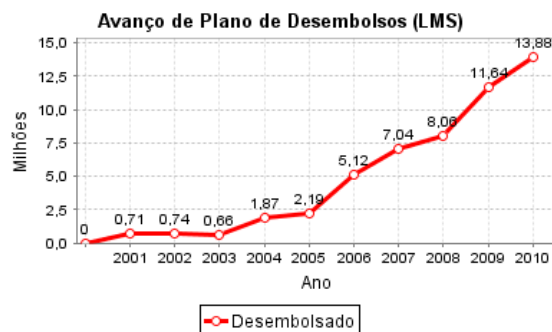



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número da Operação:	1049/SF-NI	Atual:	13.883.993,36
Estágio:	Approved	Desembolsado:	13.883.993,36
Tipo Operação:	LON - Loan Operation	% Desembolsado:	100,00
Operação Relacionada:		Saldo:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	13.900.000,00
		Corrente BID:	13.883.993,36
		Pari-passu:	73,11
		Cofinanciamento/País:	1.660.000,00
		Original Estimado:	15.560.000,00
		Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 30, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011

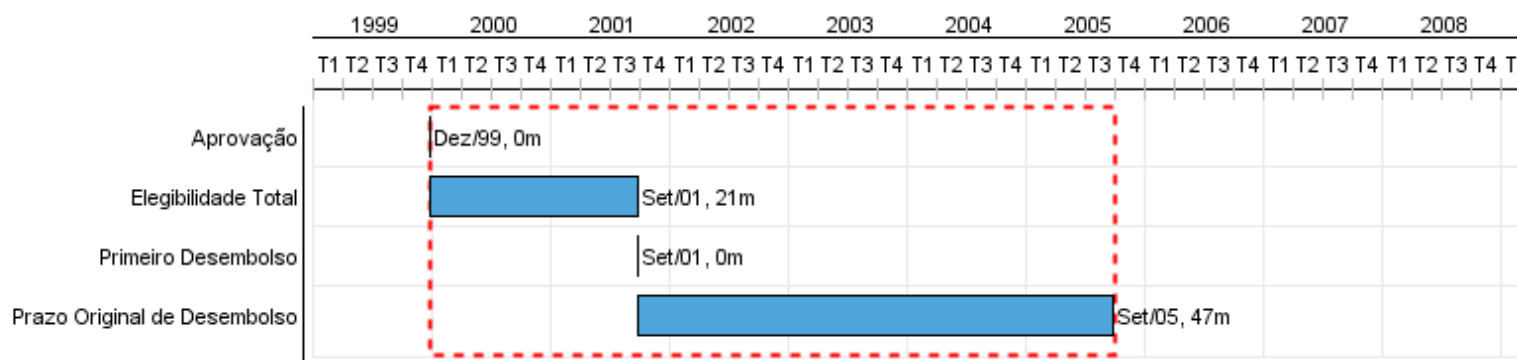

Progresso Acumulado até 2011

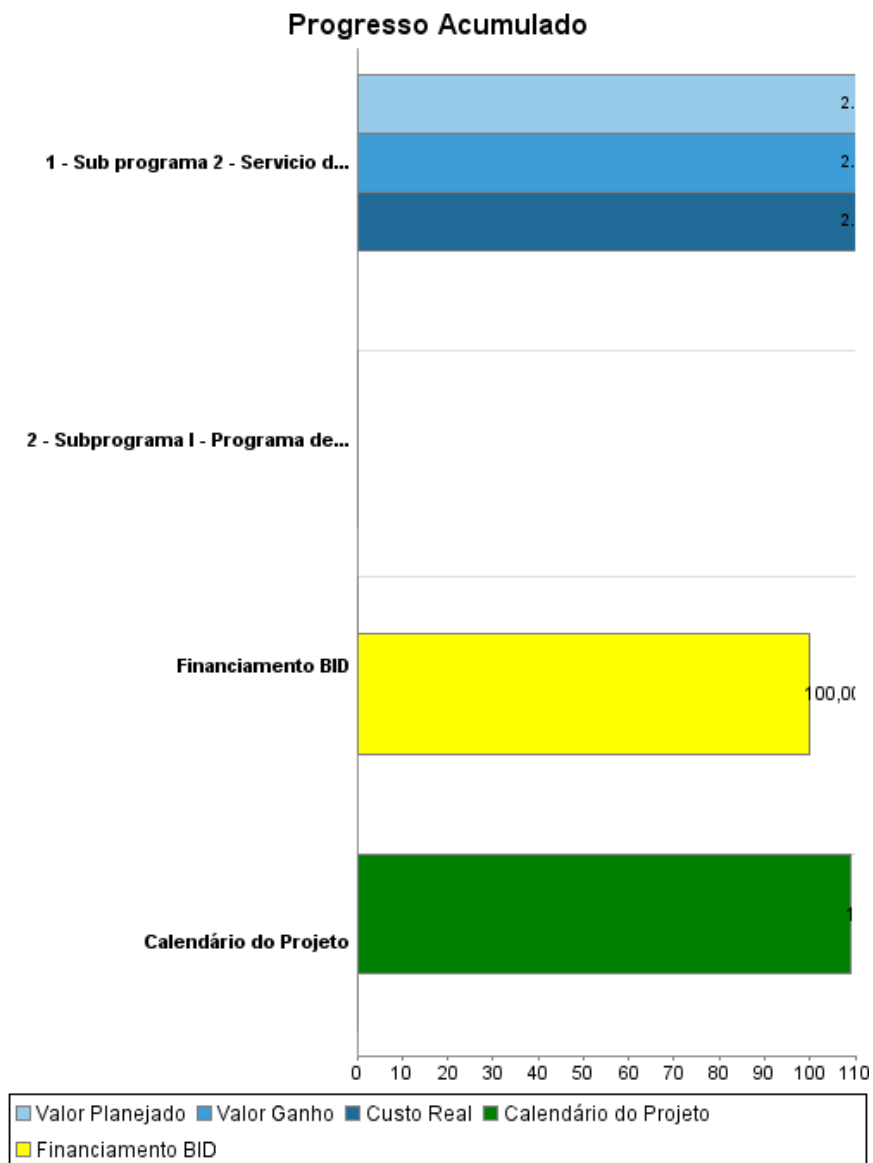

Resultados

Resultado: ENACAL fortalecida empresarialmente en el corto plazo a nivel nacional con acciones prioritarias.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2008	2010	Final do Projeto
Reduccion del agua no facturada a Nivel Nacional	%	55,88		P		53,50	51,90	51,90
				A	54,21	53,20	51,63	
Incremento en la tasa de Micromedicion	%	38,80		P	44,40	45,00	47,00	47,00
				A	49,20	50,80	57,60	
Reduccion del consumo de energia	Kwh/m3	0,69		P	0,68	0,68	0,68	0,68
				A	0,70	0,69		
Reduccion del Numero de Clandestinos en los servicios	% de clandestinos	19,69		P		10,56	10,50	10,50
				A	14,97	9,21	6,11	

Resultado: incrementado los niveles de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en 10 barrios marginales de la Ciudad de Managua.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2008	2010	Final do Projeto
Personas con Acceso Seguro al AP	Personas beneficiadas con AP			P			38.850,00	38.850,00
				A		38.850,00		
Personas con Acceso Seguro al Servicio de Alcantarillado Sanitario	Personas beneficiadas con AS			P			48.210,00	48.210,00
				A		48.210,00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Sub programa 2 - Servicio de agua potable y alcantarillado expandidos en barrios marginales de la Ciudad de Managua									
Sub programa 2 - Servicio de agua potable y alcantarillado expandidos en barrios marginales de la Ciudad de Managua									200.000,00
Subprograma I - Programa de Fortalecimiento Empresarial de ENACAL									
Subprograma I - Programa de Fortalecimiento Empresarial de ENACAL									
TOTAL									200.000,00
