
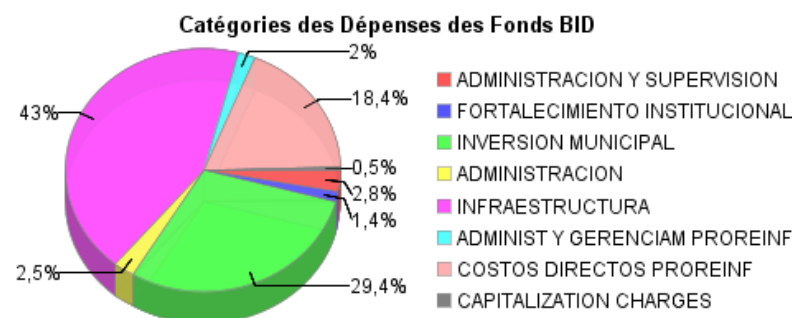
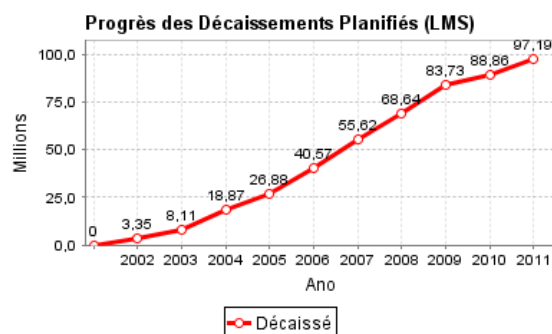



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Numéro(s) de Prêt(s):	1075/SF-BO-4;1075/SF-BO;1075/SF-BO-6;1075/SF-BO-9;1075/SF-BO-5;1075/SF-BO-8;1075/SF-BO-10;1075/SF-BO-7	Montant Courant Approuvé:	162.488.867,81	Initial BID:	151.600.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	154.897.519,83	Courant BID:	162.488.867,81
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	95,33	Pari Passu:	86,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	7.591.347,98	Cofinancement/Pays:	7.600.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	159.200.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	456

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 15, 2011 Validé par le Représentant: Sep 30, 2011

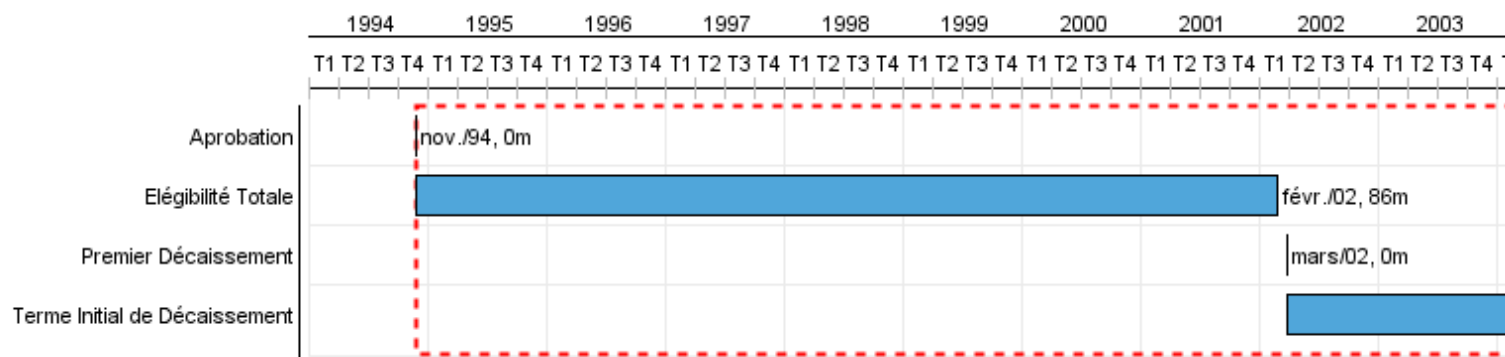

## Progrès Cumulé à 2011

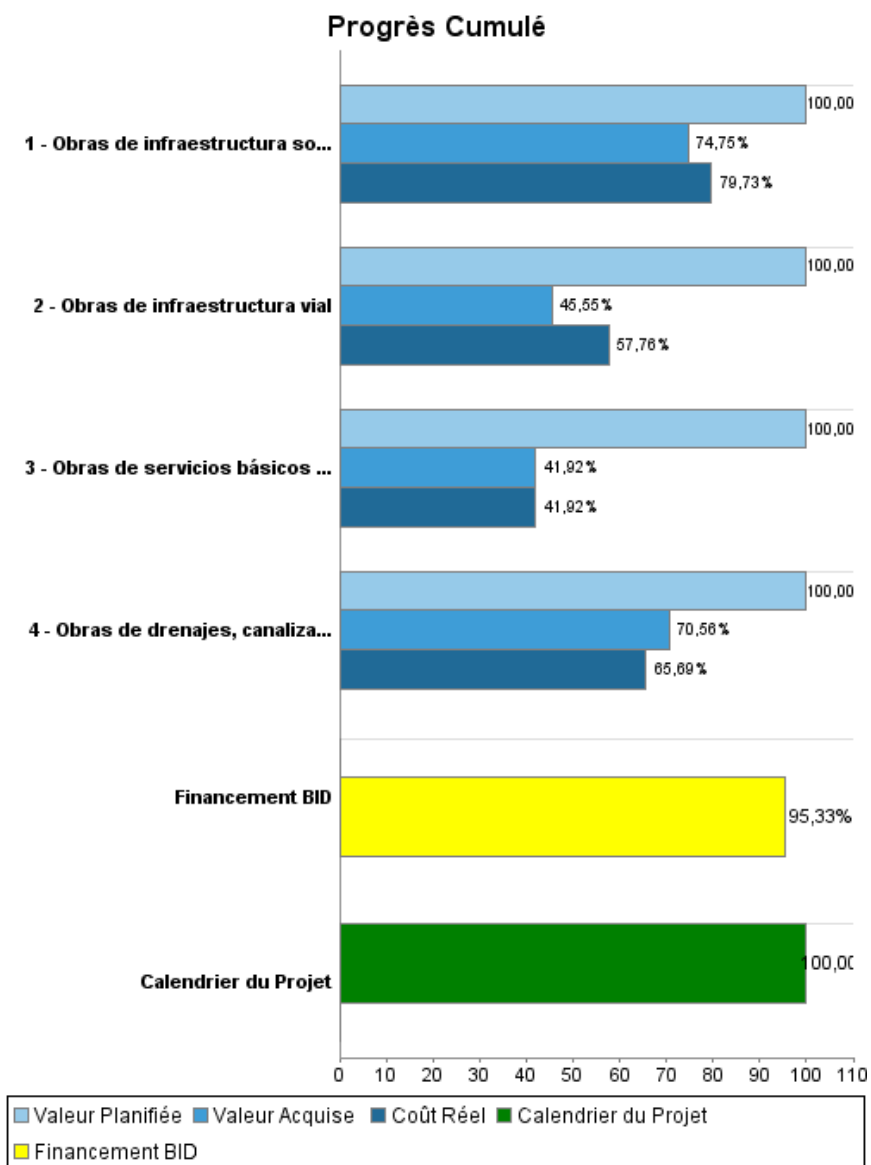

## Résultats

- Aucune information n'est disponible

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Obras de reposición</b>									
Obras de infraestructura vial	Obras	80,00	18,00		97,00	4.851.351,32	1.934.538,08		6.905.603,00
Obras de drenajes, canalizaciones y protección y mitigación de riesgo	Obras	135,00	62,00		171,00	5.739.080,30	2.122.234,06		10.540.670,94
Obras de servicios básicos urbanos	Obras	1,00			2,00	23.657,14			40.730,31
Obras de infraestructura social	Obras	34,00	17,00		40,00	562.168,68	336.520,06		1.112.995,74
<b>Administración del Programa</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>11.176.257,44</b>	<b>4.393.292,20</b>		<b>18.599.999,99</b>
