

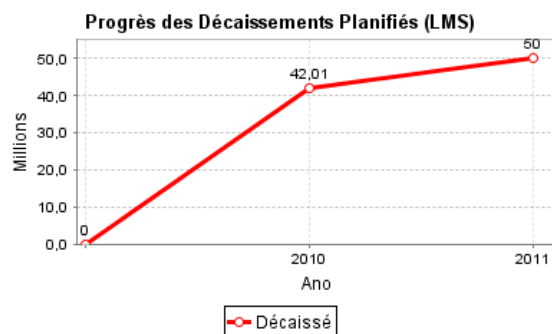



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MINAS GERAIS				
Secteur:	TRANSPORTATION-SECONDARY ROADS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2281/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	50.000.000,00	Initial BID:	50.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	48.427.645,36	Courant BID:	50.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	96,86	Pari Passu:	60,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-L1027, BR-X1002	Solde:	1.572.354,64	Cofinancement/Pays:	33.335.000,00
Sous-Type de l'Opération:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Estimation Initiale:	83.335.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 23, 2011 Validé par le Représentant: Sep 28, 2011

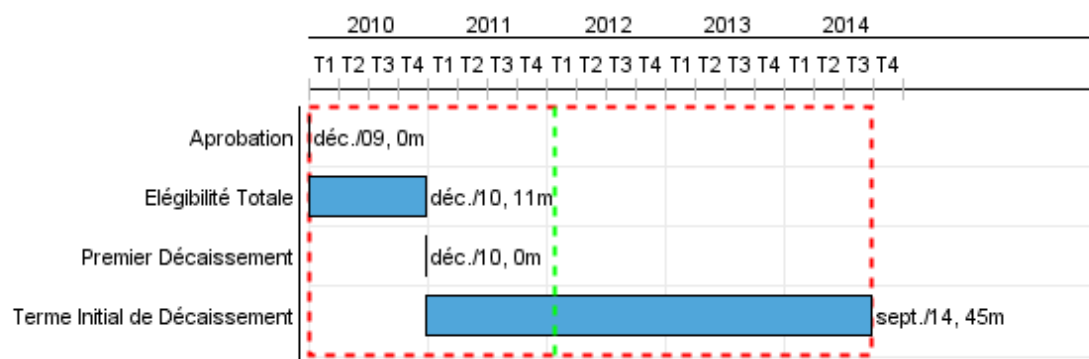

## Progrès Cumulé à 2011

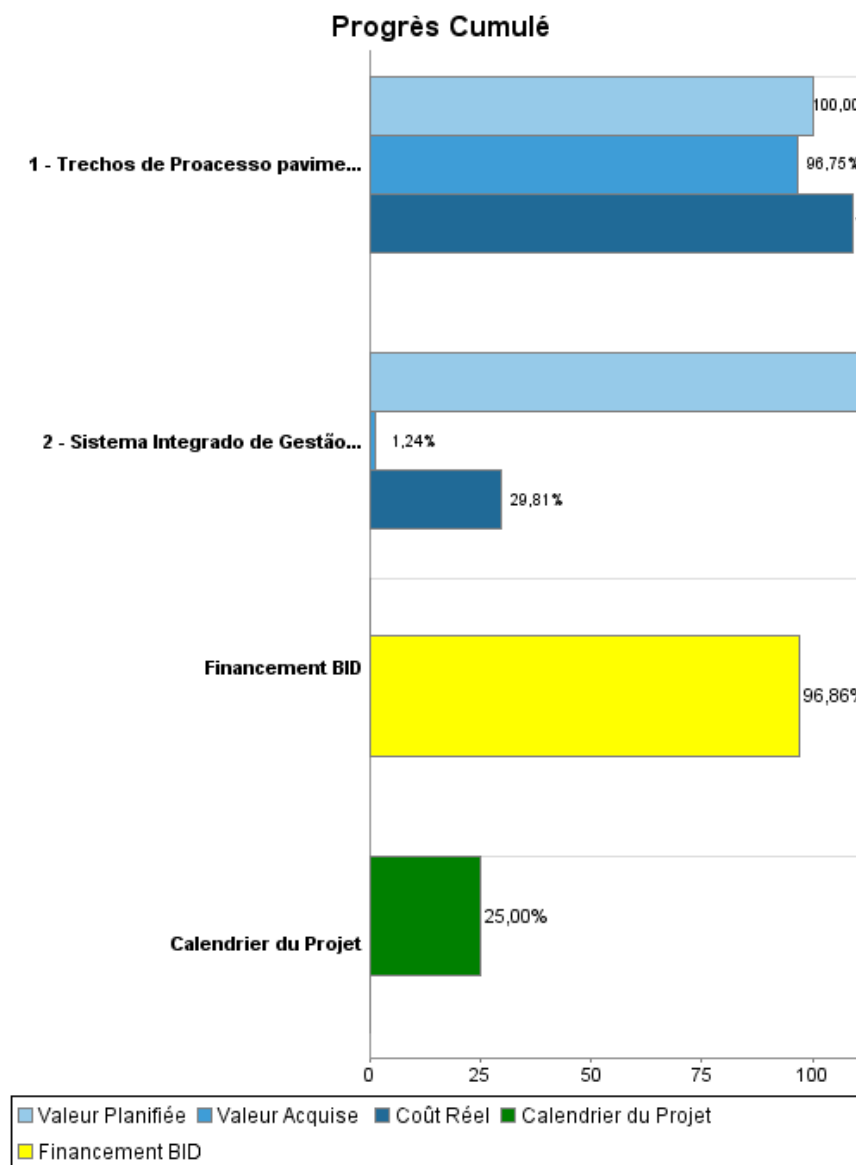

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Condições de transitabilidade melhoradas
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Custo Operacional médio de veículos	US\$/veiculo-km	0,78	2007	P A	0,51
Tempo de viagem	min	56,00	2007	P A	38,00

<b>Résultat:</b>	Fortalecimento Institucional do DER_MG
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Indice de Partidas Programadas - IPP - Incrementado	%	83,05	2007	P A	91,40
Tarifas de transporte interurbano	R\$	0,23	2007	P A	0,20

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Investimentos para a melhora da infraestrutura viária</b>									
Trechos de Processo pavimentados	Quilômetro	117,00	90,04		362,00	10.166.000,00	14.191.904,36		71.997.000,00
<b>Fortalecimento Institucional do DER ( Departamento de Estradas de Rodagem - Minas Gerais)</b>									
Sistema Integrado de Gestão implementado	sistema	1,00			2,00		1.229.184,31		4.303.000,00
<b>Gastos financeiros e de administração</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>10.166.000,00</b>	<b>15.421.088,67</b>		<b>76.300.000,00</b>
