
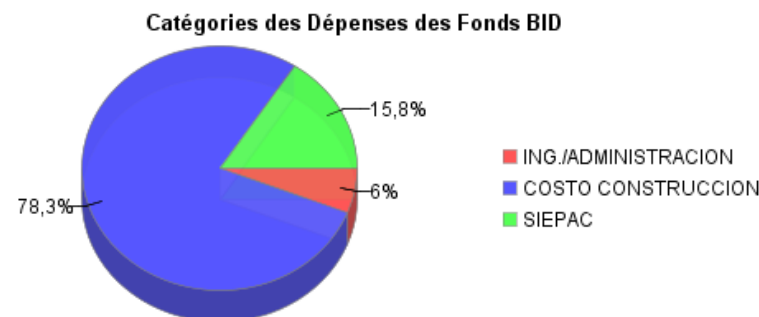
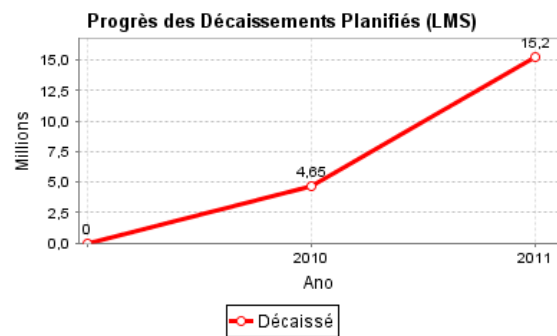



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		
Secteur:	ENERGY-POWER LINES		
Numéro(s) de Prêt(s):	2016/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	28.550.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	10.276.467,27
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	35,99
Opération(s) Connexe(s):	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039	Solde:	18.273.532,73
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	28.550.000,00
		Courant BID:	28.550.000,00
		Pari Passu:	91,00
		Cofinancement/Pays:	2.760.000,00
		Estimation Initiale:	31.310.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 29, 2011 Validé par le Représentant: Sep 30, 2011

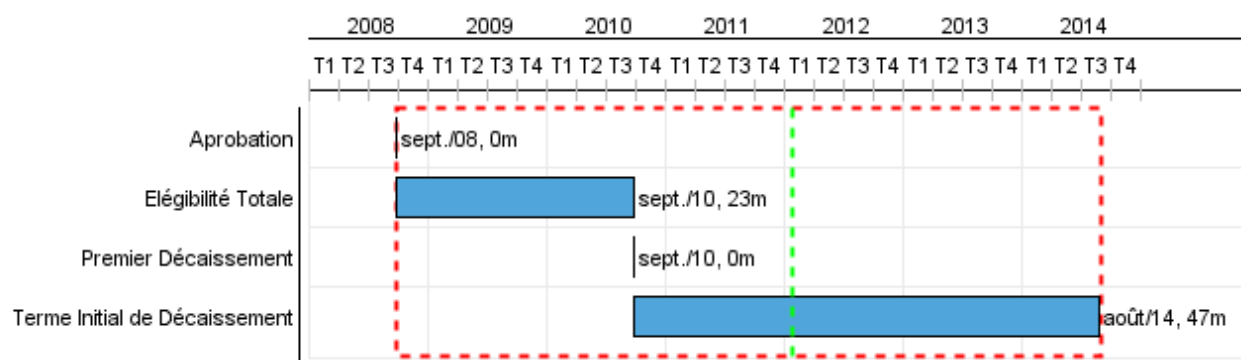

Progrès Cumulé à 2011

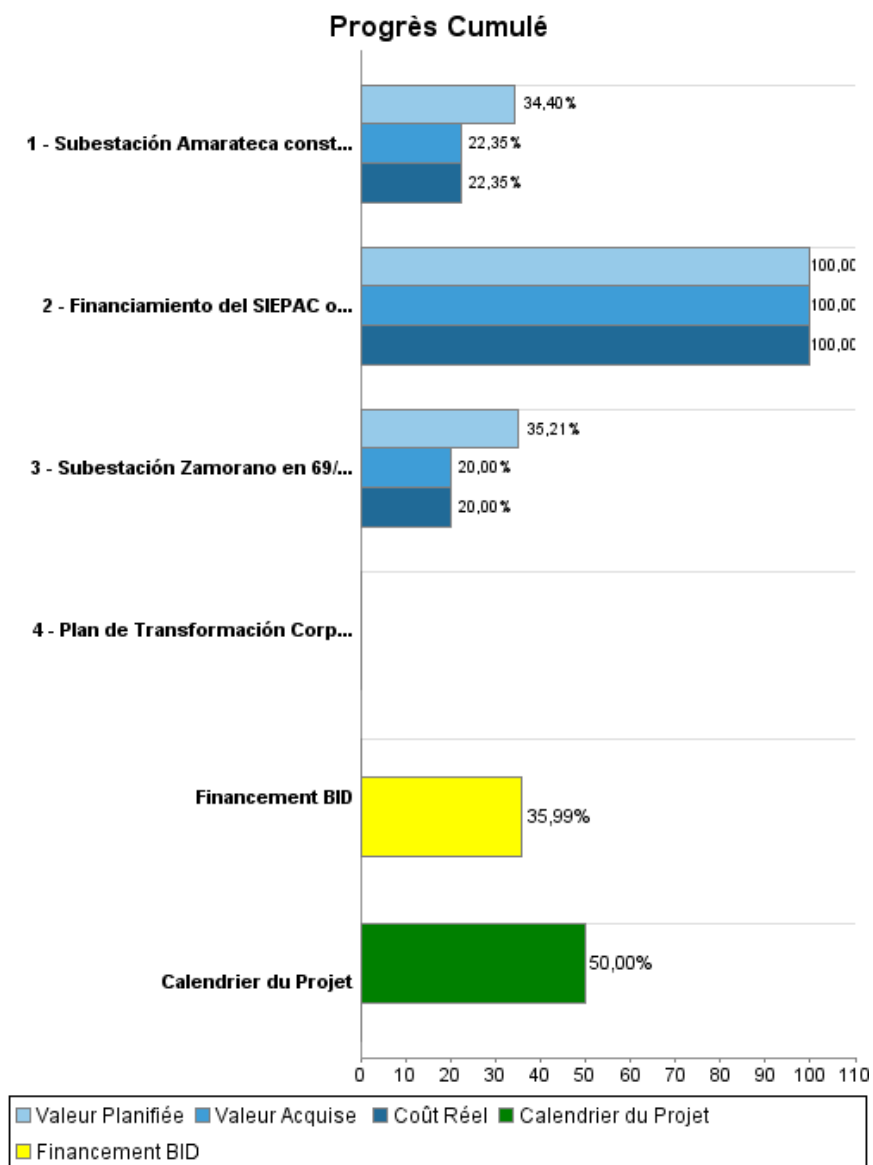

Résultats

Résultat:	Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca	MW		2007	P A	132,10
Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano	MW	6,40	2007	P A	8,40

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.									
Subestación Amarateca construida y en operación	Subestación				1,00	7.000.000,00	4.547.000,00		20.346.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00	440.300,00	250.102,80		1.250.500,00
Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00				750.000,00
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia				1,00				4.500.000,00
Gestión del Programa									
TOTAL						7.440.300,00	4.797.102,80		26.846.500,00
