
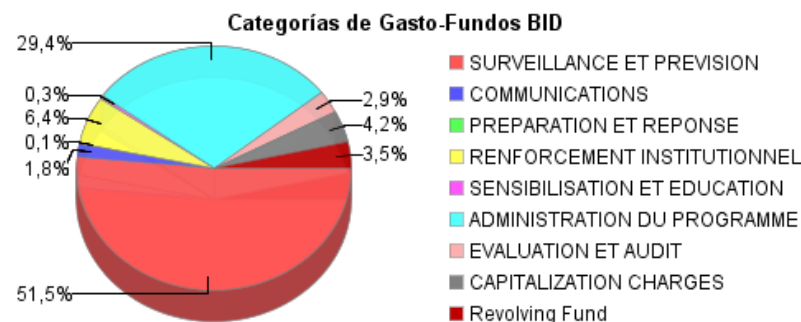
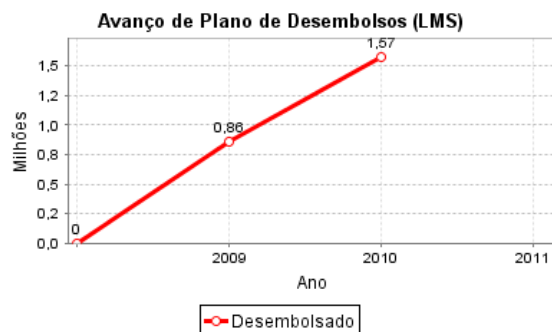



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-NATURAL DISASTERS PREVENTION RELIEF	
Número da Operação:	1642/SF-HA;2389/GR-HA	Atual: 5.055.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado: 2.731.182,28
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 54,03
Operação Relacionada:	HA-T1096	Saldo: 2.323.817,72
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility	
		Original BID: 8.491.259,81
		Corrente BID: 5.055.000,00
		Pari-passu: 100,00
		Cofinanciamento/País: 50.000,00
		Original Estimado: 8.541.259,81
		Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 19, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 27, 2011

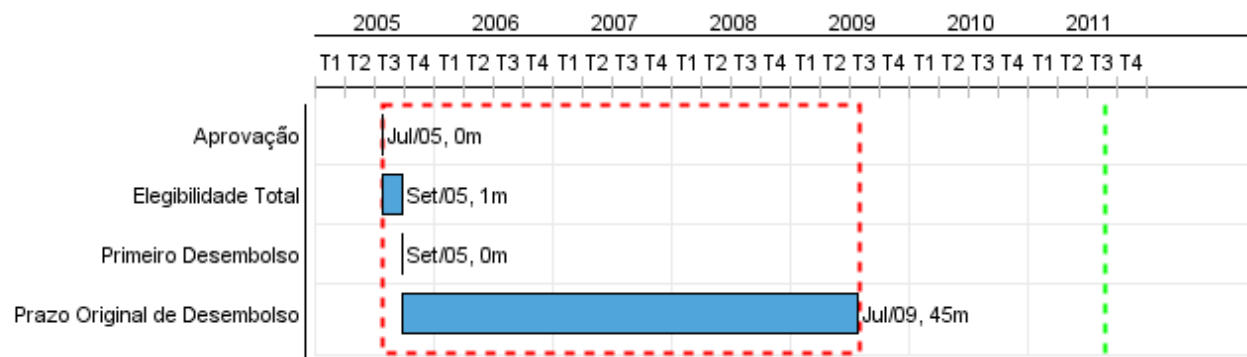

Progresso Acumulado até 2010

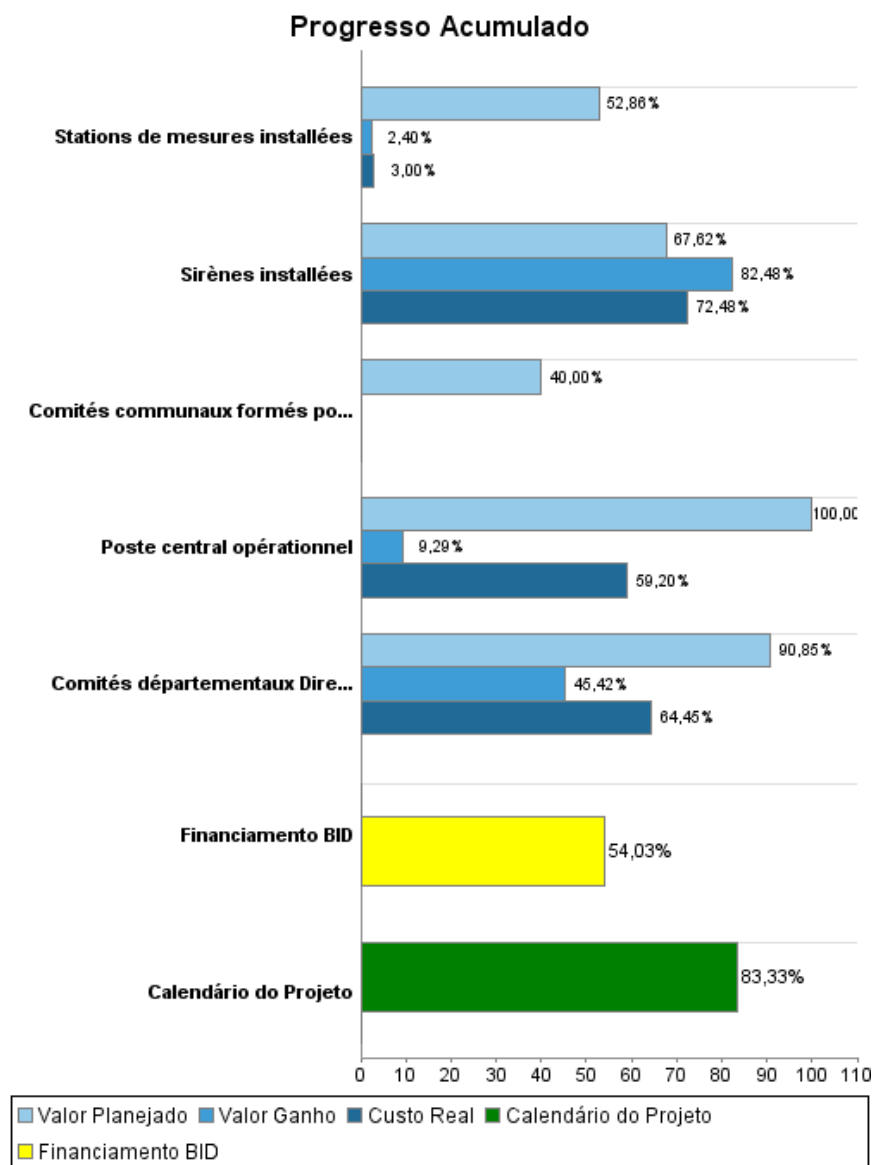

Resultados

Resultado: Un dispositif d'alerte au risque d'inondation est opérationnel dans les 35 communes ciblées des 13 bassins versants vulnérables.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Final do Projeto
% de sites ciblés équipés et connectés au réseau central	%		2005	P A						100,00	100,00

Resultado: Les populations des zones vulnérables ciblées ont la capacité de répondre à l'alerte.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Final do Projeto
% des populations des zones ciblées qui ont une compréhension suffisante du dispositif alerte + plan d'évacuation	%		2005	P A						90,00	90,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
2. Communications									
Poste central opérationnel	Poste de commande	1,00			1,00	216.000,00	124.764,00		250.000,00
3. Etat de préparation et réponse de la population en cas d'avertissement précoce.									
Comités communaux formés pour la réponse	Comités communaux	15,00			35,00	40.000,00			100.000,00
Renforcement Institutionnel pour le Fonctionnement du Système d'Alerte Précoce									
Comités départementaux Direction de la Protection Civile dotés en équipement de communication pour la saison cyclonique	Comités départementaux	4,00	4,00		10,00	100.000,00	71.504,00		220.150,00
Campagne de sensibilisation et éducation du public									
Surveillance et prévision des inondations									
Sirènes installées	Sirènes	20,00	17,00		46,00	800.000,00	500.000,00		1.800.000,00
Stations de mesures installées	Stations de mesure	22,00	1,00		42,00	740.000,00	42.000,00		1.400.000,00
Administration, audit, évaluation									
TOTAL						1.896.000,00	738.268,00		3.770.150,00
