
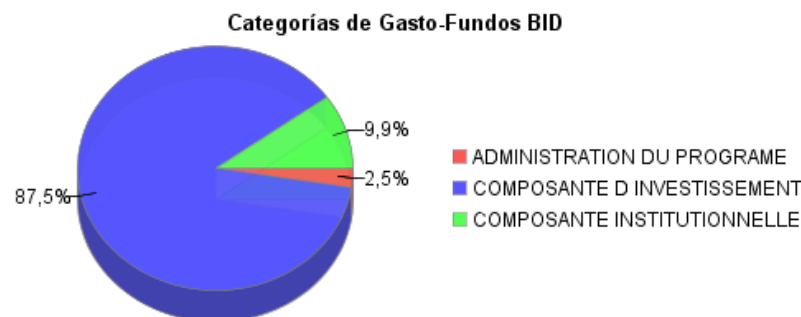
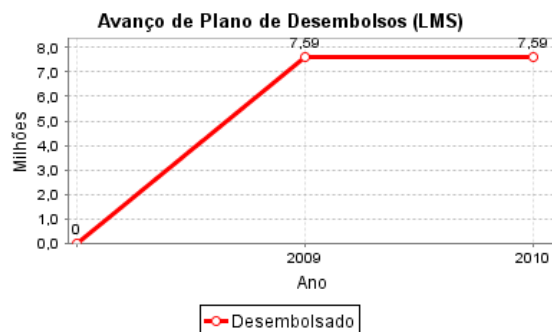



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS		
Sector: TRANSPORTATION-RURAL ROADS		
Número da Operação: 991/SF-HA;2379/GR-HA	Atual: 50.034.669,99	Original BID: 50.251.737,53
Estágio: Approved	Desembolsado: 49.817.602,45	Corrente BID: 50.034.669,99
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 99,57	Pari-passu: 96,53
Operação Relacionada: TC8803307, HA-L1046	Saldo: 217.067,54	Cofinanciamento/País: 1.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 51.251.737,53
		Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	(X) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 31, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 27, 2011

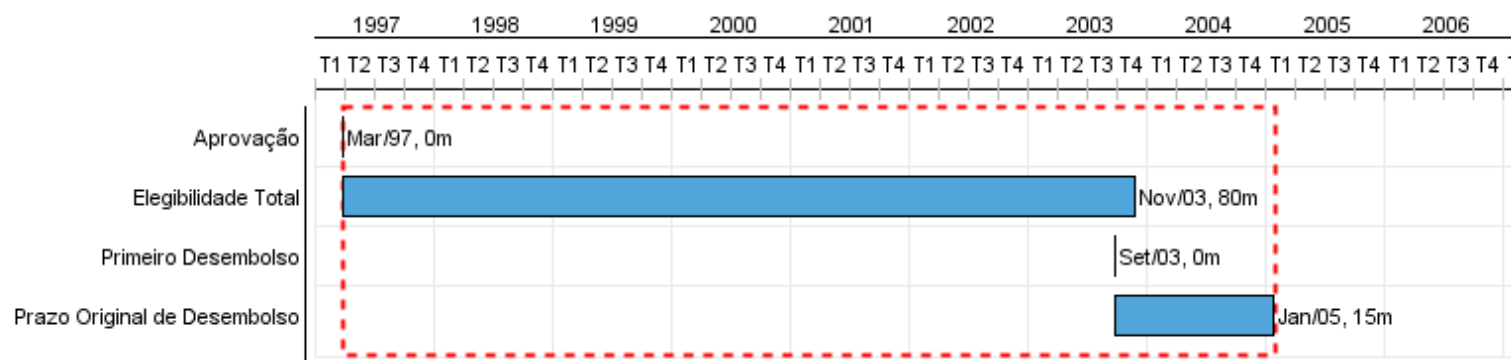

Progresso Acumulado até 2010

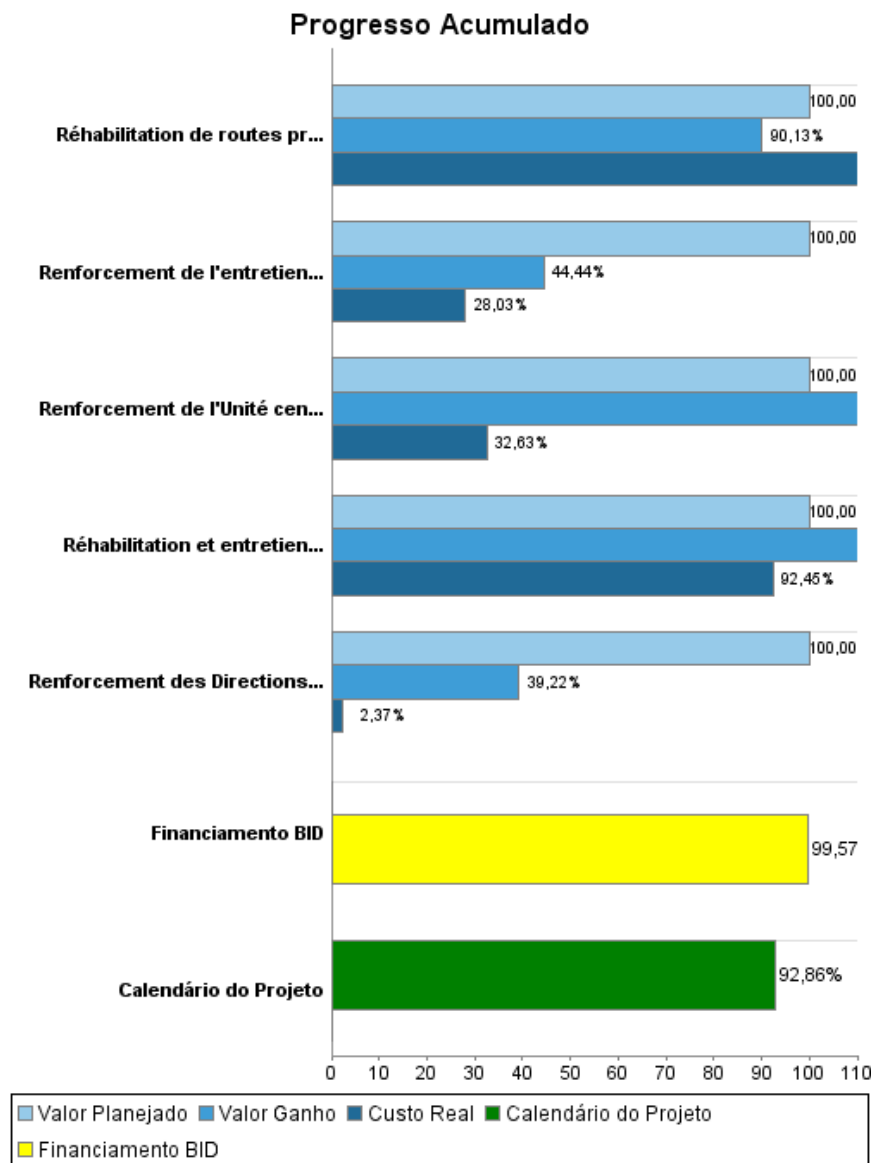

Resultados

Resultado:	L'accès aux régions productrices du pays et le transport de la production économique aux centres d'exportation et de consommation est facilité
Suposições:	Les travaux sur le réseau routier primaire sont priorisés

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	Final do Projeto
Temps de parcours sur routes réhabilitées	Pourcentage (%) de réduction des temps de parcours		2004	P A			50,00
Débit journalier moyen des routes réhabilitées	Pourcentage (%) d'augmentation de véhicules/jour		2004	P A			20,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Composante institutionnelle									
Renforcement des Directions départementales du MTPTC par l'embauche de consultants en développement communautaire et d"ingénieurs en suivi de travaux	Consultants/ ingénieurs embauchés	3,00	4,00		9,00	500.000,00	40.226,00		1.700.000,00
Renforcement de l'Unité centrale d'exécution par l'embauche de consultants techniques et institutionnels	Consultants embauchés	1,00	7,00		2,00	500.000,00	489.478,00		1.500.000,00
Renforcement de l'entretien routier avec les intervenants locaux	Contrats d'entretien signés	9,00	8,00		18,00	300.000,00	168.194,00		600.000,00
Composante d'investissement									
Réhabilitation de routes primaires	Nombre de kilomètres réhabilités	20,00	51,00		116,00	8.200.000,00	28.237.235,00		23.200.000,00
Réhabilitation et entretien de routes secondaires et tertiaires	Nombre de kilomètres de routes réhabilitées et entretenues	25,00	197,00		250,00	7.600.000,00	14.422.939,00		15.600.000,00
Composante administrative									
Composante financière									
TOTAL						17.100.000,00	43.358.072,00		42.600.000,00
