
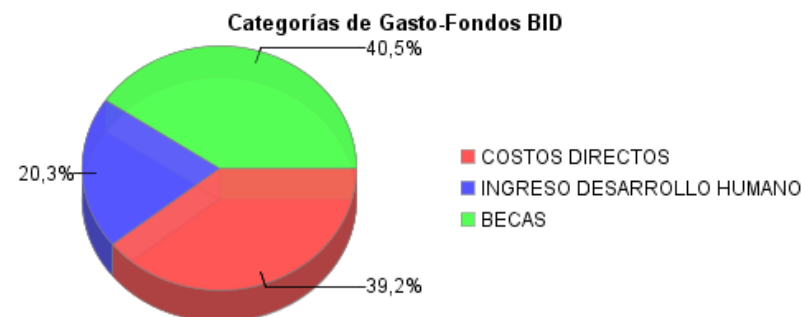
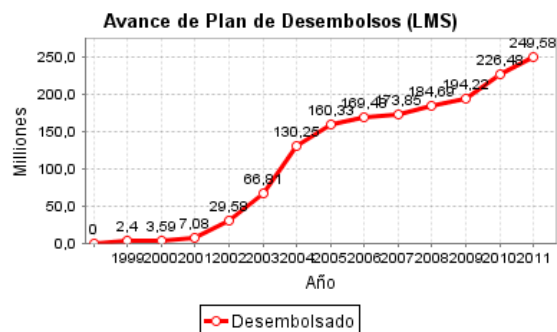



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	COMITE EJECUTOR MATANZA-RICHUELO		
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número(s) de Préstamo:	1059/OC-AR	Monto Aprobado Actual:	250.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	244.636.772,57
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	97,85
Operación(es) Relacionada(s):	AR0217	Saldo:	5.363.227,43
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	250.000.000,00
		Actual BID:	250.000.000,00
		Pari-passu:	50,00
		Co-financiamiento/País:	250.000.000,00
		Estimado Original:	500.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	150

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 28, 2011 Validado por Representante de País: Oct 21, 2011

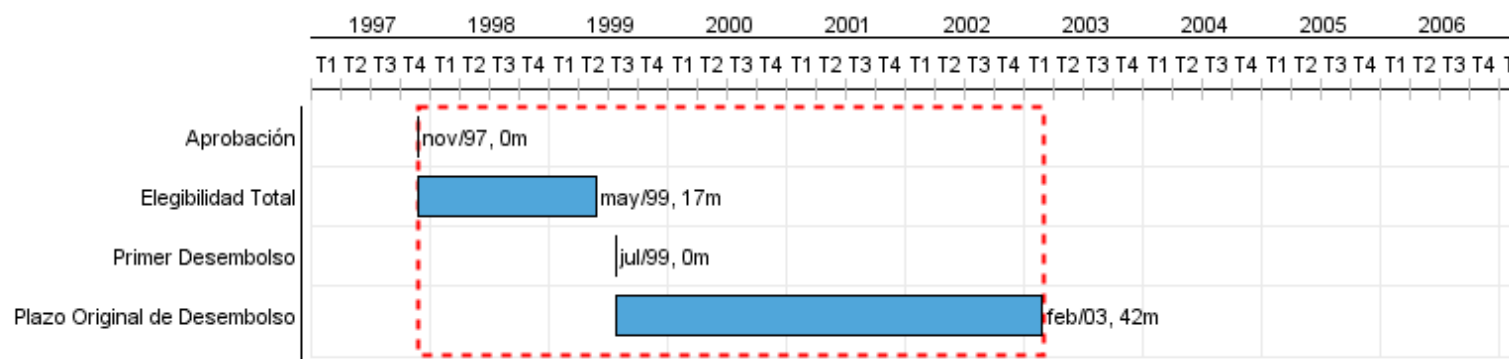

Progreso Acumulado al 2011

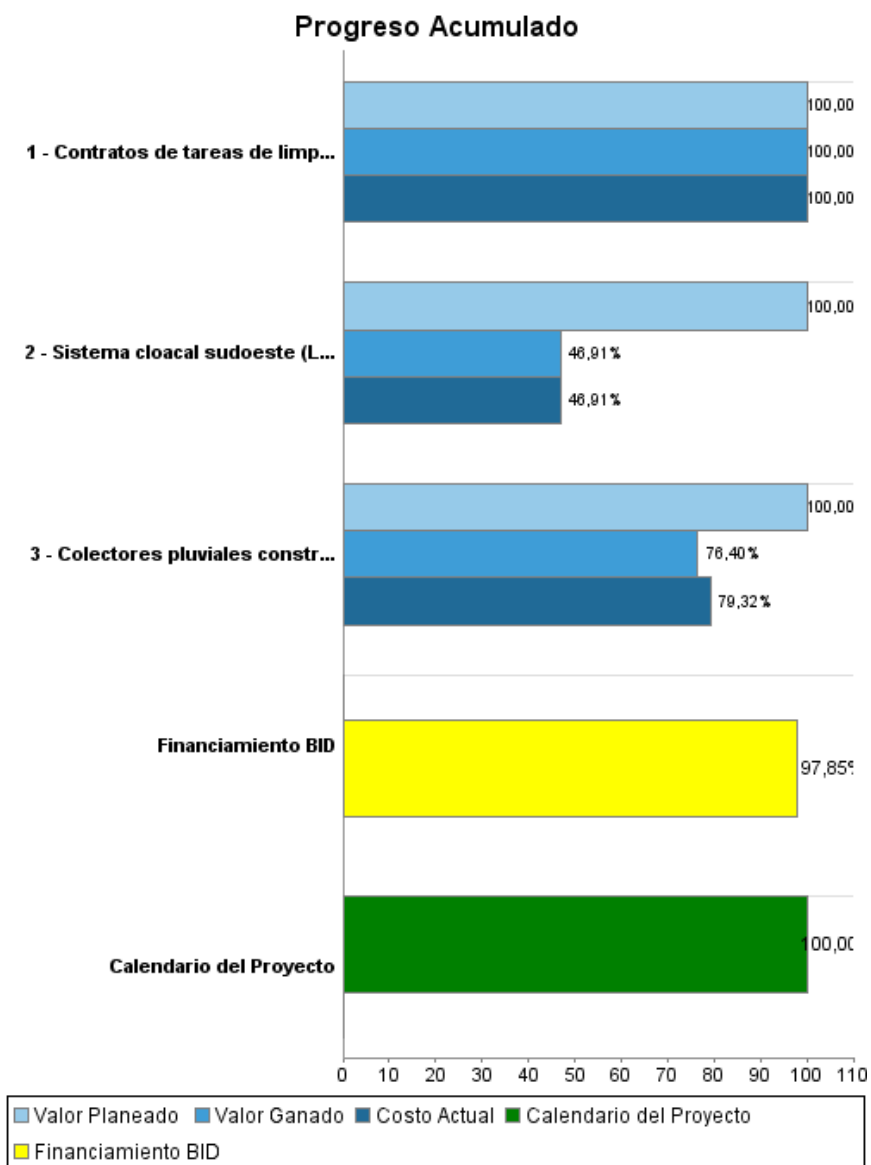

Resultados

Resultado:	Cobertura de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo incrementada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	Fin de Proyecto
Hogares con servicio de saneamiento nuevo	Hogares		2006	P A		49.000,00

Resultado:	Riesgo de inundaciones reducido
-------------------	---------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	Fin de Proyecto
Habitantes beneficiados por las obras de drenaje pluvial	habitantes		2006	P A		427.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Obras de drenaje urbano									
Colectores pluviales construidos	km	10,00			32,30	5.987.820,00			28.946.000,00
Limpieza de márgenes									
Contratos de tareas de limpieza de márgenes finalizados	Contratos				1,00				1.451.000,00
Saneamiento cloacal									
Sistema cloacal sudoeste (LaFerrere) construido	Sistemas	1,00			1,00	31.588.242,00			59.498.000,00
Administración, supervisión y costos financieros									
TOTAL						37.576.062,00			89.895.000,00
