

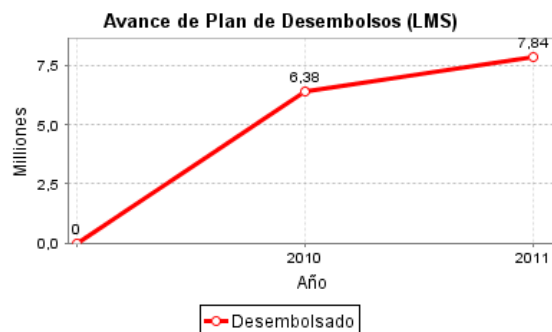



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ		
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING		
Número(s) de Préstamo:	2082/BL-BO	Monto Aprobado Actual: 30.000.000,00	BID Original: 30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 7.842.544,03	Actual BID: 30.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 26,14	Pari-passu: 83,00
Operación(es) Relacionada(s):	BO-P1012, BO-T1093, BO-T1133	Saldo: 22.157.455,97	Co-financiamiento/País: 6.000.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		Estimado Original: 36.000.000,00
			Período de Amortización (meses): 282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011 Validado por Representante de País: Sep 30, 2011

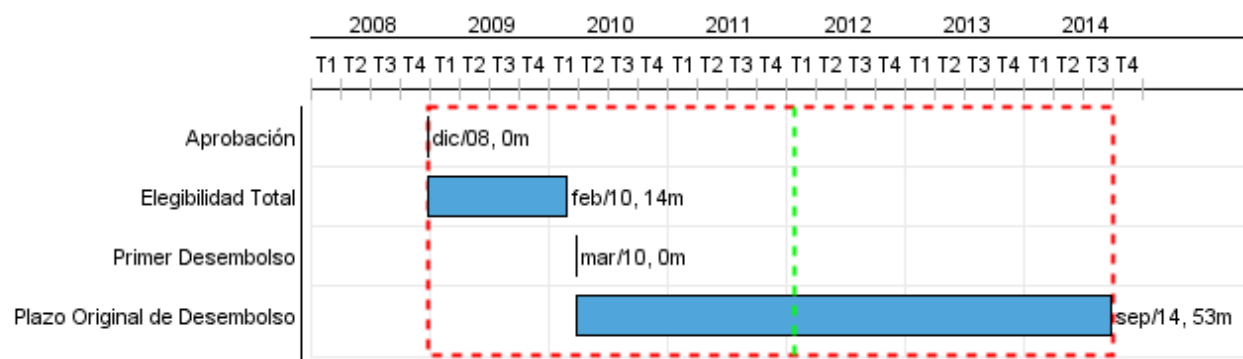

Progreso Acumulado al 2011

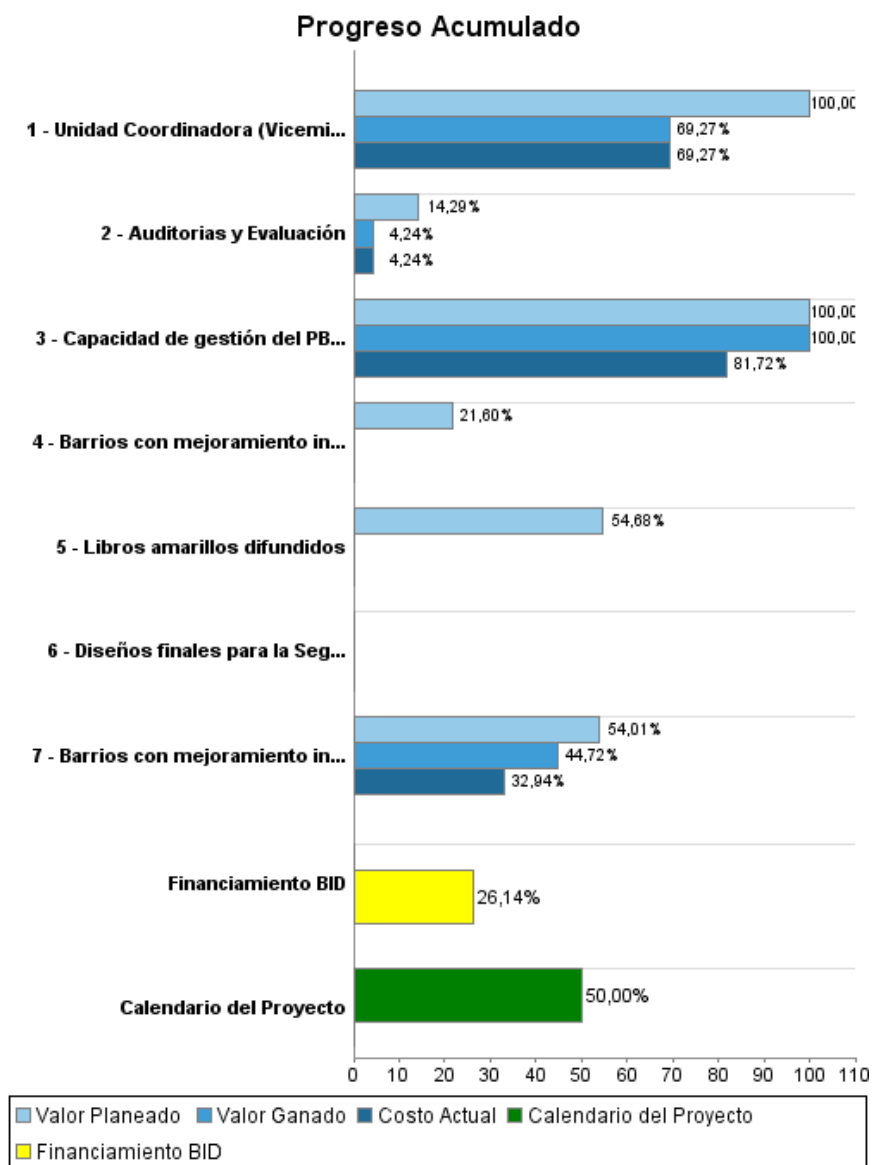

Resultados

Resultado:	Calidad de vida de los habitantes de los barrios intervenidos mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Hogares con sistemas de suministro de agua mejorado	Hogar		2009	P A	950,00	6.749,00
Hogares con sistemas sanitarios mejorado	Hogar		2009	P A	900,00	7.200,00
Infraestructura social construida utilizada por la comunidad al menos una vez a la semana	Infraestructura		2009	P A	5,00	31,00
Hogares con accesibilidad mejorada	Hogar		2009	P A	1.200,00	7.749,00

Resultado:	Familias del Municipio de La Paz con seguridad jurídica de viviendas mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Beneficiarios con folio real entregado	Folios Reales		2009	P A	269,00	359,00
Beneficiarios con registro catastral entregado	Certificado de Catastro		2009	P A	392,00	751,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I. Mejoramiento de Barrios para el Municipio de La Paz									
Barrios con mejoramiento integral ejecutado	Barrio	6,00	4,00		20,00	3.600.000,00	1.094.294,00		12.923.850,00
Libros amarillos difundidos	Libro	1.000,00			1.829,00	14.300,00			26.150,00
Capacidad de gestión del PBV fortalecida	Unidad				1,00				50.000,00
Componente II. Mejoramiento de Barrios en otros Municipios									
Barrios con mejoramiento integral ejecutado	Barrio				21,00	4.833.393,30			22.380.000,00
Diseños finales para la Segunda Fase elaborados	Diseño				6,00				250.000,00
Unidad Coordinadora (Viceministerio)	n/a					20.000,00	13.854,00		20.000,00
Auditorias y Evaluación	n/a					50.000,00	14.857,00		350.000,00
TOTAL						8.517.693,30	1.123.005,00		36.000.000,00
