
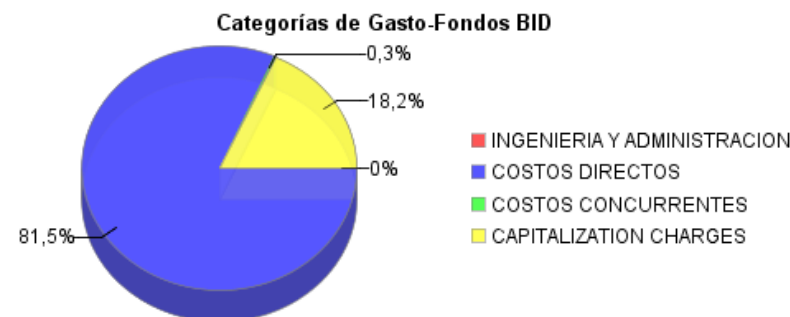
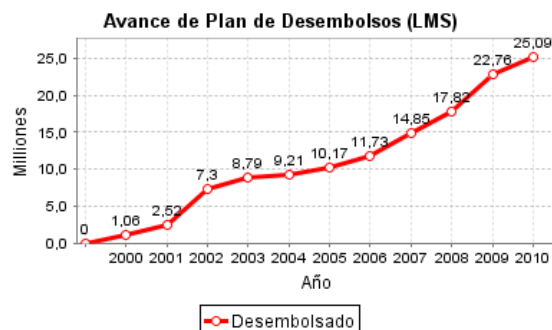



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.E.S.P.		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	1199/OC-CO	Monto Aprobado Actual:	25.090.000,02
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	25.090.000,02
Tipo de Operación:	LON - Operación de Prestamo	% Desembolsado:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	TC9607419	Saldo:	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	38.600.000,00
		Actual BID:	25.090.000,02
		Pari-passu:	49,06
		Co-financiamiento/País:	10.959.345,00
		Estimado Original:	49.559.345,00
		Período de Amortización (meses):	240

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
		Validado por el Jefe de División: Oct 17, 2011
		Validado por Representante de País: Oct 24, 2011

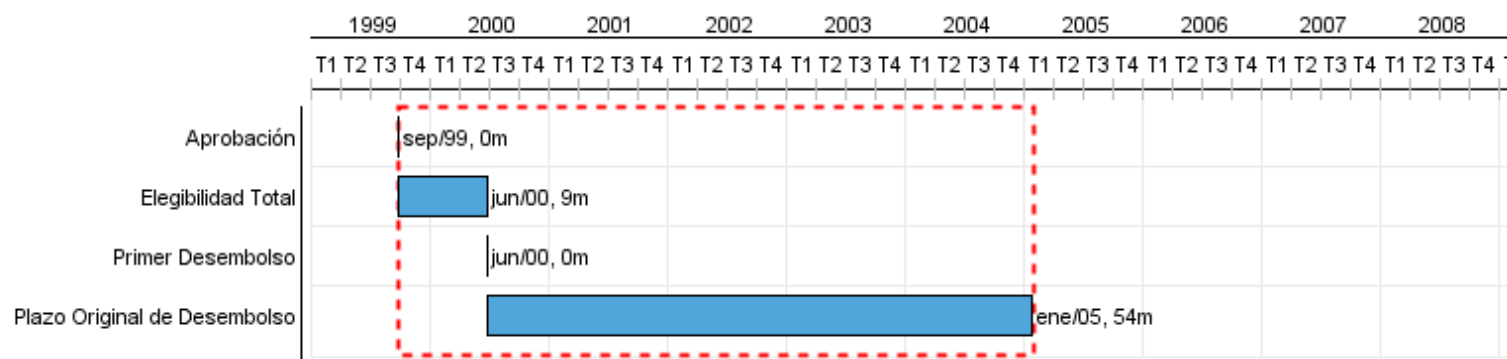

Progreso Acumulado al 2011

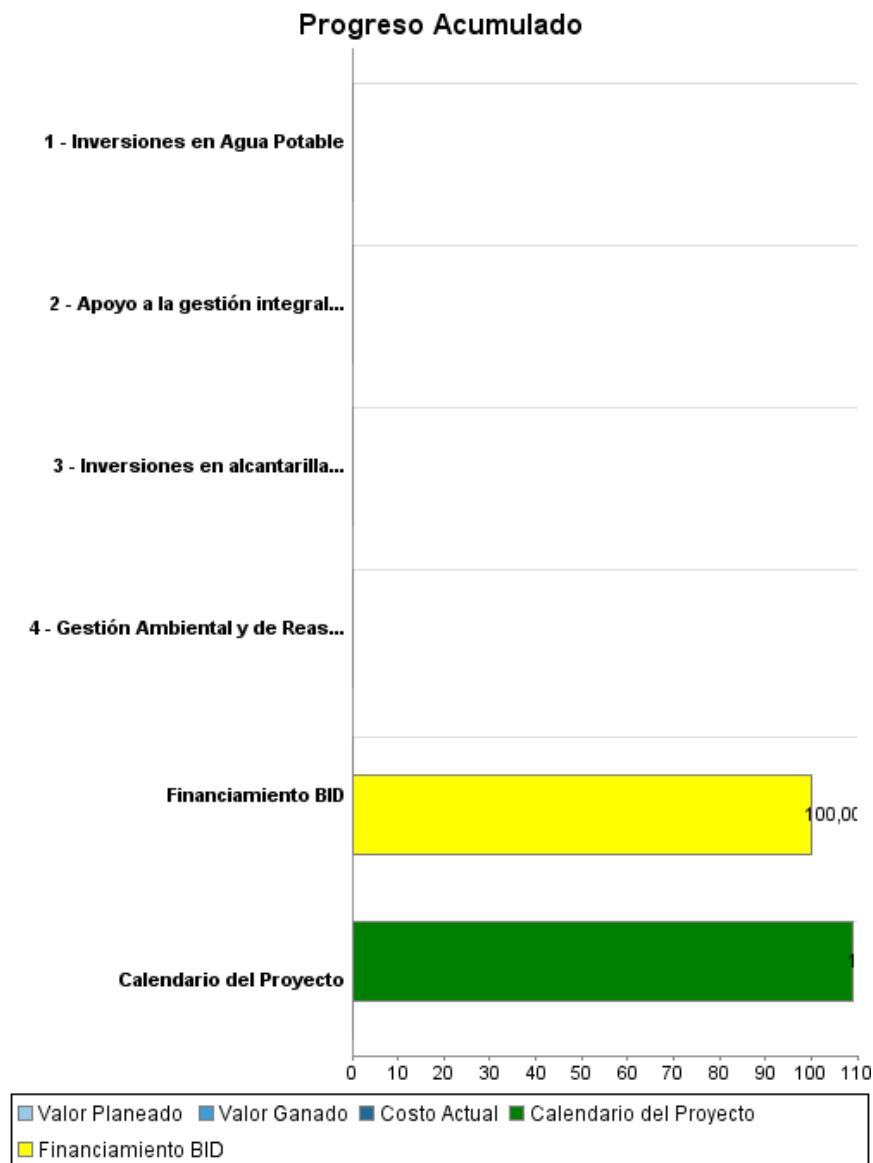

Resultados

Resultado:	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Pereira, proporcionando servicios de agua potable y saneamiento eficientes y de alta calidad bajo un esquema empresarial operativo y financieramente sustentable.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2006	2008	2009	Fin de Proyecto
1.1 A. Cobertura de agua potable.	% de cobertura	98,39		P	96,87		99,00	99,00
				A		99,04	100,00	
1.1.B. Cobertura de alcantarillado.	% de cobertura	94,63		P	93,25		96,00	96,00
				A		94,58	96,88	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos	% Índice de continuidad	99,61		P	99,00		99,00	99,00
1.2.A. Continuidad del Servicio				A		99,36	99,38	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos	%	25,00		P	25,00		25,00	25,00
1.2. B. Generación Interna de Caja				A		25,00	25,00	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos.	% Margen	61,34		P	57,50		56,00	56,00
1.2.C. Margen de Operación				A		56,15	58,83	
1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos.	%	99,28		P	97,00		96,65	96,65
1.2.D. Eficiencia de Recaudo.				A		98,17	99,20	
1.3 Capacidad de almacenamiento de agua potable.	*1000 M3			P	3,20		8,20	8,20
				A		8,30	8,30	
1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas.	%	38,00		P	42,00		75,00	75,00
1.4.A. Quebradas o ríos saneados				A		71,00	90,00	
1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas.	%	19,00		P			70,00	70,00
1.4.B. Aguas Residuales Interceptadas.				A		49,80	88,00	
1.5 Agua no contabilizada (IANC).	%	36,72		P	34,00		30,00	30,00
				A		31,68	29,94	
1.6 Familias marginadas de la zona suroccidental de la ciudad con servicios de agua potable.	%	100,00		P	100,00		100,00	100,00
				A		100,00	100,00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Inversiones en alcantarillado realizadas.									
Inversiones en alcantarillado realizadas.									
Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas									
Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas									
Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira									
Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira									
Inversiones en Agua Potable									
Inversiones en Agua Potable									
TOTAL									
