

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Sector:	ENERGY-POWER LINES
Número(s) de Préstamo:	2016/BL-HO
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	28.550.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	10.276.467,27
% Desembolsado:	35,99
Saldo:	18.273.532,73

### Costo total y Fuente

BID Original:	28.550.000,00
Actual BID:	28.550.000,00
Pari-passu:	91,00
Co-financiamiento/País:	2.760.000,00
Estimado Original:	31.310.000,00
Período de Amortización (meses):	282




### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

### Reformulación


### Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Sep 29, 2011  
Validado por Representante de País: Sep 30, 2011

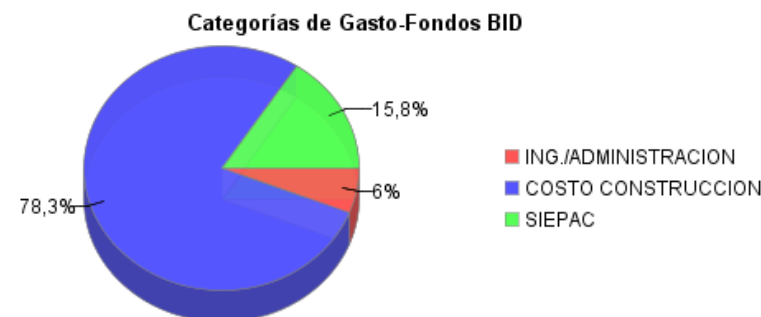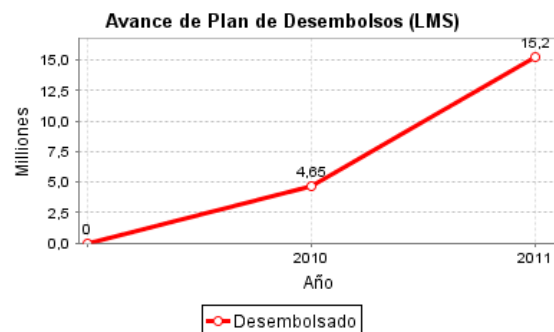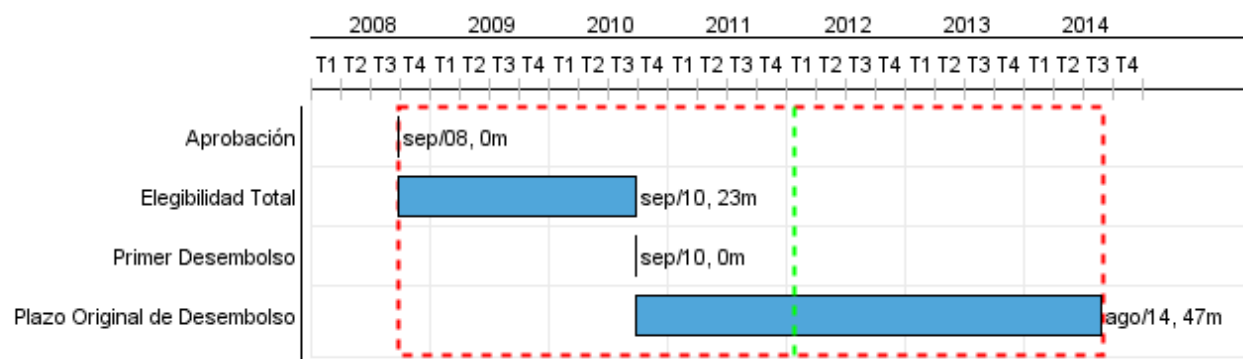

## Progreso Acumulado al 2011

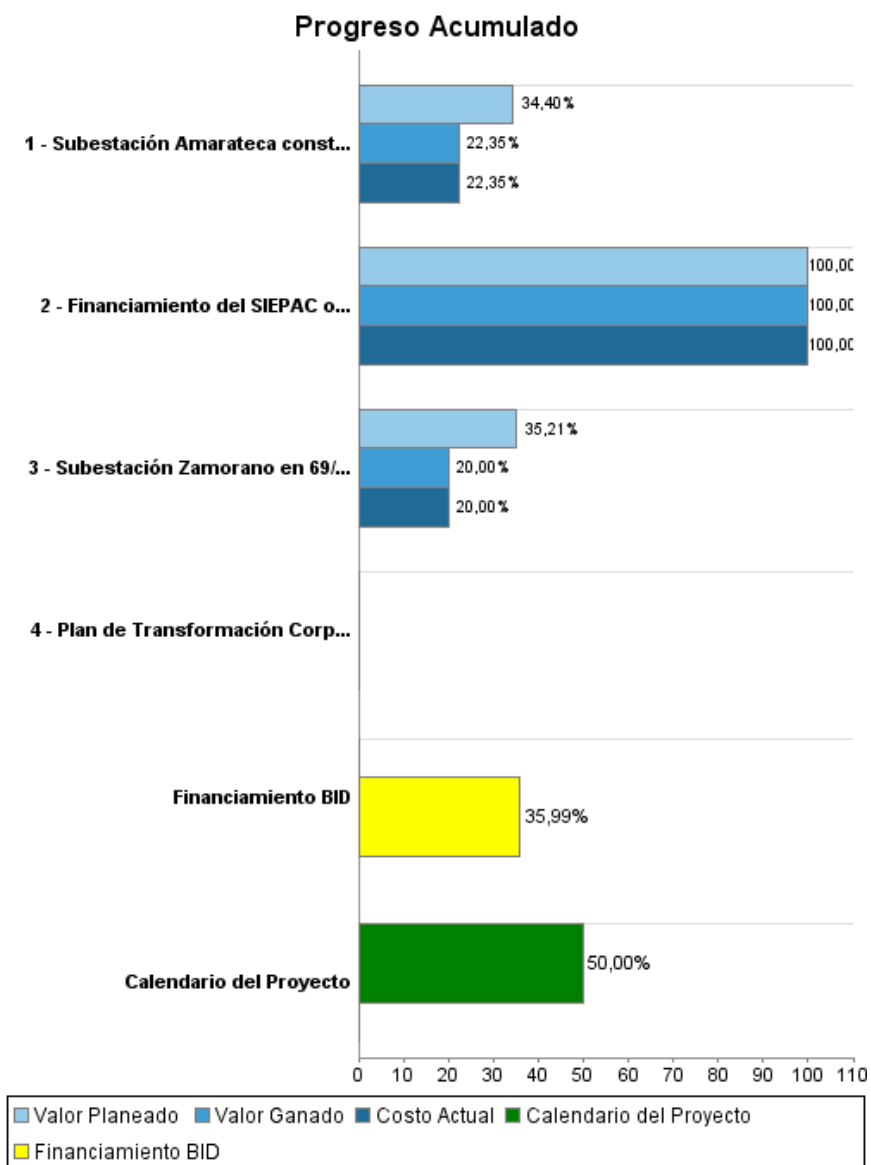

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca	MW		2007	P A	132,10
Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano	MW	6,40	2007	P A	8,40

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.</b>									
Subestación Amarateca construida y en operación	Subestación				1,00	7.000.000,00	4.547.000,00		20.346.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00	440.300,00	250.102,80		1.250.500,00
<b>Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.</b>									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00				750.000,00
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia				1,00				4.500.000,00
<b>Gestión del Programa</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>7.440.300,00</b>	<b>4.797.102,80</b>		<b>26.846.500,00</b>
