

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Sector:	MULTISECTOR CREDIT & PREINVESTMENT-MULTISECTOR CREDIT PROGRAMS
Número da Operação:	1493/SF-HA;2384/GR-HA
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	HA-T1060, HA-X1008
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	72.999.999,30
Desembolsado:	57.026.275,57
% Desembolsado:	78,12
Saldo:	15.973.723,73

Custo Total e Fonte

Original BID:	94.526.657,29
Corrente BID:	72.999.999,30
Pari-passu:	98,82
Cofinanciamento/País:	7.800.000,00
Original Estimado:	102.326.657,29
Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

Reformulação

B () Os objetivos do projeto foram reformulados?




Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


Apr 6, 2011

Validado pelo Representante do País:

Apr 27, 2011

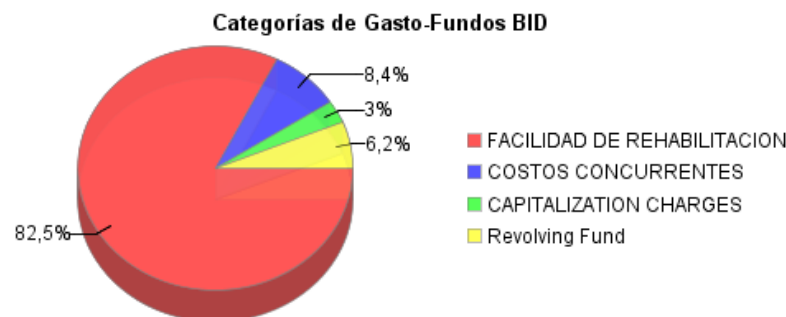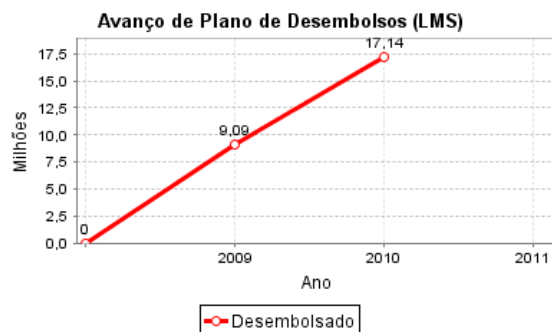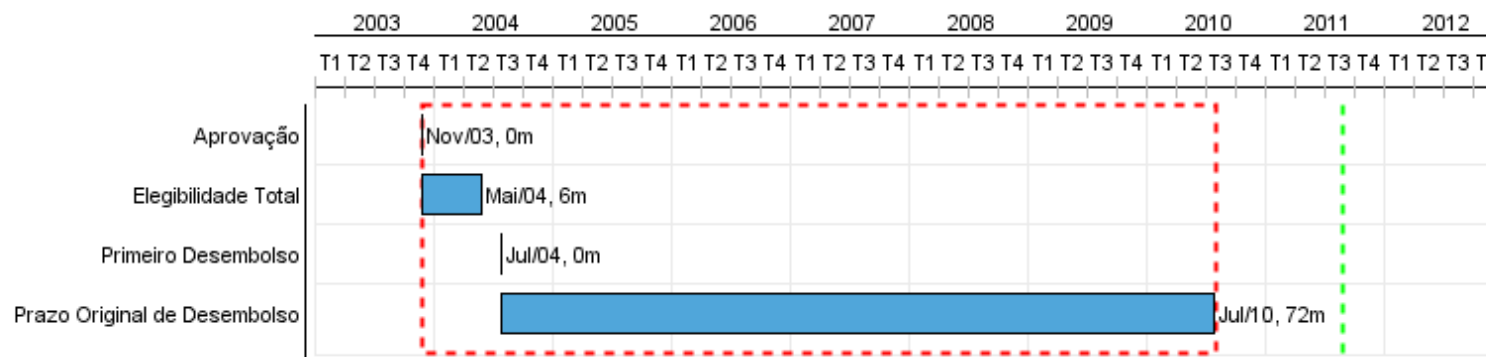

Progresso Acumulado até 2010

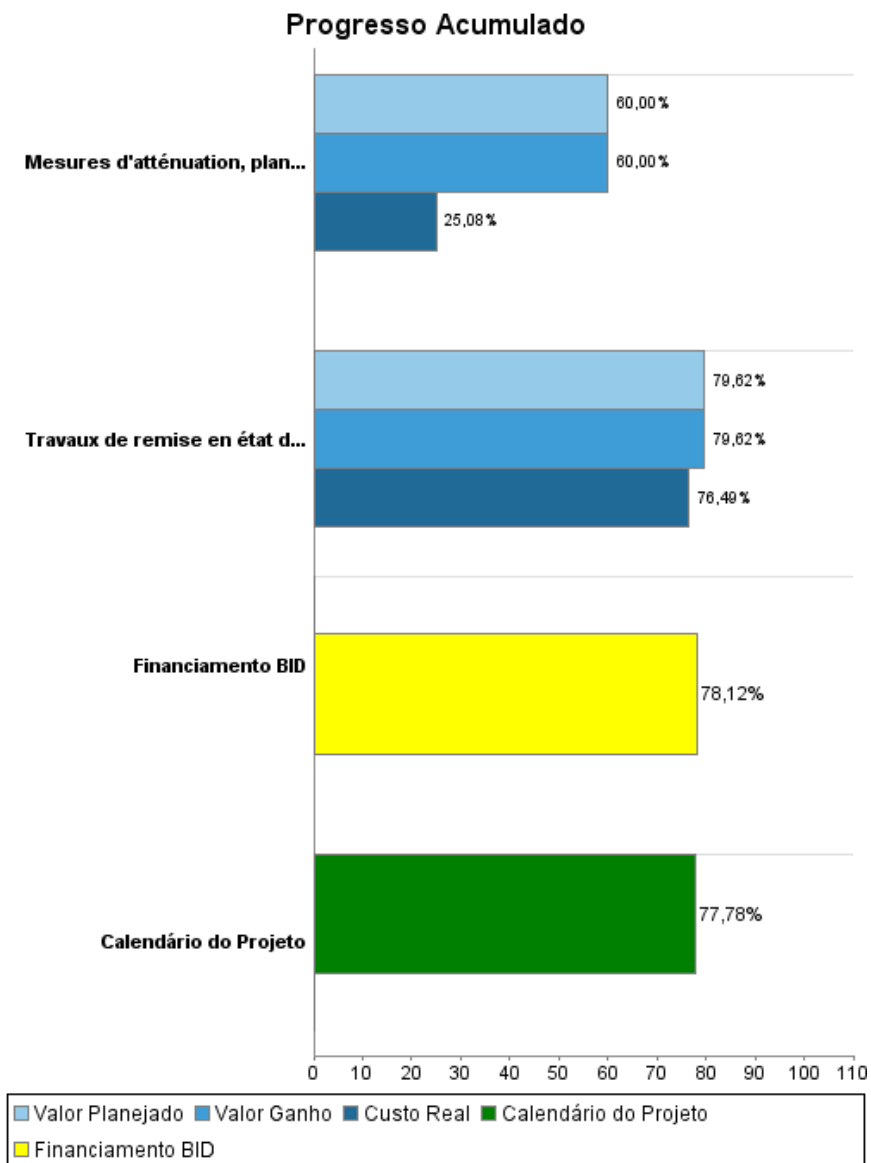

Resultados

Resultado:	Les infrastructures économiques de base sont réhabilitées, gérées et entretenues de manière efficiente et durable
Suposições:	Le pays dispose de ressources nationales et internationales pour l'investissement et l'entretien de l'infrastructure économique de base

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	Final do Projeto
Les projets sont entretenus convenablement après leur réception finale	Nombre de projets terminés et entretenus		2005	P	15,00	20,00	44,00
				A	10,00	25,00	
Les usagers, les résidents et les bénéficiaires sont impliqués dans la gestion et l'entretien des projets par des mécanismes de participation	Nombre de projets dotés de mécanismes participatifs		2005	P		10,00	15,00
				A		10,00	
Les bénéficiaires, les résidents et les usagers sont satisfaits des ouvrages réhabilités	% de personnes satisfaites		2005	P	80,00	80,00	80,00
				A	60,00	80,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Mécanisme de remise en état de l'infrastructure économique de base									
Travaux de remise en état de routes, de ponts, de drainage, de bâtiments, de ports et d'environnement	Nombre de projets réalisés	15,00	15,00		45,00	21.404.000,00	6.536.872,00		54.000.000,00
Mesures d'atténuation, plans d'entretien et études de préinvestissement	Études réalisées	10,00	10,00		60,00	600.000,00	491.500,00		5.500.000,00
Administration, finances et imprévus									
TOTAL						22.004.000,00	7.028.372,00		59.500.000,00
