

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo:	2054/OC-BR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	BR-L1043
Subtipo de Operación:	GCR - Operación Global de Crédito

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	7.500.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	750.000,00
% Desembolsado:	10,00
Saldo:	6.750.000,00

### Costo total y Fuente

BID Original:	7.500.000,00
Actual BID:	7.500.000,00
Pari-passu:	50,00
Co-financiamiento/País:	7.500.000,00
Estimado Original:	15.000.000,00
Período de Amortización (meses):	234




### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

### Reformulación


### Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Nov 18, 2011  
Validado por Representante de País: Nov 18, 2011

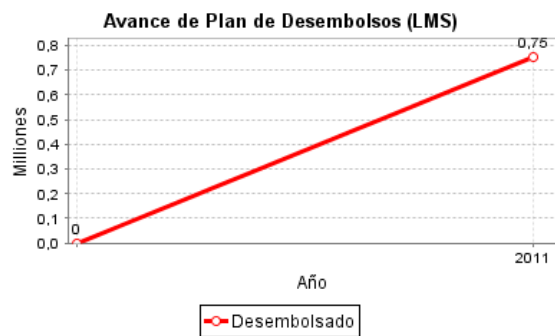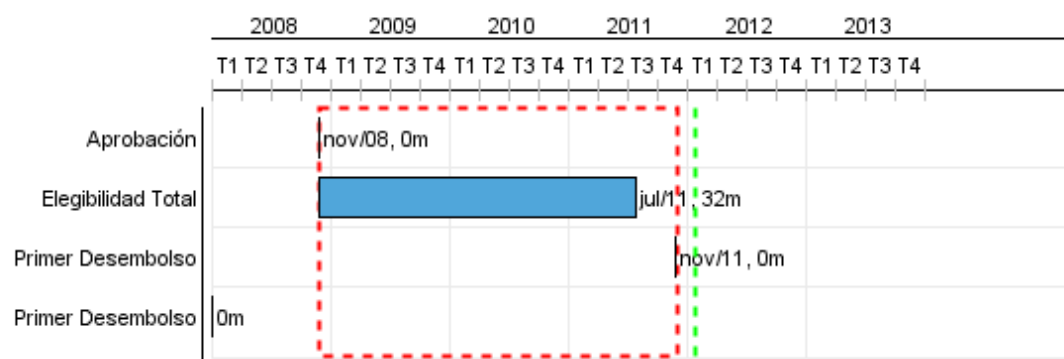

## Progreso Acumulado al 2011

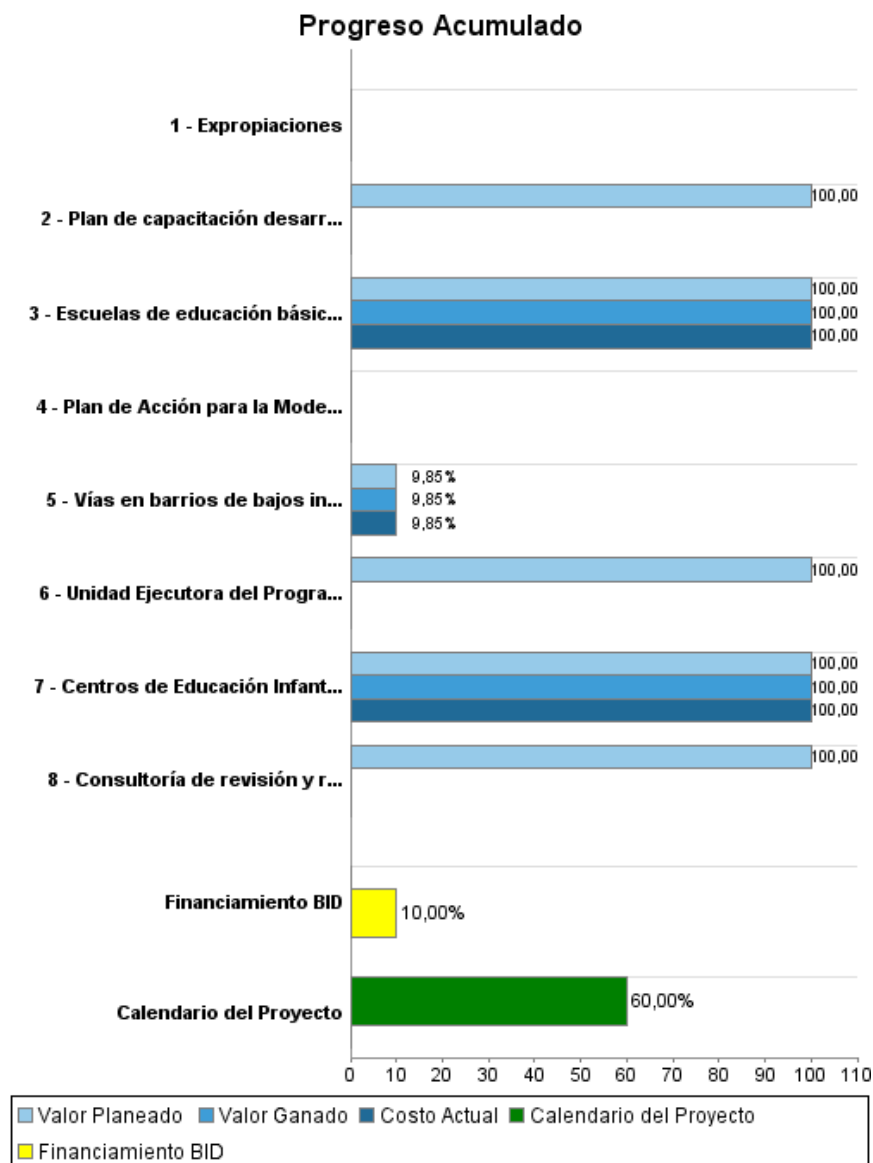

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1099 - PROCIDADES-Programa Mejoramiento Infraestructura Urbana Municipio  
Ponta Grossa  
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 17/11/2011

### Resultados

**Resultado:** Movilidad del municipio de Ponta Grossa mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo de viaje de autobuses que circulan en los tramos pavimentados	Minutos/viaje	40,00	2007	P	38,00
				A	

**Resultado:** Red de infraestructura escolar basica (tanto educación fundamental como educación infantil) mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Alumnos de educación básica beneficiados con las mejoras de infraestructura escolar	Estudiantes		2007	P	10.420,00
				A	
Alumnos de educación infantil beneficiados con las mejoras de infraestructura escolar	Estudiantes	3.285,00	2007	P	3.876,00
				A	

**Resultado:** Eficiencia de la gestión municipal de Ponta Grossa mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo medio de los procesos de licitación de la Prefeitura	Dias	65,00	2007	P	50,00
				A	
Media de procesos de licitación de la Prefeitura realizados por año	Procesos por año	840,00	2007	P	798,00
				A	

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1099 - PROCIDADES-Programa Mejoramiento Infraestructura Urbana Municipio  
Ponta Grossa  
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 17/11/2011

### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Educación</b>									
Escuelas de educación básica remodeladas	Escuela	26,00	26,00		26,00	5.330.000,00	5.330.000,00		5.330.000,00
Centros de Educación Infantil (CEMEIs) remodelados	Students	5,00	5,00		5,00	1.065.000,00	1.065.000,00		1.065.000,00
<b>Mobilidad y Transporte</b>									
Vías en barrios de bajos ingresos pavimentadas	Kilometers				35,00	750.000,00	750.000,00		7.612.500,00
<b>Fortalecimiento Institucional</b>									
Consultoría de revisión y racionalización de procesos y procedimientos de la PMPG realizada	Consultoría	1,00			1,00	105.000,00			105.000,00
Unidad Ejecutora del Programa dotada con equipos de computación	Unidad Ejecutora	1,00			1,00	157.000,00			157.000,00
Plan de Acción para la Modernización del Catastro Inmobiliario elaborado	Plan				1,00				210.000,00
Plan de capacitación desarrollado	Plan				1,00	52.500,00			52.500,00
<b>Otros</b>									
Expropiaciones	No aplica								6.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>7.459.500,00</b>	<b>7.145.000,00</b>		<b>14.538.000,00</b>
