
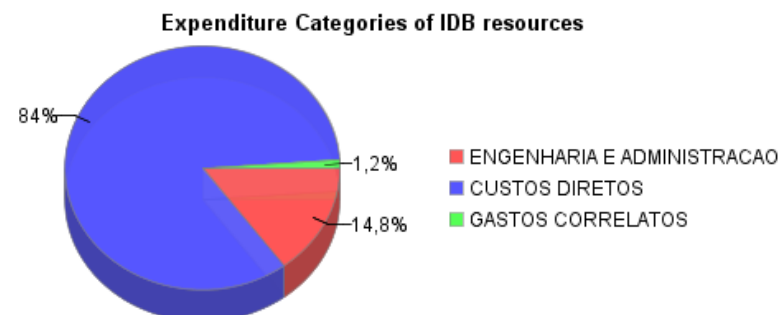
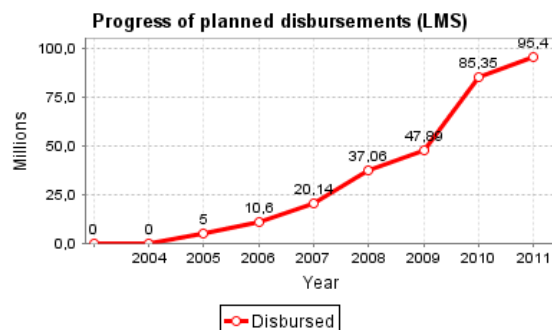


Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Companhia de Agua e Esgoto do Ceara				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	1502/OC-BR	Current Approved Amount:	100.000.000,00	Original IDB:	100.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	94.053.309,47	Current IDB:	100.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	94,05	Pari-passu:	60,00
Related Operation(s):		Balance:	5.946.690,53	Co-Financing/Country:	67.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	167.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 30, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011

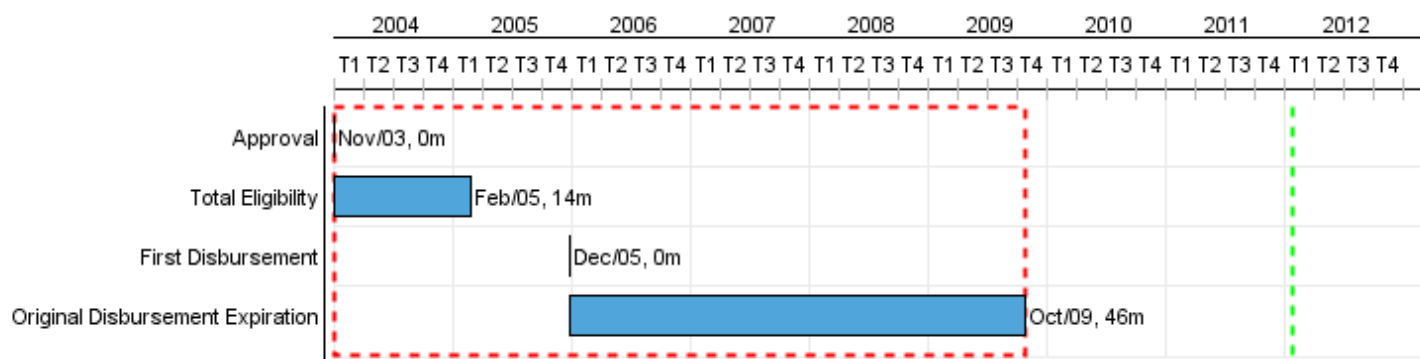

Accumulated Progress as of 2011

Accumulated Progress

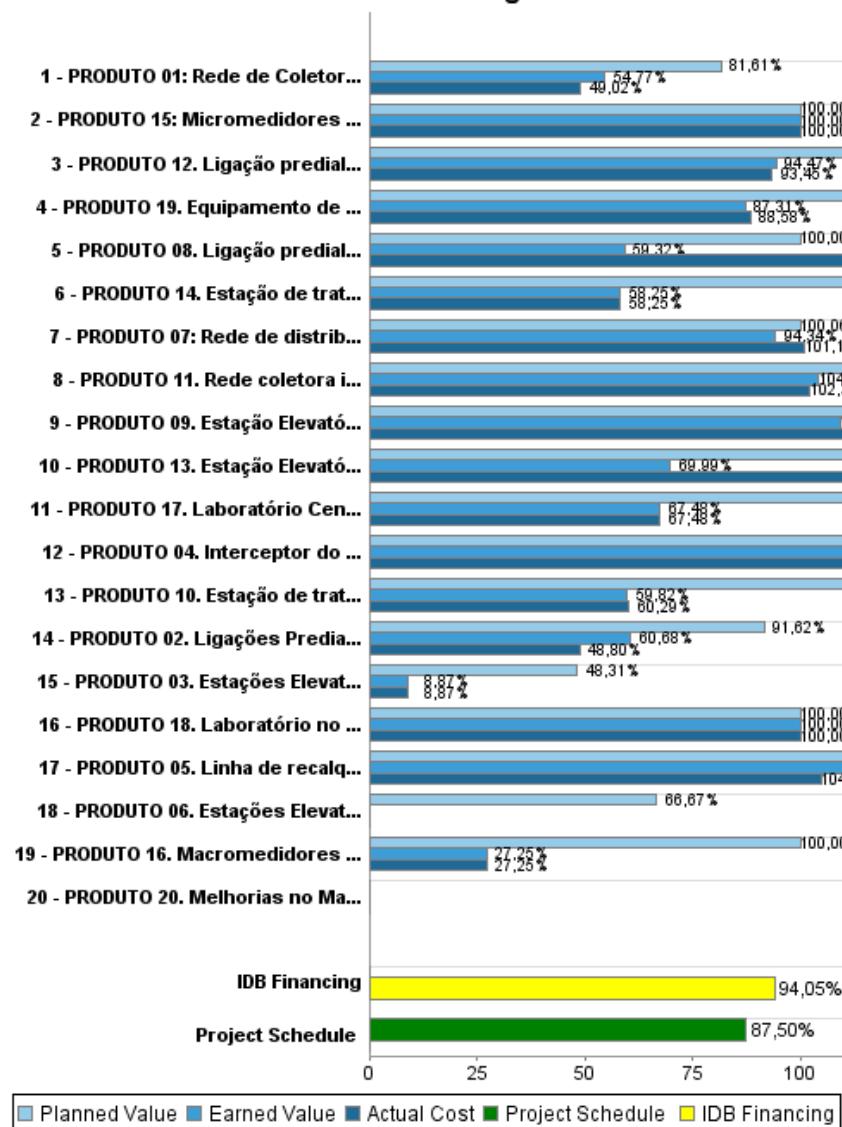

Outcomes

Outcome: Prestação de serviços de água potável e saneamento oferecida pela CAGECE, no Estado de Ceará, melhorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2012	End of project
Custo da prestação de serviço de saneamento, calculado com nova formula nacional de 2009I, menor que R\$ 2,00.	R\$/M3	0,85	2002	P	0,81		1,61
				A	0,89		
Indicador de desempenho da CAGECE (RECEITA/O&M + DEPRECIAÇÃO).	%	110,00	2004	P	120,00		146,00
				A	131,74		
Indicador de Arrecadação (O&M + SERVIÇO DA DÍVIDA).	%	110,00	2004	P	120,00		155,00
				A	147,58		
Cobertura de Custo Marginal.	%	70,00	2004	P	85,00		90,00
				A	98,34		
Índice de satisfação do cliente da CAGECE.	%	85,00	2002	P	85,00		87,00
				A	78,58		
Água não contabilizada na CAGECE.	%	38,00	2002	P	31,00	31,00	26,50
				A	25,47		
Índice de reclamação do consumidor.	%	8,00	2002	P		1,25	1,25
				A			

Outcome: Melhoria das condições de Água e Esgotamento Sanitário

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2012	End of project
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento de Fortaleza	Domicílios		2003	P		119.526,00	119.526,00
				A			
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento no interior do Estado	Domicílios		2003	P		30.100,00	30.100,00
				A			
Novos domicílios interligados ao sistema de Água no interior do Estado	Domicílios		2003	P		3.018,00	3.018,00
				A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1. Saneamento básico de Fortaleza									
PRODUTO 01: Rede de Coletora implantada.	metro	215.192,89	34.326,64		956.028,47	20.694.636,78	3.766.039,23		95.442.701,98
PRODUTO 02: Ligações Prediais de esgoto instaladas	ligação	27.659,00	3.604,00		119.560,00	7.439.182,86	1.090.720,35		35.370.758,38
PRODUTO 03: Estações Elevatórias nas sub-bacias colocado em operação	estação	4,00			29,00	1.196.833,85			11.946.709,64
PRODUTO 04: Interceptor do Macrosistema implantado	metro	2.453,20	1.431,60		6.133,00	2.202.000,00	1.773.000,00		5.504.211,43
PRODUTO 05: Linha de recalque no Macrosistema implantada	metro	1.997,20	1.165,00		14.764,00	14.734.000,00	2.831.347,55		26.078.363,22
PRODUTO 06: Estações Elevatória do Macrosistem colocado em operação	estação				3,00	2.806.686,13			4.210.029,19
2. Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em cidades do interior do Estado									
PRODUTO 07: Rede de distribuição de água potável implantada	Unidades				58.563,00				14.891.196,04
PRODUTO 08: Ligação predial de água instalada	ligação				1.850,00				808.505,75
PRODUTO 09: Estação Elevatória de Água Tratada colocado em operação	estação				7,00	146.000,00	145.997,42		489.558,77
PRODUTO 10: Estação de tratamento de Água colocado em operação	estação				3,00				3.462.263,97
PRODUTO 11: Rede coletora implantada	metro		655,99		211.271,00		2.969.468,58		27.056.317,46
PRODUTO 12: Ligação predial de esgoto instalada	ligação		180,00		30.100,00		1.550.781,28		9.330.848,63
PRODUTO 13: Estação Elevatória de Esgoto colocado em operação	estação				16,00				7.556.017,20
PRODUTO 14: Estação de tratamento de Esgoto colocado em operação	estação				5,00				14.549.352,81
3. Desenvolvimento institucional da CAGECE									
PRODUTO 15: Micromedidores instalados	micromedidores				696.000,00				8.539.524,82
PRODUTO 16: Macromedidores instalados	macromedidor	157,00			157,00	1.542.168,36			2.119.778,61
PRODUTO 17: Laboratório Central Instalado	laboratório	1,00			1,00	995.000,00			2.881.881,55
PRODUTO 18: Laboratório no interior equipado	laboratório				1,00				294.396,44
PRODUTO 19: Equipamento de manutenção adquirido	equipamento	2,00			23,00	280.767,96	37.446,62		2.948.816,86
PRODUTO 20: Melhorias no Macrosistema de esgoto implantadas	melhoria				1,00				5.145.807,54
Outros									



PROGRESS MONITORING REPORT

BR0324 - Ceara Sanitation Program

2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 28/09/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
TOTAL						52.037.275,94	14.164.801,03		278.627.040,29
