
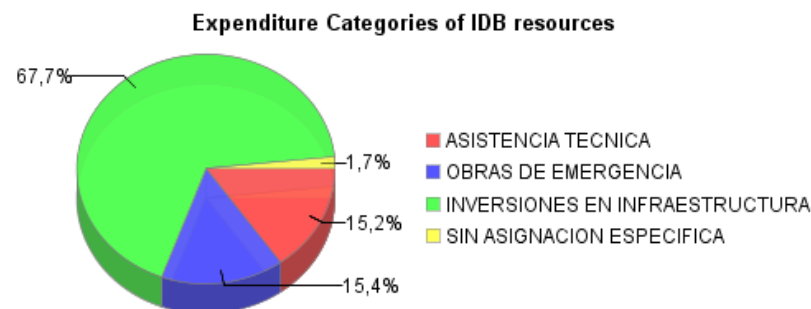
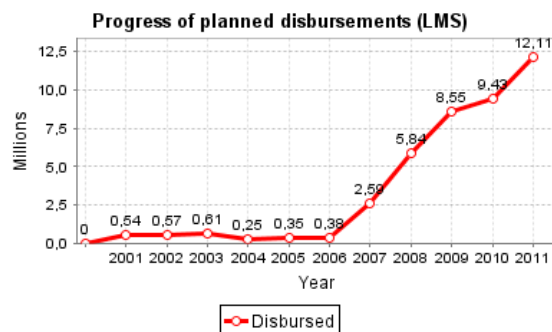



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	1198/OC-DR-1;1198/OC-DR-2	Current Approved Amount:	31.300.000,00	Original IDB:	71.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	11.507.627,09	Current IDB:	31.300.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	36,77	Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	TC9610389	Balance:	19.792.372,91	Co-Financing/Country:	18.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	89.000.000,00
				Amortization Period (months):	102

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 28, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011

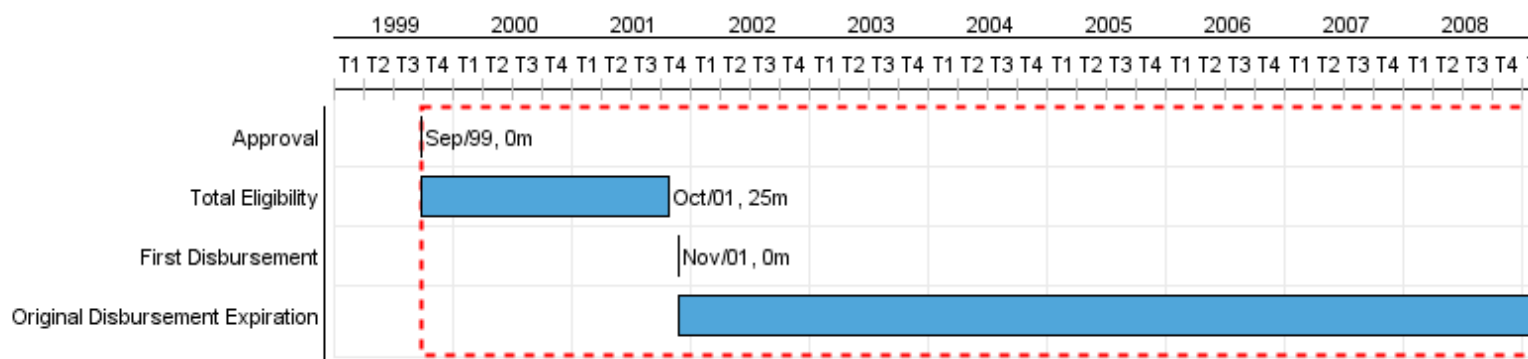

Accumulated Progress as of 2011

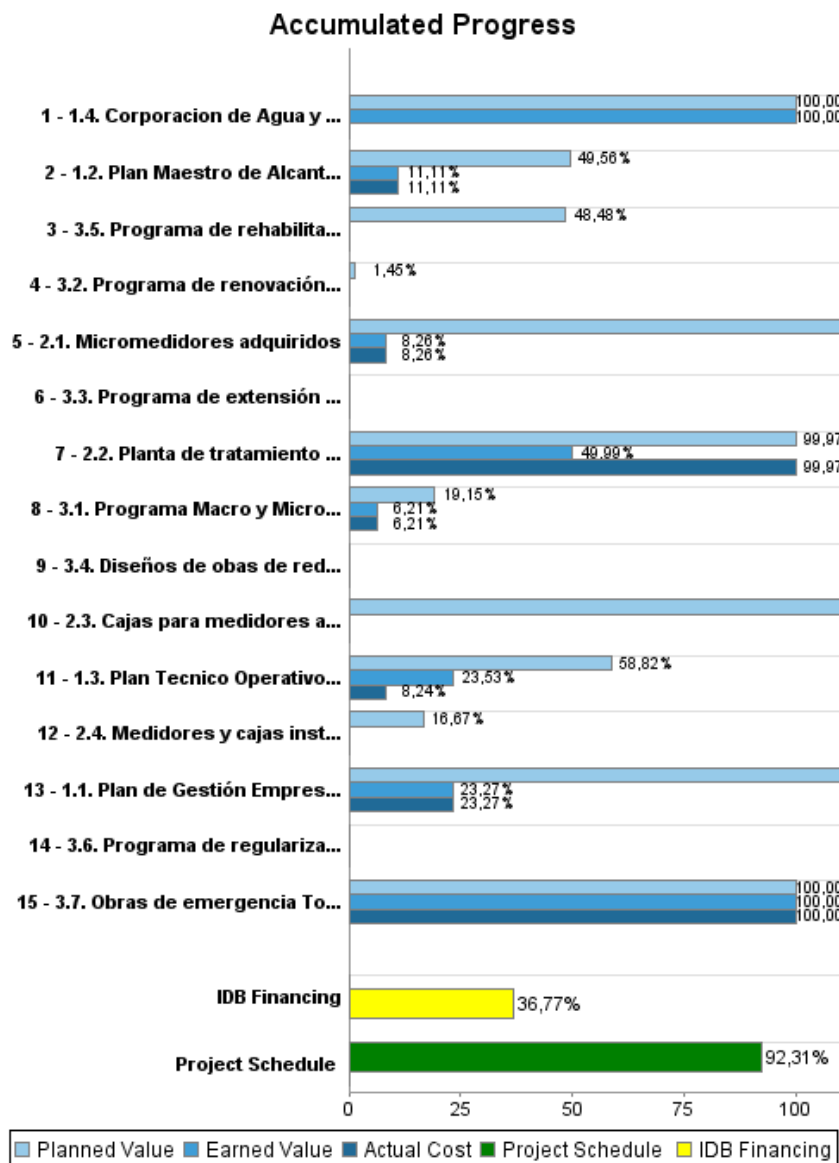

Outcomes

Outcome: Capacidad técnica y comercial de la Corporación de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	End of project
Cientes registrados en sistemas comerciales	%	60,00	2009	P	60,00	60,00	70,00	70,00
				A	60,00			
Cientes registrados con micromedición	%	27,00	2009	P	27,00	27,00	40,00	40,00
				A	27,00			
Indice de Agua No Contabilizada	%	63,00	2010	P	63,00	63,00	50,00	50,00
				A	63,00			

Outcome: Cobertura de agua potable de la CAASD incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	End of project
Cobertura de agua potable	%	89,00	2010	P	89,00	89,00	91,00	91,00
				A	89,00			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1. Fortalecimiento de la Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo									
1.1. Plan de Gestión Empresarial implementado	Plan	1,00			1,00	600.000,00			782.000,00
1.2. Plan Maestro de Alcantarillado implementado	Plan				1,00	1.000.000,00			4.500.000,00
1.3. Plan Tecnico Operativo implementado.	Plan	1,00			1,00	150.000,00			425.000,00
1.4. Corporacion de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo fortalecida financieramente (auditorias)	Organización	1,00			5,00				260.000,00
2. Obras de Emergencia									
2.1. Micromedidores adquiridos	micromedidores				20.000,00	100.000,00			109.000,00
2.2. Planta de tratamiento de aguas servidas Los Ríos y Los Jardines rehabilitada	Plantas				2,00				1.279.000,00
2.3. Cajas para medidores adquiridas	cajas				20.000,00	100.000,00			450.000,00
2.4. Medidores y cajas instalados.	Medidores				20.000,00	200.000,00			1.200.000,00
3. Obras de infraestructura									
3.1. Programa Macro y Micro-medición y control de fugas ejecutado	Programas				1,00	200.000,00			1.546.000,00
3.2. Programa de renovación y rehabilitación de redes troncales de agua potable existentes ejecutado	Programa				1,00	200.000,00			13.746.000,00
3.3. Programa de extensión en barrios carenciados de agua potable ejecutado	Programa				1,00				1.000.000,00
3.4. Diseños de obras de redes de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales preparados.	Programa				1,00				
3.5. Programa de rehabilitación de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas ejecutado	Programa				1,00	800.000,00			1.650.000,00
3.6. Programa de regularización de servicios a comunidades rurales conectadas a sistemas urbanos ejecutado	Programa								
3.7. Obras de emergencia Tormenta Noel implementada.	Obra				1,00				4.571.186,00
Otros Costos									
TOTAL						3.350.000,00			31.518.186,00
