
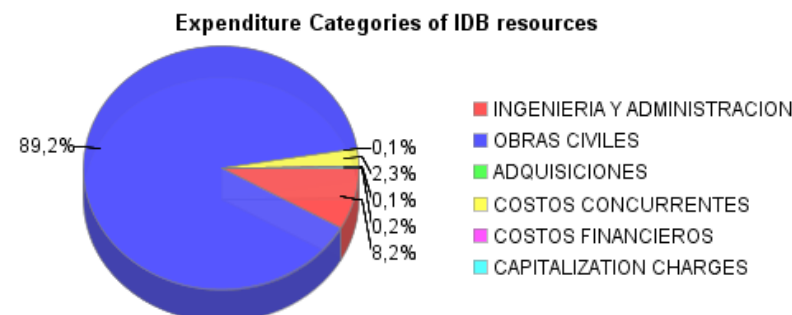
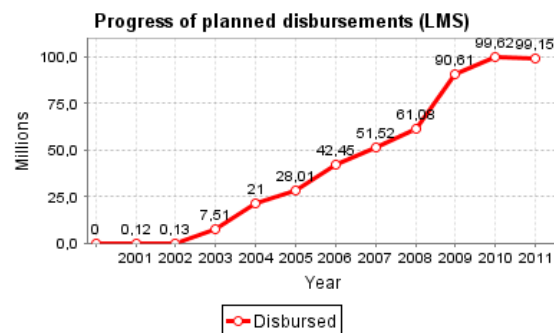


Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES				
Sector:	TRANSPORTATION-MAJOR HIGHWAYS				
Loan Number(s):	1278/OC-PR-2;1278/OC-PR-1;1278/OC-PR-1-CPS ;1278/OC-PR-2-CPS	Current Approved Amount:	99.615.396,27	Original IDB:	200.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	99.615.396,27	Current IDB:	99.615.396,27
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	83,62
Related Operation(s):		Balance:		Co-Financing/Country:	30.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	230.000.000,00
				Amortization Period (months):	168

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 23, 2011 Validated by Country Representative: Oct 20, 2011

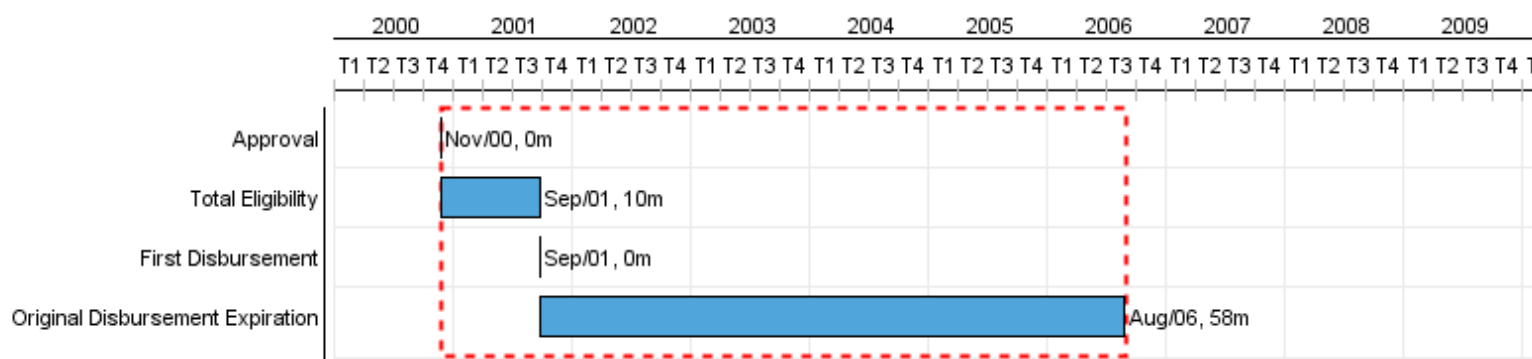

Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Reducir los costos de transportes y tiempos de viaje de las áreas de producción agrícola y pecuaria de la Región Occidental del Chaco hasta Asunción y las fronteras con Bolivia, Argentina y Brasil
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	End of project
El volumen de tráfico de la Ruta 9 aumentará en 30%	%	100,00	2001	P A	130,00	130,00
Los costos de flete de transporte en la ruta N°9 se reducirán en términos reales 20%	%	100,00	2001	P A	80,00	80,00
El tiempo de viaje de la Ruta N°9 hasta la patria se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P A	60,00	60,00
Los accidentes en la Ruta N°9 se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P A	50,00	50,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN									
Apoyo a la Administración del Programa	Consultorías				12,00				
Supervisión de Obras	Nº de Obras fiscalizadas				12,00				
Estudio de Auscultación de Pavimentos	Consultoría				1,00				
OBRAS CIVILES									
Rehabilitación de la Ruta Nº 9	km				495,00				
Mejoramiento de la Ruta 9, tramo Mcal Estigarribia - La Patria	km				123,00				
Mejoramiento de Corredores de Integración de la Región Occidental	km				647,00				
Mantenimiento Vial de la Región Occidental	km				2.000,00				
Edificación y equipamiento de Casetas de Control de peso, y Sedes Distritales	obras				4,00				
Pavimentación del Tramo Yuty-Leandro Oviedo (Ruta 8)	km				14,00				
ADQUISICIONES									
Equipos para control de peso	equipo				2,00				
Materiales para ejecución de tramos piloto	etapas de implementación del convenio				3,00				
GASTOS CONCURRENTES									
Entrenamiento y Capacitación de personal	Grupos fortalecidos				3,00				
Protección ambiental y desarrollo de comunidades	hectáreas				12.000,00				
Fortalecimiento institucional y asesoramiento	personal incremental para la DV								
Apoyo para el programa de Investigación del Tramo Piloto	consultorías				1,00				
Imprevisto y Escalamiento	-								
GASTOS FINANCIEROS									
Intereses, Gastos Administrativos, Comisión de Crédito y gastos de inspección y Vigilancia.	-								
TOTAL									
