
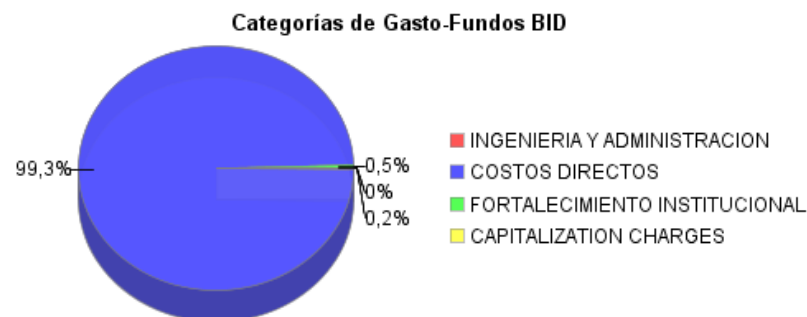
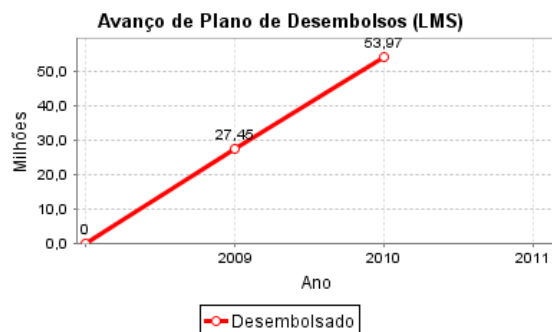



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS				
Setor:	TRANSPORTATION				
Número da Operação:	1294/OC-AR	Atual:	200.000.000,00	Original BID:	200.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	148.647.308,78	Corrente BID:	200.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	74,32	Pari-passu:	28,70
Operação Relacionada:	TC9803504	Saldo:	51.352.691,22	Cofinanciamento/País:	80.000.000,00
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimado:	280.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	162

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 31, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 28, 2011

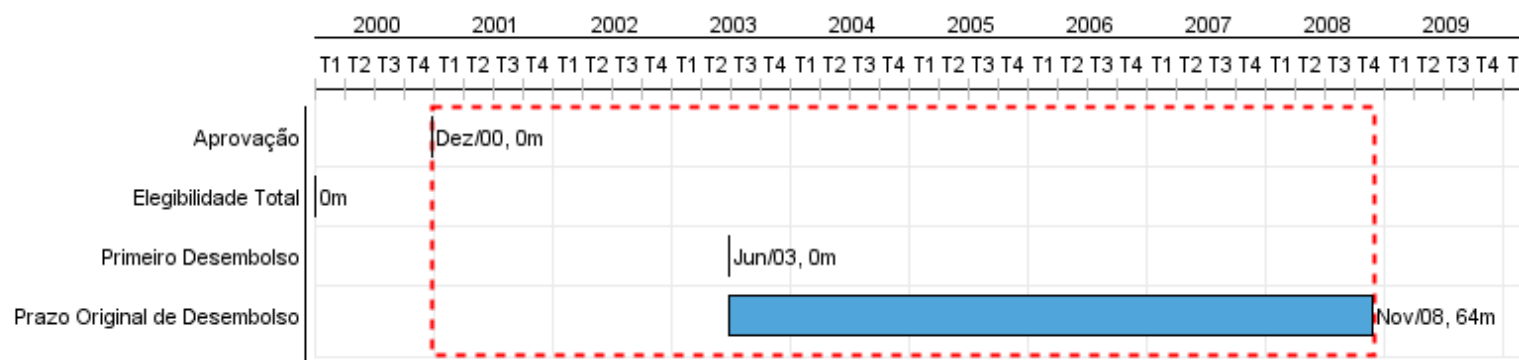

Progresso Acumulado até 2010

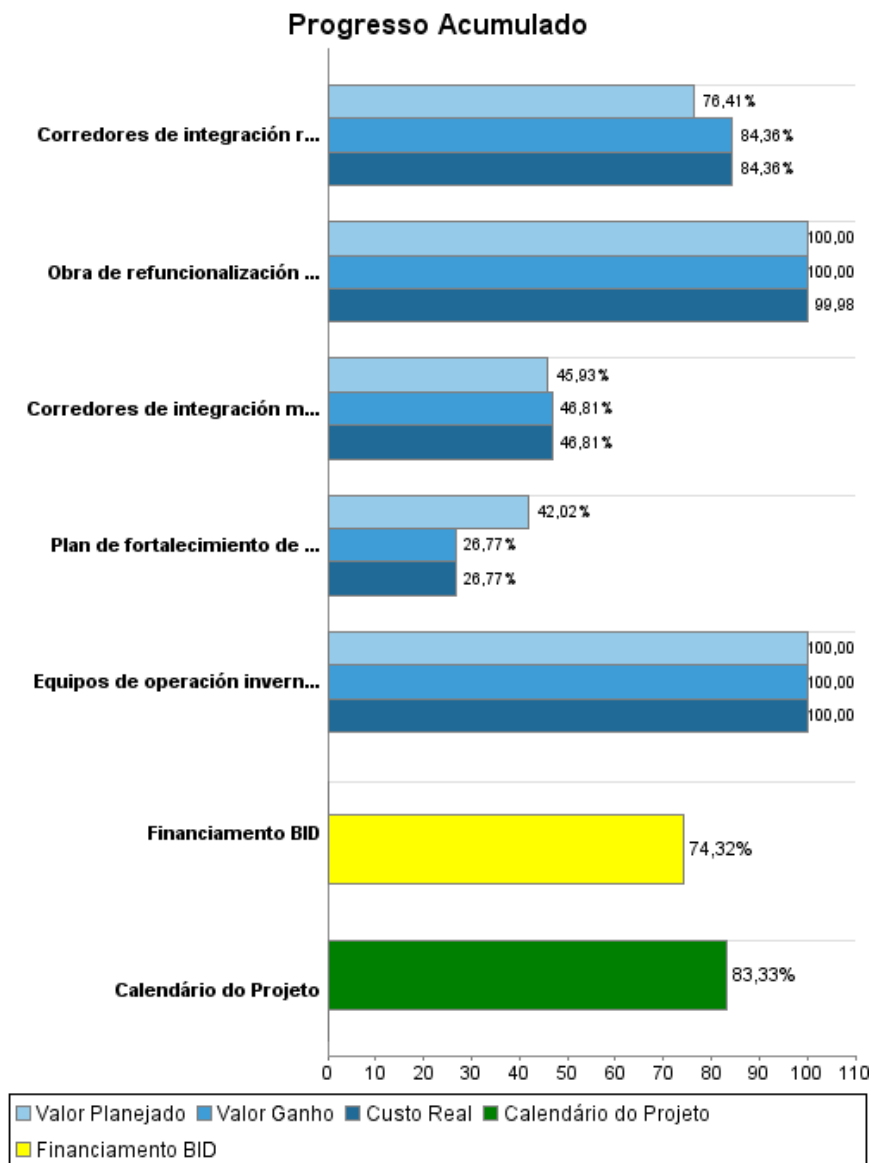

Resultados

Resultado:	Nivel de servicio de las rutas y pasos fronterizos intervenidos mejorado.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Costos de operación de un camión tipo en pasos fronterizos (Ruta Nacional 14)	\$/km	1,42		P A	1,01
Tránsito con Chile por pasos mejorados (paso Cristo Redentor)	veh/año	1.300,00		P A	2.700,00
Costos de operación de un camión tipo en corredores mejorados (Ruta Nacional 16)	\$/km	1,30		P A	1,00
Alertas por avalanchas de nieve atendidas por el sistema en el Paso Cristo Redentor (a Chile)	Alertas			P A	3,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Mejoramiento y Rehabilitación de Corredores Viales de Integración.									
Corredores de integración mejorados	Kilómetros		145,00		242,00	60.000.000,00	64.489.000,00		513.800.000,00
Corredores de integración rehabilitados	Kilómetros		68,00		68,00	3.500.000,00	5.759.000,00		28.400.000,00
2. Fortalecimiento Institucional									
Plan de fortalecimiento de la capacidad de la Dirección Nacional de Vialidad implementado	Plan				1,00	300.000,00	10.290,00		1.904.000,00
Obra de refuncionalización del campamento de la DNV en Uspallata, Ruta Nacional 7 terminada	Obra				1,00				1.754.000,00
3. Adquisición de equipos de operación									
Equipos de operación invernal adquiridos	equipos				9,00				5.152.391,00
4. Ingeniería y Administración									
TOTAL						63.800.000,00	70.258.290,00		551.010.391,00
