

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE VIVIENDA
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Número da Operação:	2072/OC-PN
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	30.000.000,00
Desembolsado:	6.975.429,79
% Desembolsado:	23,25
Saldo:	23.024.570,21

### Custo Total e Fonte

Original BID:	30.000.000,00
Corrente BID:	30.000.000,00
Pari-passu:	95,00
Cofinanciamento/País:	1.500.000,00
Original Estimado:	31.500.000,00
Período de Amortização (meses):	246

### Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

### Reformulação


B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 17-abr-2012  
Validado pelo Representante do País: 27-abr-2012

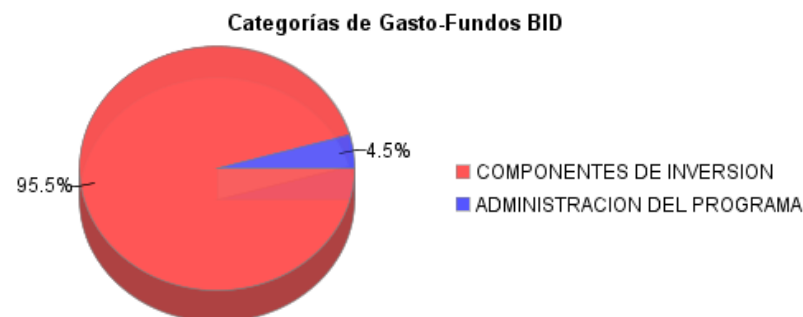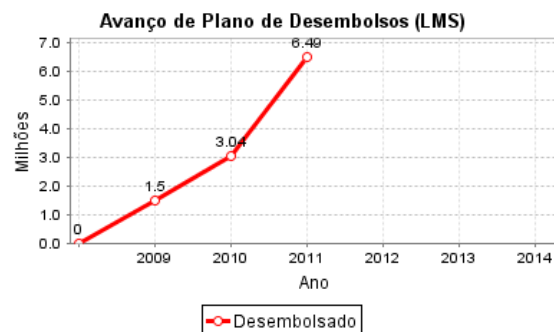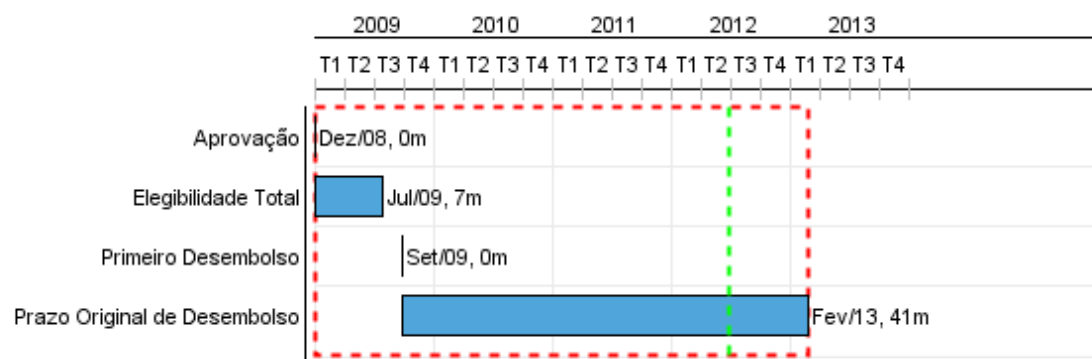

## Progresso Acumulado até 2011

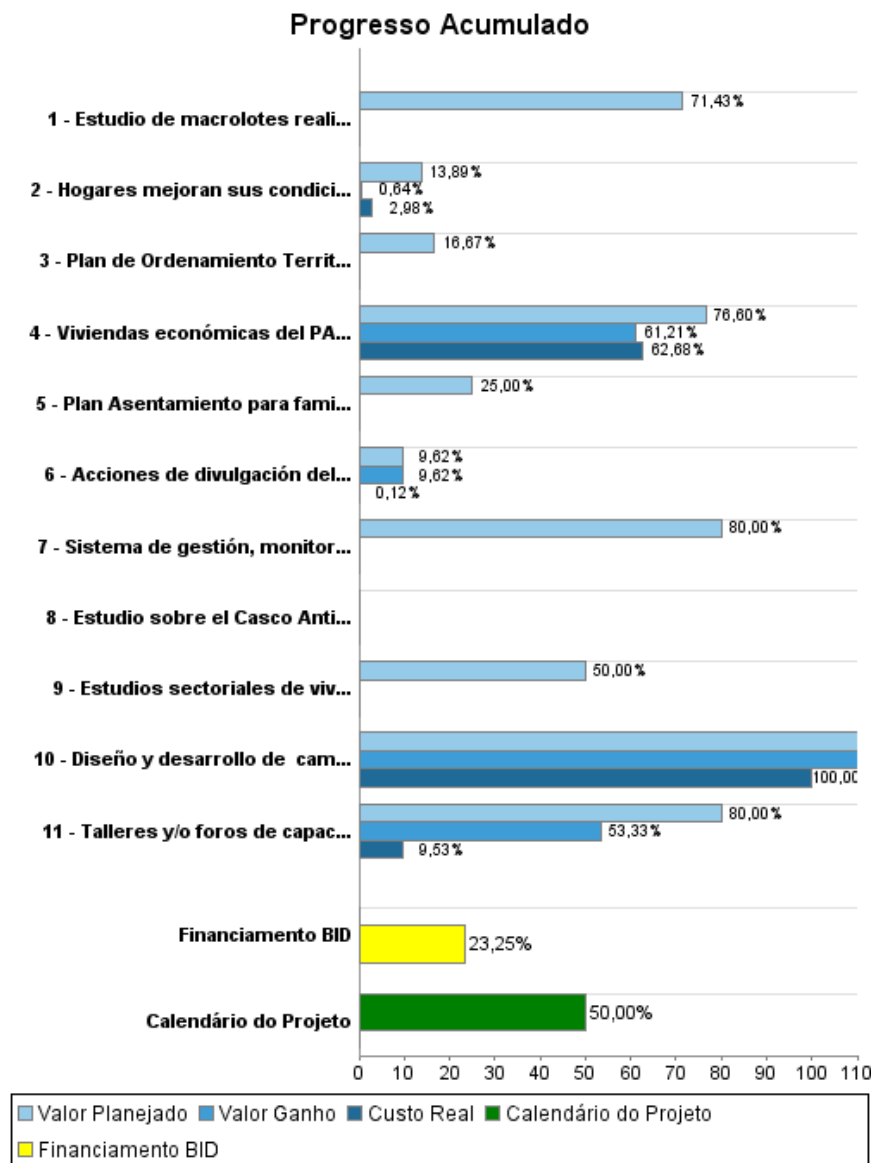

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Población residiendo en asentamientos informales reducida.	%	100.00	2005	P	91.30	91,30
				A		
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza reducida	%	100.00	2005	P	99.30	99,30
				A		

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA</b>									
Hogares mejoran sus condiciones de vivienda.	Hogares	1.000,00			3.203,00	1.916.000,00	491.300,00		21.000.000,00
<b>Componente II. Viviendas sociales - PARVIS</b>									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	292,00	298,00		592,00	2.490.621,00	1.483.000,00		7.560.000,00
<b>Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)</b>									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio				1,00				100.000,00
<b>Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional</b>									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones	1,00	1,00		3,00	70.000,00	4.300,00		150.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			2,00	200.000,00			250.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio				1,00	50.000,00			70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio	2,00			3,00	30.000,00			60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campana	1,00	1,00		1,00	50.000,00	34.000,00		34.000,00
Acciones de divulgación del Programa ( campañas anuales) realizadas.	campana	1,00	1,00		3,00	25.000,00	300,00		260.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martin aprobado.	POT				1,00	50.000,00			300.000,00
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan				1,00	50.000,00			200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.931.621,00</b>	<b>2.012.900,00</b>		<b>29.984.000,00</b>
