
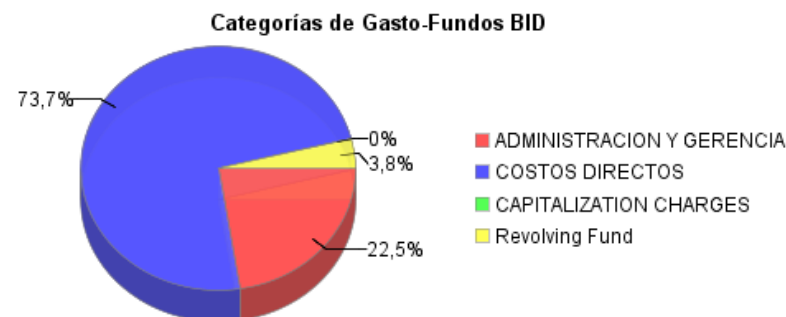
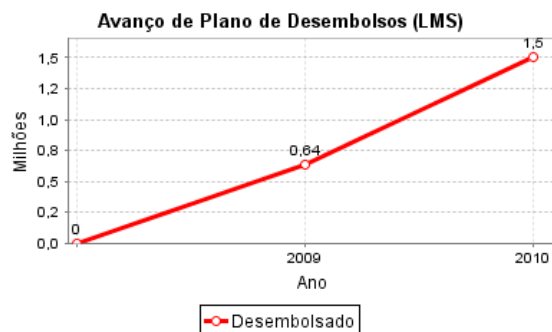



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SERVICIO NACIONAL SANEAMIENTO AMBIENTAL		
Sector: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: 1312/OC-PR-CPS;1312/OC-PR	Atual: 11.868.487,21	Original BID: 24.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 11.868.487,21	Corrente BID: 11.868.487,21
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 72,72
Operação Relacionada:	Saldo:	Cofinanciamento/País: 5.100.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 29.100.000,00
		Período de Amortização (meses): 222

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 26, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011

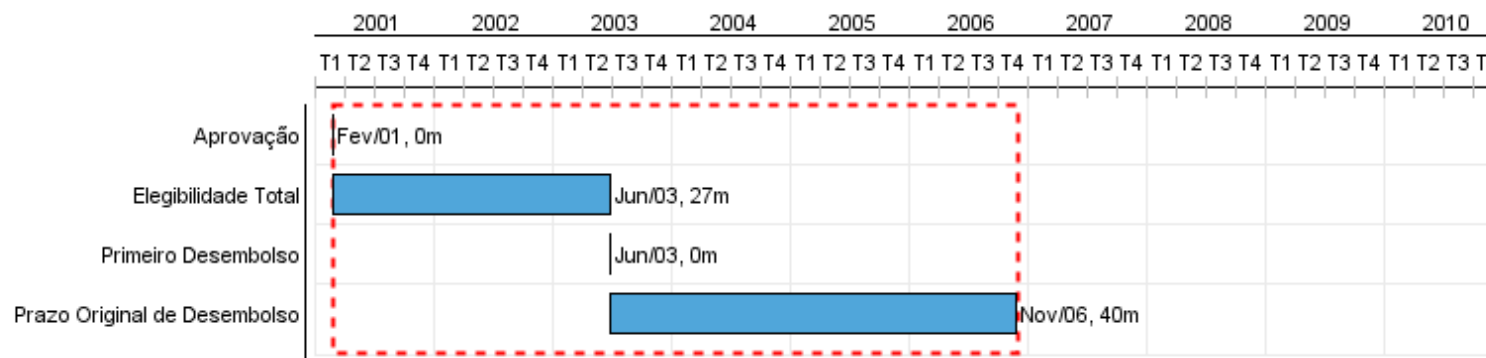

Progresso Acumulado até 2010

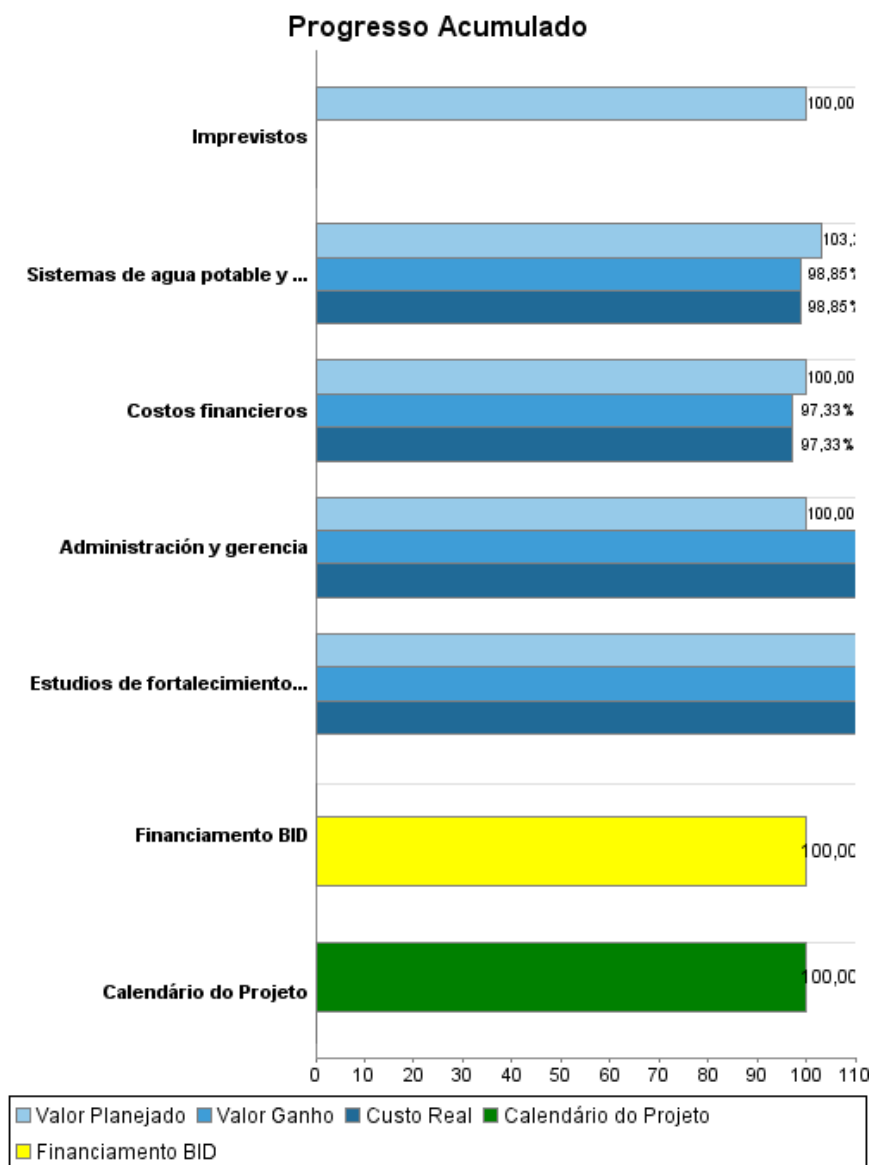

Resultados

Resultado:	Esquema institucional de provisión de servicio de agua potable y de saneamiento a pequeñas comunidades fortalecido.
Observações:	En Juntas de Saneamiento y/o Comisiones de Saneamiento, Asociaciones de Juntas y SENASA

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2008	2010	Final do Projeto
Morosidad en las cuotas de los préstamos a las comunidades o juntas de agua.	% de cuotas vencidas	18,00	2006	P		9,00		9,00
				A	14,00			
Juntas de agua para comunidades (100 rurales + 10 indígenas), suscriben convenios con SENASA, obligándose al cumplimiento del pago respectivo, así como a la operacion y mantenimiento.	juntas de agua		2006	P	110,00			0,00
				A	111,00			
Hogares atendidos con acceso a agua potable en comunidades rurales	Hogares		2006	P				0,00
				A			11.769,00	
Hogares atendidos con acceso a agua mejorada en comunidades indígenas	Hogares		2006	P				0,00
				A			447,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Sistemas de Agua y Saneamiento									
Sistemas de agua potable y soluciones individuales de saneamiento en comunidades rurales construidos	sistemas		1,00		100,00		355.636,00		10.959.000,00
2. Sistemas en Comunidades Indígenas									
Sistemas de agua potable y soluciones individuales de saneamiento en comunidades indígenas construidos	sistemas				10,00				400.000,00
3. Apoyo Institucional									
Estudios de fortalecimiento concluidos y entregados: Nomenclatura: 0 (no existen estudios) 80 (presentando penúltimo informe de fortalecimiento) 100 (estudios concluidos y entregados)	%				100,00		90.271,00		600.000,00
Administración, costos financieros e imprevisto									
Administración y gerencia	NA					3.090.000,00	3.643.220,00		3.090.000,00
Imprevistos	NA					300.000,00			300.000,00
Costos financieros	NA					1.751.000,00	1.704.309,00		1.751.000,00
TOTAL						5.141.000,00	5.793.436,00		17.100.000,00
