
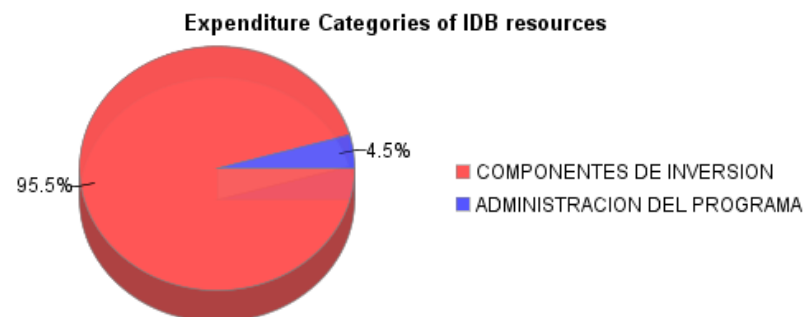
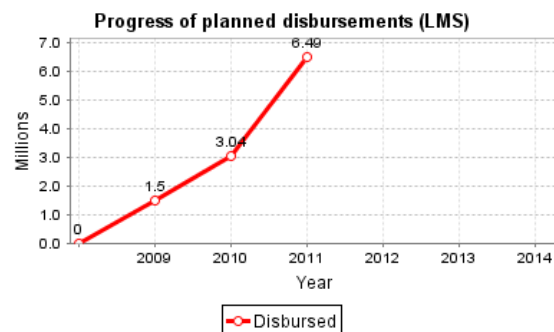



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING				
Loan Number(s):	2072/OC-PN	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	6.975.429,79	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	23,25	Pari-passu:	95,00
Related Operation(s):		Balance:	23.024.570,21	Co-Financing/Country:	1.500.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	31.500.000,00
				Amortization Period (months):	246

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 17-abr-2012 Validated by Country Representative: 27-abr-2012

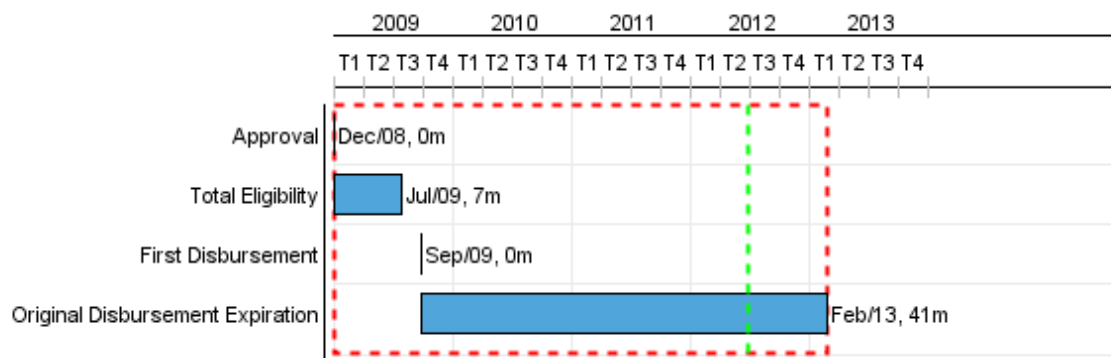

Accumulated Progress as of 2011

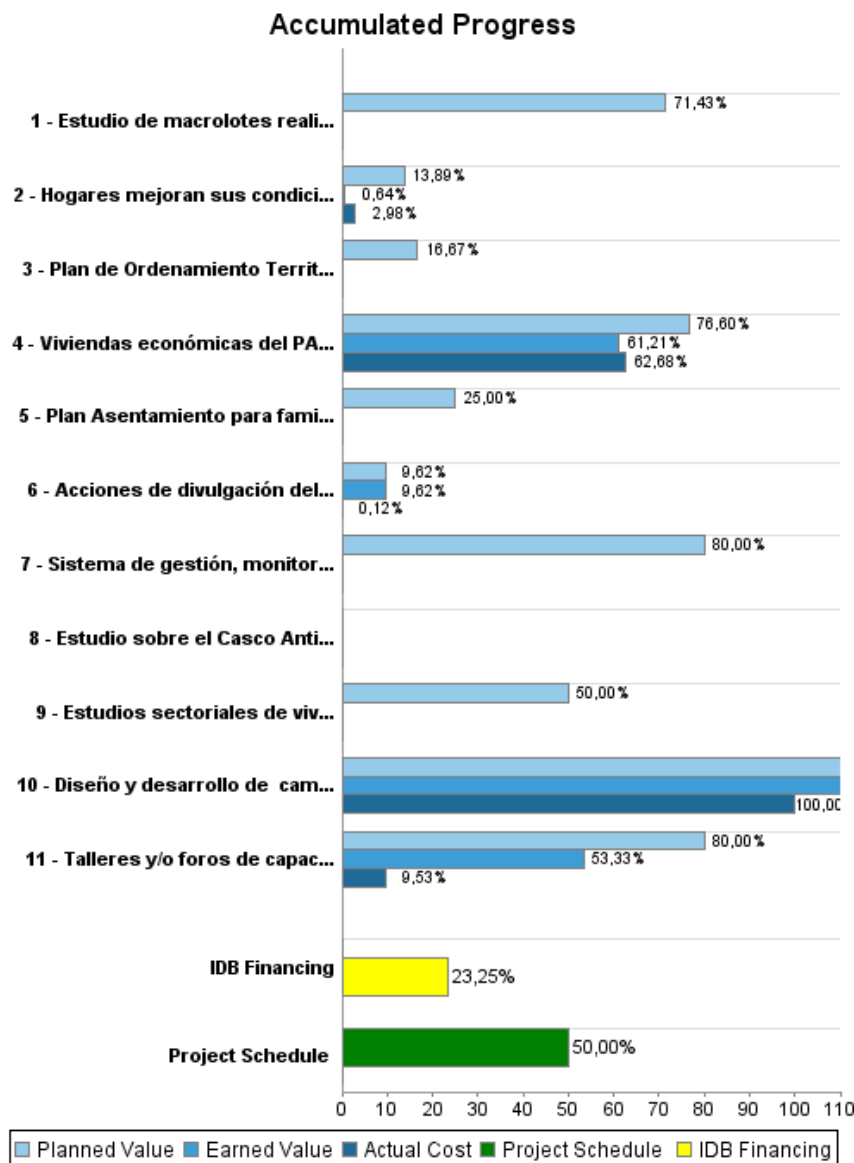

Outcomes

Outcome:	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Población residiendo en asentamientos informales reducida.	%	100.00	2005	P	91.30	91,30
				A		
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza reducida	%	100.00	2005	P	99.30	99,30
				A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA									
Hogares mejoran sus condiciones de vivienda.	Hogares	1.000,00			3.203,00	1.916.000,00	491.300,00		21.000.000,00
Componente II. Viviendas sociales - PARVIS									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	292,00	298,00		592,00	2.490.621,00	1.483.000,00		7.560.000,00
Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio				1,00				100.000,00
Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones	1,00	1,00		3,00	70.000,00	4.300,00		150.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			2,00	200.000,00			250.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio				1,00	50.000,00			70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio	2,00			3,00	30.000,00			60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campaña	1,00	1,00		1,00	50.000,00	34.000,00		34.000,00
Acciones de divulgación del Programa (campañas anuales) realizadas.	campaña	1,00	1,00		3,00	25.000,00	300,00		260.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martín aprobado.	POT				1,00	50.000,00			300.000,00
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan				1,00	50.000,00			200.000,00
TOTAL						4.931.621,00	2.012.900,00		29.984.000,00
