
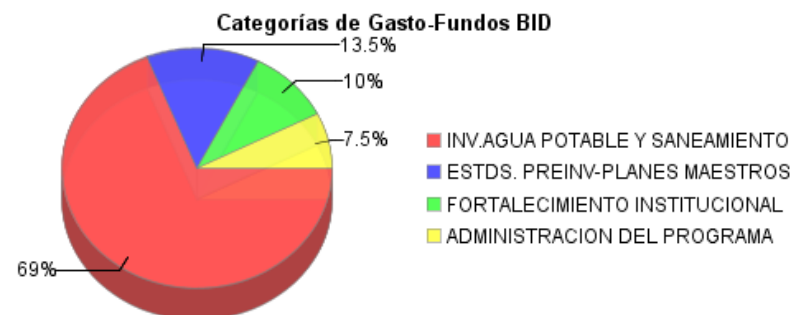
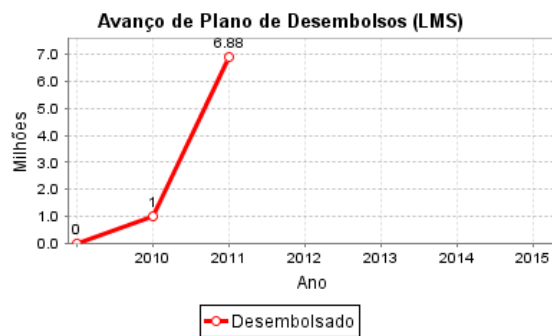



## Relatório Resumido

| Dados Gerais   | Fundos Disponíveis (US\$)  | Custo Total e Fonte                 |
|--|----------------------------|-------------------------------------|
| Executor: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA                          |                            |                                     |
| Sector: WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY                              |                            |                                     |
| Número da Operação: 2199/BL-BO   | Atual: 20.000.000,00       | Original BID: 20.000.000,00         |
| Estágio: Approved  | Desembolsado: 6.994.024,67 | Corrente BID: 20.000.000,00         |
| Tipo Operação: INV - Investimento                                      | % Desembolsado: 34,97      | Pari-passu: 100,00                  |
| Operação Relacionada: BO-P1012, BO-T1085, BO-T1105, BO-X1004, RG-P1374 | Saldo: 13.005.975,33       | Cofinanciamento/País:               |
| Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project                 |                            | Original Estimado: 20.000.000,00    |
|  |                            | Período de Amortização (meses): 282 |

| Categoria do impacto social    | Reformulação                                    | Validação   |
|--------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: B | ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 15-mar-2012<br>Validado pelo Representante do País: 27-abr-2012 |

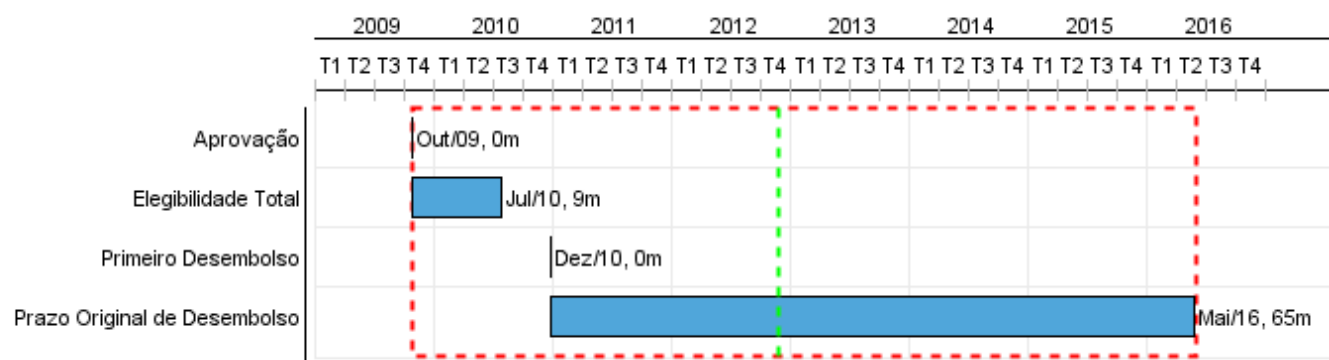

## Progresso Acumulado até 2011

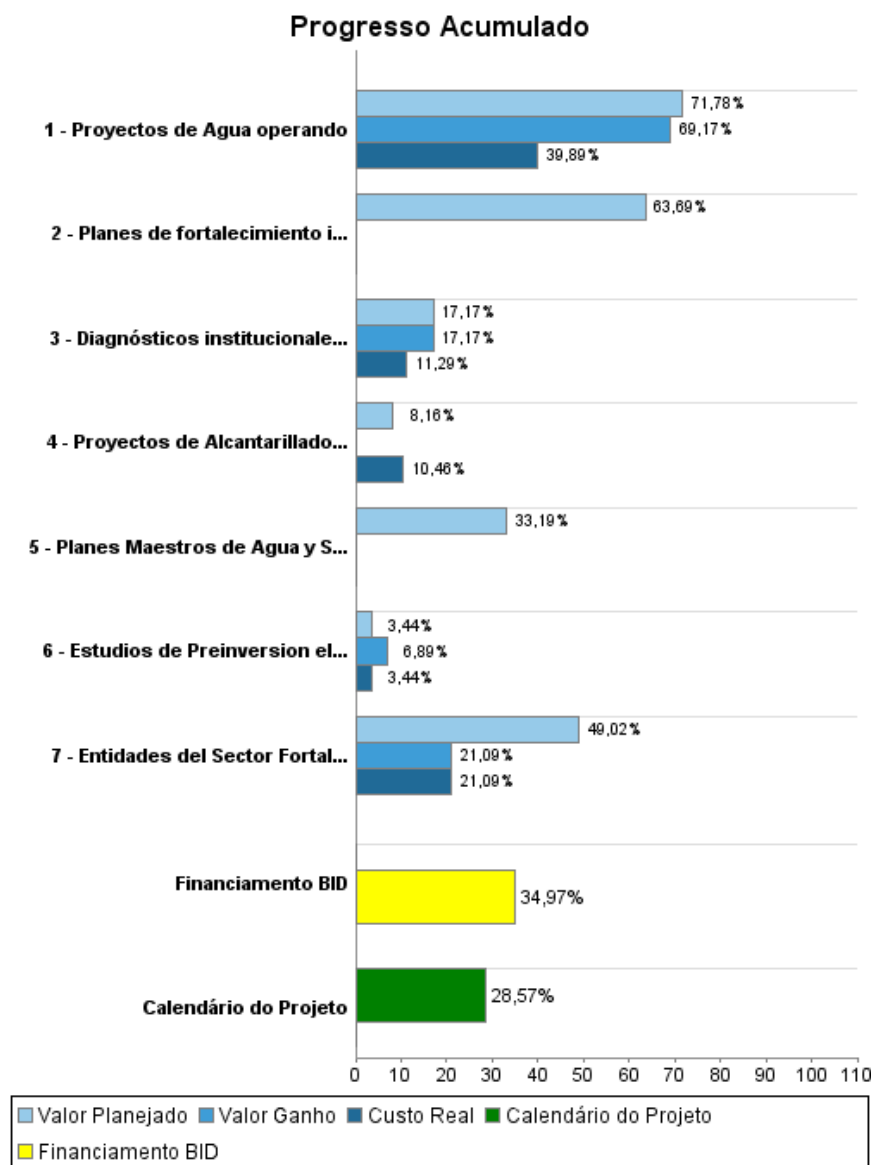

## Resultados

**Resultado:** Acceso a Servicios Básicos mejorado

| Indicador   | Unidade Medida            | Linha Base | Ano Linha Base |   | 2011 | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | Final do Projeto |
|---|---------------------------|------------|----------------|---|------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Continuidad del servicio                                      | Horas de Servicio por día | 4.00       | 2009           | P |      |            |            |            | 6.00       | 6.00             |
|   |                           |            |                | A |      |            |            |            |            |                  |
| Cobertura de agua potable                                     | Conexiones                | 567,759.00 | 2009           | P |      | 568,788.00 | 570,597.00 | 582,163.00 | 582,163.00 | 582.163,00       |
|   |                           |            |                | A |      |            |            |            |            |                  |
| Cobertura de alcantarillado                                   | Conexiones                | 265,212.00 | 2009           | P |      | 279,351.00 | 295,531.00 | 322,798.00 | 343,057.00 | 363.316,00       |
|   |                           |            |                | A |      |            |            |            |            |                  |
| Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos             | Hogares                   | 1,029.00   | 2011           | P |      | 1,809.00   | 11,566.00  |            |            | 14.409,00        |
|   |                           |            |                | A |      |            |            |            |            |                  |
| Hogares con sistemas de suministro de agua mejorados          | Hogares                   | 15,357.00  | 2011           | P |      | 8,900.00   | 10,722.00  | 10,000.00  | 20,000.00  | 74.979,00        |
|   |                           |            |                | A |      |            |            |            |            |                  |
| Hogares con coenxion a un sistema de alcantarillado sanitario | Hogares                   | 14,139.00  | 2011           | P |      | 180.00     | 17,267.00  | 28,259.00  | 38,259.00  | 98.104,00        |
|   |                           |            |                | A |      |            |            |            |            |                  |

**Resultado:** Salud de la población beneficiaria mejorada

| Indicador   | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base |   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015      | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|---|------|------|------|------|-----------|------------------|
| Casos de Enfermedades Diarréicas Agudas registrados en niños menores a 5 años                     | Casos          | 97,615.00  | 2009           | P |      |      |      |      | 92,734.00 | 92.734,00        |
|   |                |            |                | A |      |      |      |      |           |                  |
| Sistemas de alcantarillado conPlanta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en áreas periurbanas | Sistemas       | 15.00      | 2009           | P |      |      |      |      | 25.00     | 25,00            |
|   |                |            |                | A |      |      |      |      |           |                  |

**Resultado:** Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento fortalecidas

| Indicador   | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base |   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|---|------|------|------|------|------|------------------|
| Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento con Eficiencia Operativa menor o igual a uno                                   | Entidad        | 2.00       | 2009           | P | 3.00 |      | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 10,00            |
|   |                |            |                | A |      |      |      |      |      |                  |
| Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento con Capacidad para medir cumplimiento de la norma NB 512 sobre calidad de agua | Entidad        | 2.00       | 2009           | P | 3.00 |      | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 10,00            |
|   |                |            |                | A |      |      |      |      |      |                  |

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

| Descrição   | Unidade de medida | Físico    |       |                     |              | Financeiro           |                      |                   |                      |
|---|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|   |                   | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado            | Atual                | Custos Acumulados | Custos FDP           |
| <b>Componente 1: Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado</b>                           |                   |           |       |                     |              |                      |                      |                   |                      |
| Proyectos de Agua operando  | Proyectos         | 2,00      | 2,00  |                     | 5,00         | 5.330.890,60         | 3.074.409,00         |                   | 7.706.657,00         |
| Proyectos de Alcantarillado operando  | Proyectos         | 2,00      |       |                     | 15,00        | 6.127.848,20         | 7.851.084,00         |                   | 75.093.343,00        |
| <b>Componente 2: Planes Maestros y Estudios de Preinversión</b>                           |                   |           |       |                     |              |                      |                      |                   |                      |
| Planes Maestros de Agua y Saneamiento elaborados  | Planes            |           |       |                     | 4,00         | 1.671.250,00         |                      |                   | 5.034.965,00         |
| Estudios de Preinversion elaborados   | Estudios          | 2,00      | 4,00  |                     | 8,00         |                      | 71.103,00            |                   | 2.065.035,00         |
| <b>Componente 3: Fortalecimiento institucional para operadoras y entidades del sector</b> |                   |           |       |                     |              |                      |                      |                   |                      |
| Diagnósticos institucionales elaborados   | Informes          | 4,00      | 4,00  |                     | 10,00        |                      | 13.543,00            |                   | 120.000,00           |
| Planes de fortalecimiento institucional implementados                                     | Planes            | 3,00      |       |                     | 10,00        | 1.318.000,00         |                      |                   | 2.280.000,00         |
| Entidades del Sector Fortalecidas   | Entidades         |           |       |                     | 3,00         | 810.353,40           | 296.753,00           |                   | 2.000.000,00         |
| <b>Administración del Programa</b>  |                   |           |       |                     |              |                      |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL</b>  |                   |           |       |                     |              | <b>15.258.342,20</b> | <b>11.306.892,00</b> |                   | <b>94.300.000,00</b> |
