
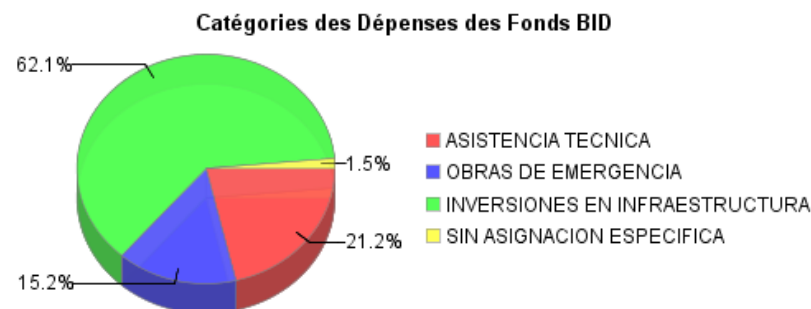
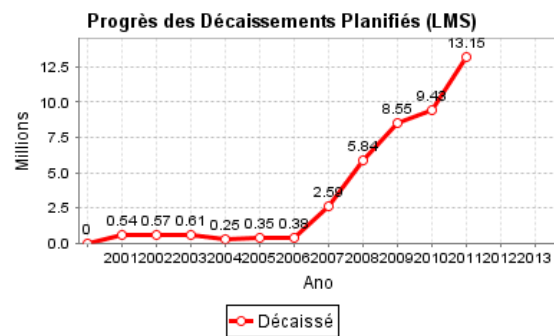



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO		
Secteur:	WATER AND SANITATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	1198/OC-DR-1;1198/OC-DR-2	Montant Courant Approuvé:	31.300.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	13.866.568,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	44,30
Opération(s) Connexe(s):	TC9610389	Solde:	17.433.432,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	71.000.000,00
		Courant BID:	31.300.000,00
		Pari Passu:	80,00
		Cofinancement/Pays:	18.000.000,00
		Estimation Initiale:	89.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	102

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 26-abr-2012 Validé par le Représentant: 26-abr-2012

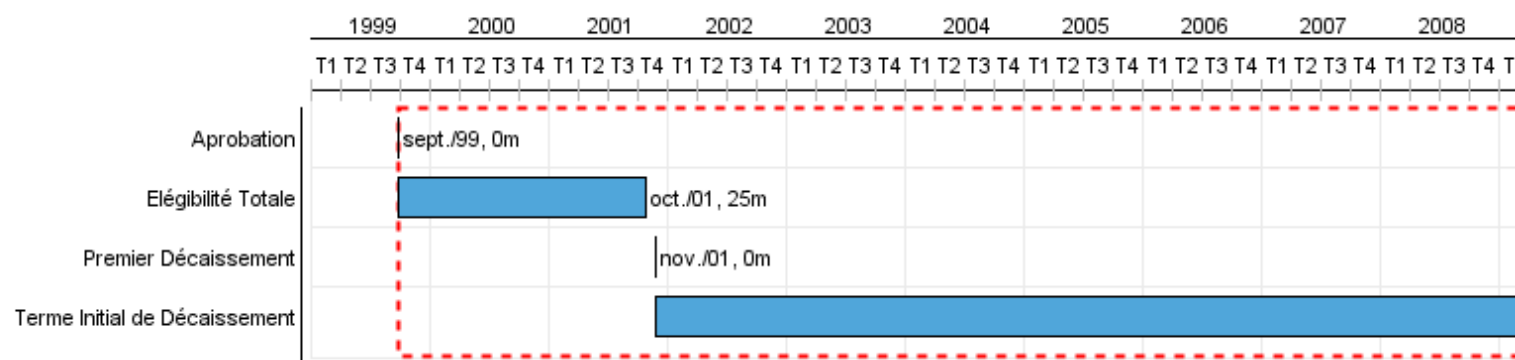

Progrès Cumulé à 2011

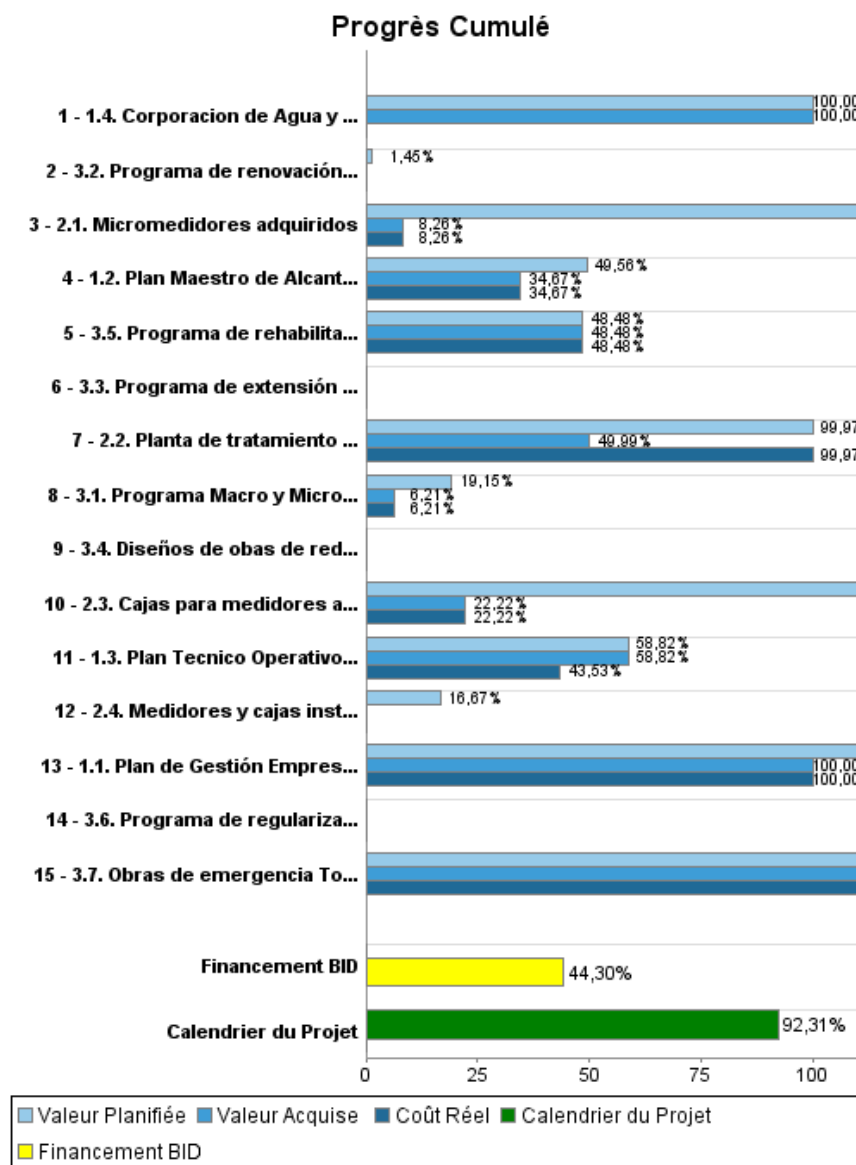

Résultats

Résultat: Capacidad técnica y comercial de la Corporación de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	Fin du Projet
Clients registrados en sistemas comerciales	%	60.00	2009	P	60.00	60.00	70.00	70,00
				A	60.00	60.00		
Clients registrados con micromedición	%	27.00	2009	P	27.00	27.00	40.00	40,00
				A	27.00	21.00		
Indice de Agua No Contabilizada	%	63.00	2010	P	63.00	63.00	50.00	50,00
				A	63.00	63.00		

Résultat: Cobertura de agua potable de la CAASD incrementada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	Fin du Projet
Cobertura de agua potable	%	89.00	2010	P	89.00	89.00	91.00	91,00
				A	89.00	89.00		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. Fortalecimiento de la Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo									
1.1. Plan de Gestión Empresarial implementado	Plan	1,00	1,00		1,00	600.000,00	600.000,00		782.000,00
1.2. Plan Maestro de Alcantarillado implementado	Plan				1,00	1.000.000,00	1.060.000,00		4.500.000,00
1.3. Plan Tecnico Operativo implementado.	Plan	1,00	1,00		1,00	150.000,00	150.000,00		425.000,00
1.4. Corporacion de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo fortalecida financieramente (auditorias)	Organización	1,00	1,00		5,00				260.000,00
2. Obras de Emergencia									
2.1. Micromedidores adquiridos	micromedidores				20.000,00	100.000,00			109.000,00
2.2. Planta de tratamiento de aguas servidas Los Ríos y Los Jardines rehabilitada	Plantas				2,00				1.279.000,00
2.3. Cajas para medidores adquiridos	cajas		20.000,00		20.000,00	100.000,00	100.000,00		450.000,00
2.4. Medidores y cajas instalados.	Medidores				20.000,00	200.000,00			1.200.000,00
3. Obras de infraestructura									
3.1. Programa Macro y Micro-medición y control de fugas ejecutado	Programas				1,00	200.000,00			1.546.000,00
3.2. Programa de renovación y rehabilitación de redes troncales de agua potable existentes ejecutado	Programa				1,00	200.000,00			13.746.000,00
3.3. Programa de extensión en barrios carenciados de agua potable ejecutado	Programa				1,00				1.000.000,00
3.4. Diseños de obras de redes de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales preparados.	Programa				1,00				
3.5. Programa de rehabilitación de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas ejecutado	Programa		1,00		1,00	800.000,00	800.000,00		1.650.000,00
3.6. Programa de regularización de servicios a comunidades rurales conectadas a sistemas urbanos ejecutado	Programa								
3.7. Obras de emergencia Tormenta Noel implementada.	Obra				1,00		830.000,00		4.571.186,00
Otros Costos									
TOTAL						3.350.000,00	3.540.000,00		31.518.186,00
