
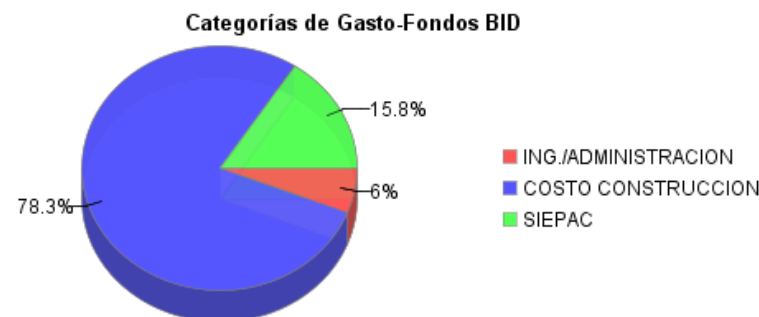
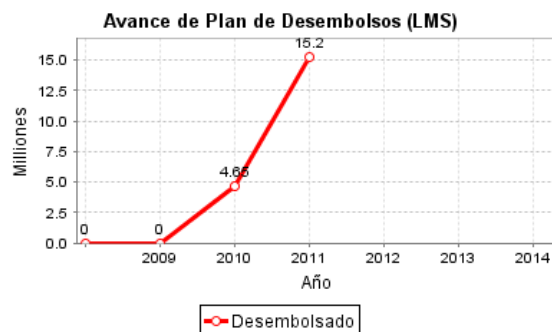



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		
Sector:	ENERGY-POWER LINES		
Número(s) de Préstamo:	2016/BL-HO	Monto Aprobado Actual:	28.550.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	15.201.467,27
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	53,25
Operación(es) Relacionada(s):	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039	Saldo:	13.348.532,73
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	28.550.000,00
		Actual BID:	28.550.000,00
		Pari-passu:	91,00
		Co-financiamiento/País:	2.760.000,00
		Estimado Original:	31.310.000,00
		Período de Amortización (meses):	282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 18-abr-2012 Validado por Representante de País: 26-abr-2012

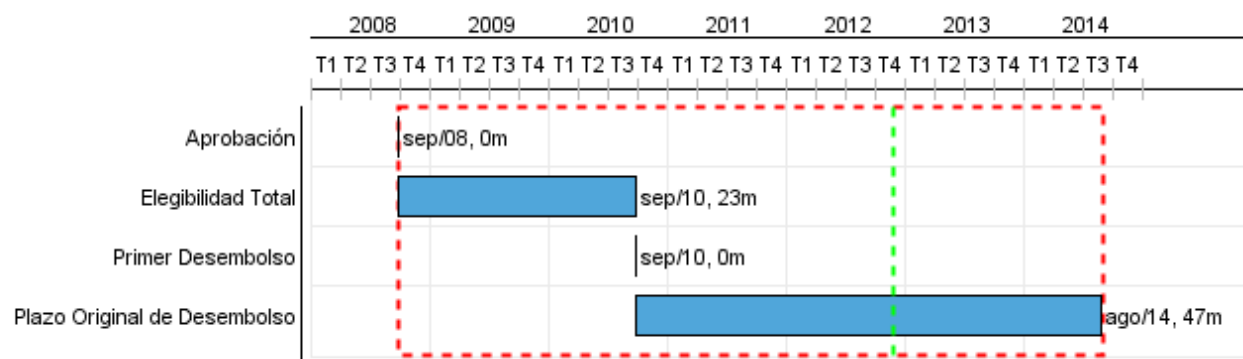

Progreso Acumulado al 2011

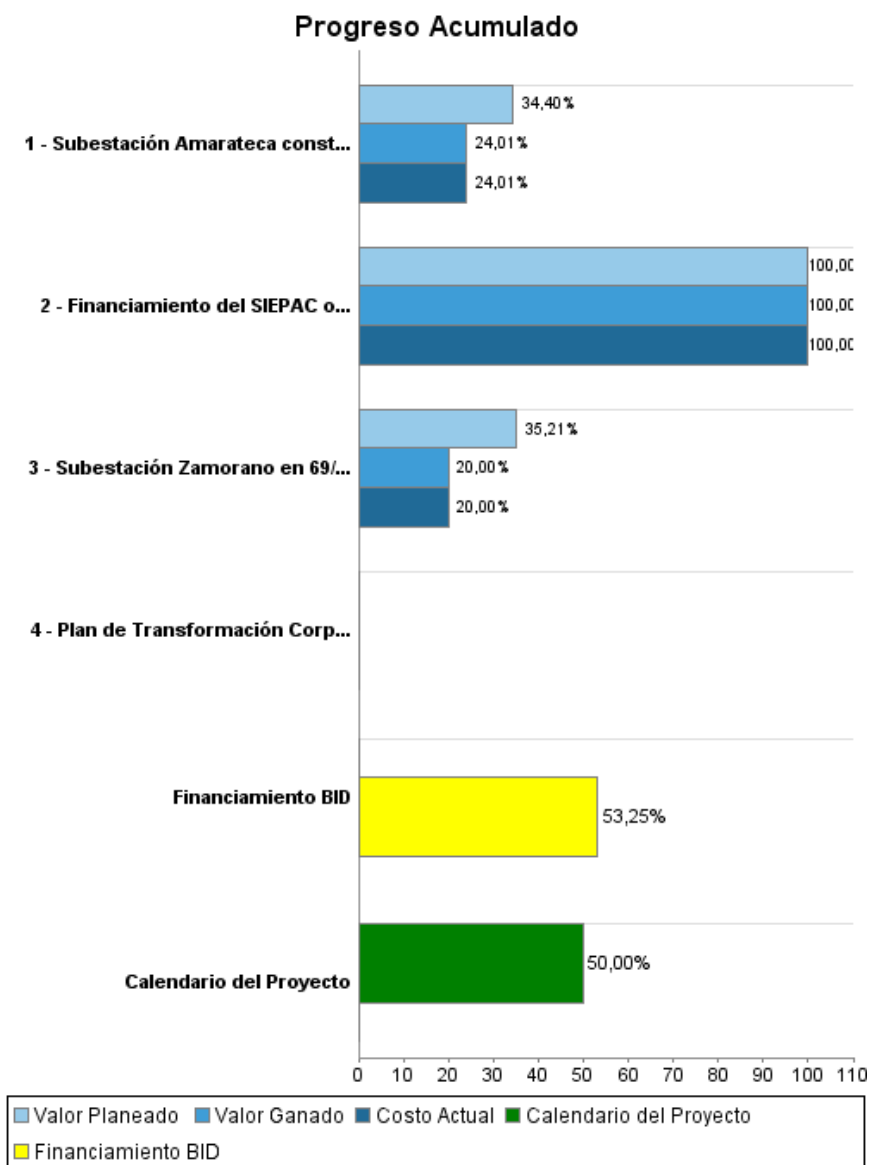

Resultados

Resultado:	Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca	MW		2007	P A	132,10
Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano	MW	6.40	2007	P A	8,40

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.									
Subestación Amarateca construida y en operación	Subestación				1,00	7.000.000,00	4.884.525,82		20.346.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00	440.300,00	250.102,80		1.250.500,00
Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00				750.000,00
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia				1,00				4.500.000,00
Gestión del Programa									
TOTAL						7.440.300,00	5.134.628,62		26.846.500,00
