
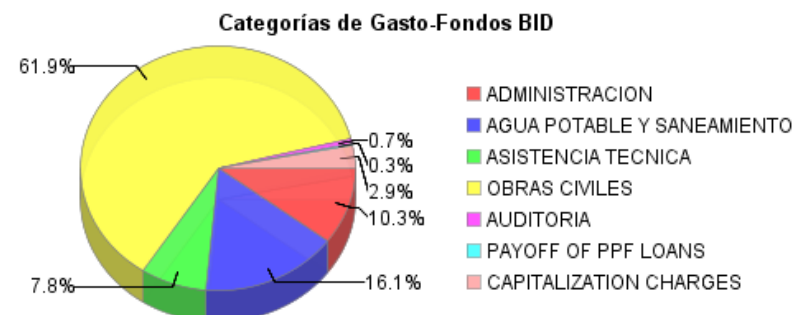
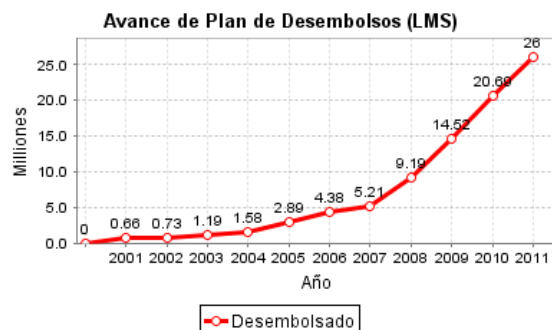



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE FINANZAS		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	1048/SF-HO	Monto Aprobado Actual:	26.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	26.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	HO0142, HO-X1004	Saldo:	
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples		
		BID Original:	26.000.000,00
		Actual BID:	26.000.000,00
		Pari-passu:	90,00
		Co-financiamiento/País:	214.640,00
		Estimado Original:	26.214.640,00
		Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B(R) ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 30-abr-2012 Validado por Representante de País: 30-abr-2012

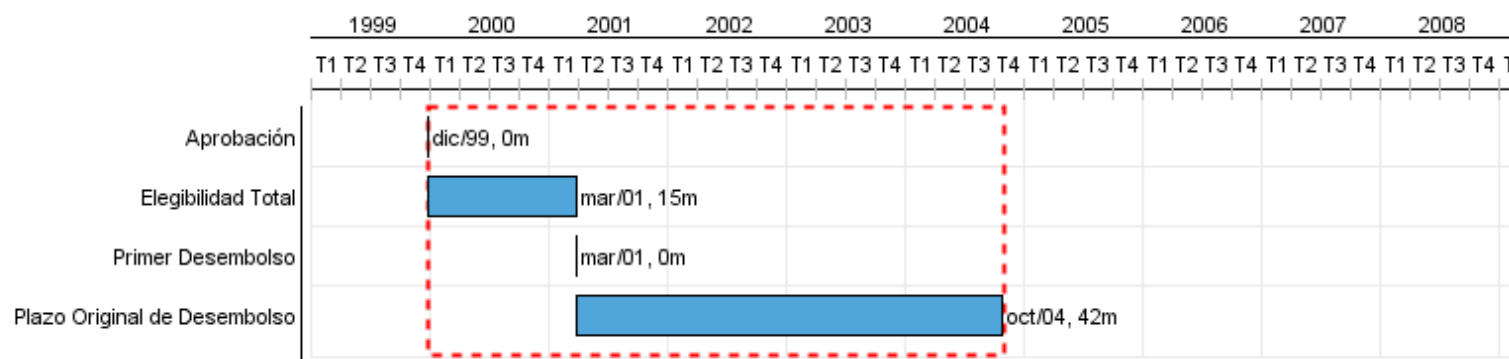

## Progreso Acumulado al 2011

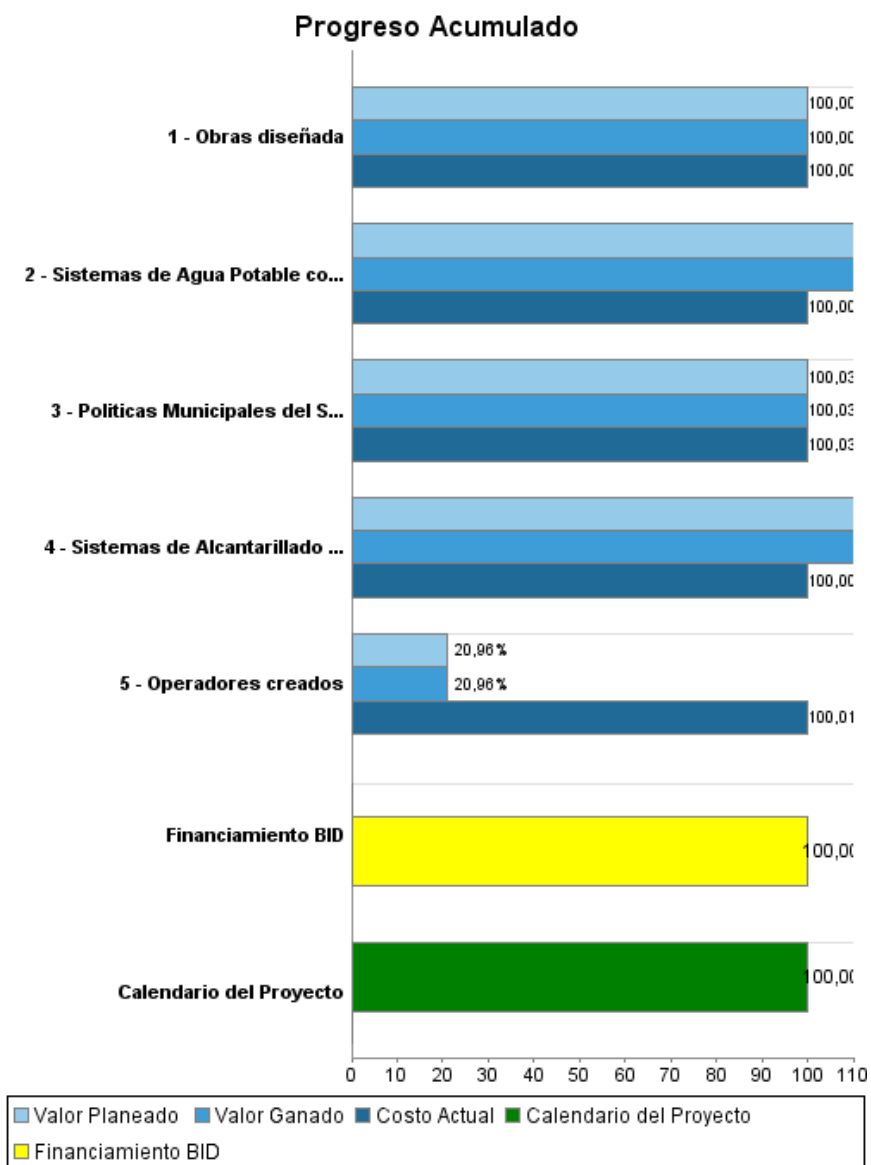

## Resultados

**Resultado:** Cobertura de agua potable mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable	Hogares	53,523.00	2001	P		79,703.00	79,303.00
				A	66,363.00	79,663.00	

**Resultado:** Cobertura de saneamiento mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado	Hogares	14,475.00	2005	P		22,947.00	22,947.00
				A	17,366.00	18,547.00	

**Resultado:** Gestión del Servicio de agua potable y saneamiento mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
Servicio diario de agua potable	horas diarias	7.70	2006	P		8.60	8,60
				A	8.30	11.91	
Cobertura de micro medición	%	21.00	2006	P		25.13	25,13
				A	24.55	29.71	
Promedio de Mora mensual	%	37.58	2006	P		23.84	23,84
				A	27.59	13.74	
Cobertura de sistemas de agua potable	%	79.14	2006	P		80.39	80,39
				A		84.54	

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Asistencia Técnica</b>									
Políticas Municipales del Sector Agua y saneamiento formuladas	Modelos de Gestion				27,00		1.046.682,00		1.669.682,00
Operadores creados	Operadores	1,00	1,00		3,00	122.080,00	1.028.065,00		1.146.065,00
Obras diseñada	Diseños				6,00				594.070,00
<b>Obras de infraestructura</b>									
Sistemas de Agua Potable construidos, ampliados o mejorados	Sistemas de agua	1,00	1,00		5,00	4.479.143,00	2.662.600,00		12.301.000,00
Sistemas de Alcantarillado construidos, ampliados o rehabilitados	Sistemas de alcantarillado	2,00	2,00		5,00	2.529.651,00	1.347.092,00		6.897.102,00
<b>Administración, Consultas y Preparación de Proyectos</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>7.130.874,00</b>	<b>6.084.439,00</b>		<b>22.607.919,00</b>
