

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS
Secteur: TRANSPORTATION
Numéro(s) de Prêt(s): 1294/OC-AR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): TC9803504
Sous-Type de l'Opération: GOM - Global of Multiple Works Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 200.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 148.647.308,78
% Décaissé: 74,32
Solde: 51.352.691,22

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 200.000.000,00
Courant BID: 200.000.000,00
Pari Passu: 28,70
Cofinancement/Pays: 80.000.000,00
Estimation Initiale: 280.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation

Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B




() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division:


Mar 31, 2011

Validé par le Représentant:

Apr 28, 2011

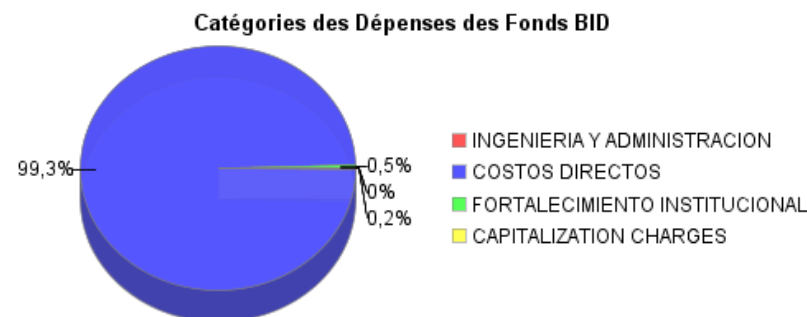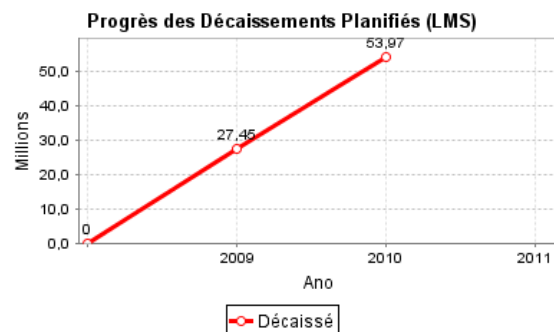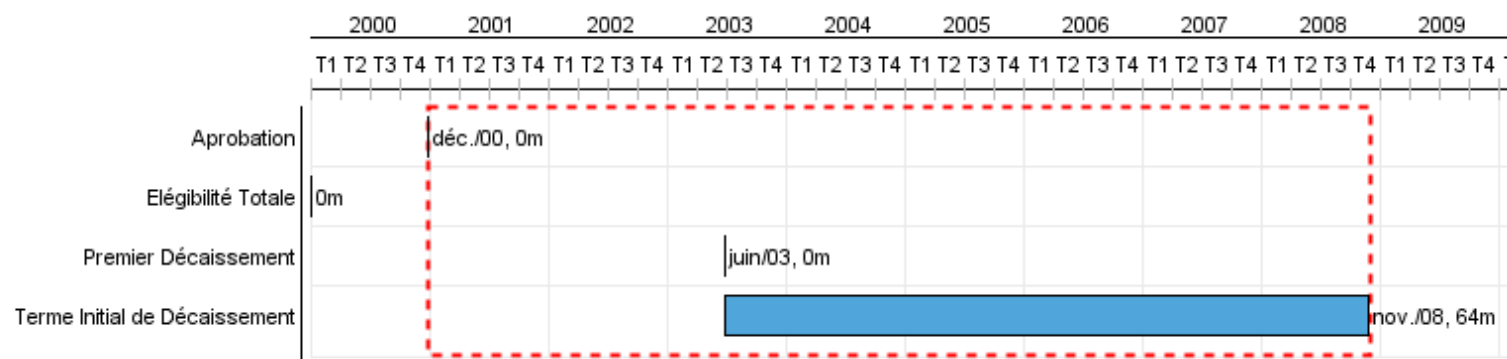

Progrès Cumulé à 2010

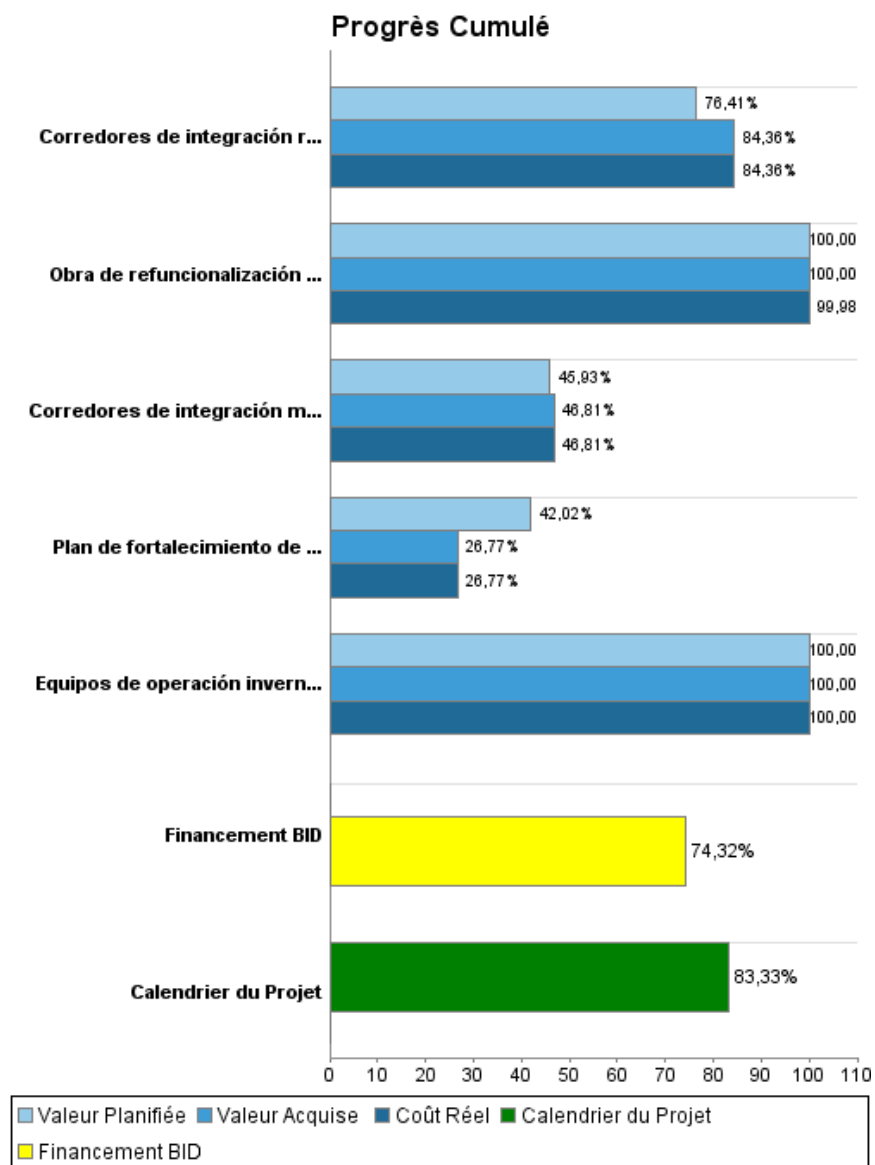

Résultats

Résultat: Nivel de servicio de las rutas y pasos fronterizos intervenidos mejorado.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Costos de operación de un camión tipo en pasos fronterizos (Ruta Nacional 14)	\$/km	1,42		P A	1,01
Tránsito con Chile por pasos mejorados (paso Cristo Redentor)	veh/año	1.300,00		P A	2.700,00
Costos de operación de un camión tipo en corredores mejorados (Ruta Nacional 16)	\$/km	1,30		P A	1,00
Alertas por avalanchas de nieve atendidas por el sistema en el Paso Cristo Redentor (a Chile)	Alertas			P A	3,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. Mejoramiento y Rehabilitación de Corredores Viales de Integración.									
Corredores de integración mejorados	Kilómetros		145,00		242,00	60.000.000,00	64.489.000,00		513.800.000,00
Corredores de integración rehabilitados	Kilómetros		68,00		68,00	3.500.000,00	5.759.000,00		28.400.000,00
2. Fortalecimiento Institucional									
Plan de fortalecimiento de la capacidad de la Dirección Nacional de Vialidad implementado	Plan				1,00	300.000,00	10.290,00		1.904.000,00
Obra de refuncionalización del campamento de la DNV en Uspallata, Ruta Nacional 7 terminada	Obra				1,00				1.754.000,00
3. Adquisición de equipos de operación									
Equipos de operación invernal adquiridos	equipos				9,00				5.152.391,00
4. Ingeniería y Administración									
TOTAL						63.800.000,00	70.258.290,00		551.010.391,00
