
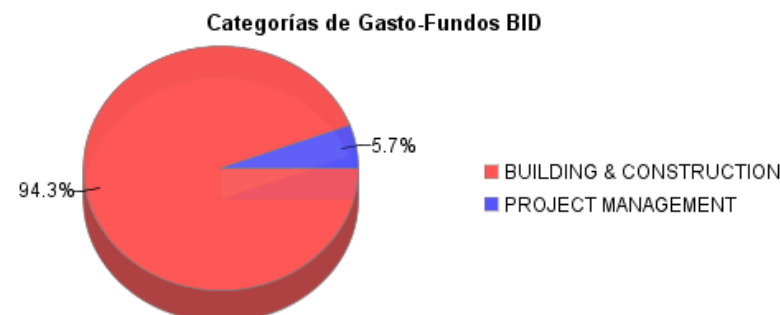
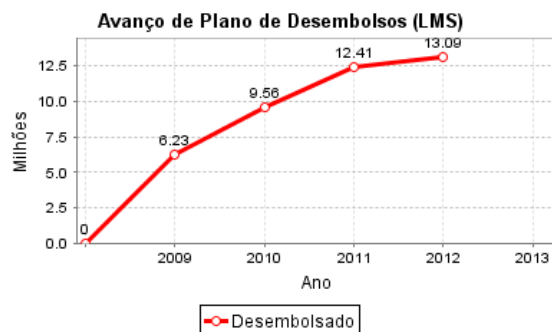


Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE		
Sector: EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Número da Operação: 2100/OC-JA	Atual: 14.000.000,00	Original BID: 14.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 13.094.957,01	Corrente BID: 14.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 93,54	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada:	Saldo: 905.042,99	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: SUP - Supplementary Financing		Original Estimado: 14.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 270

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 17-oct-2012 Validado pelo Representante do País: 18-oct-2012

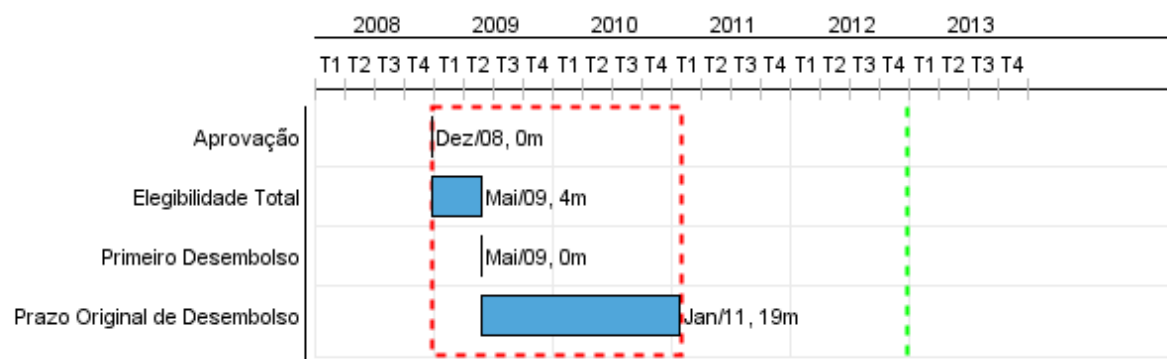

Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado

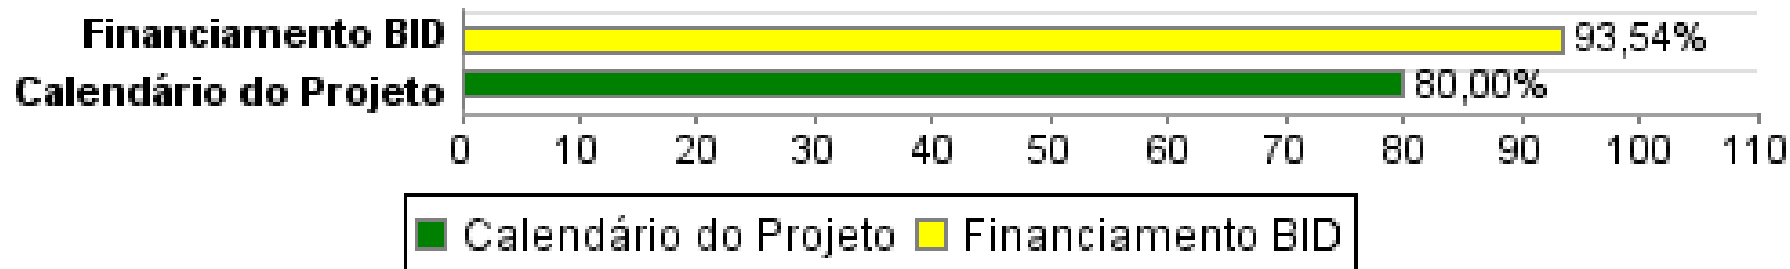

Resultados

Resultado: Occupancy rate reduced in benefited schools

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Occupancy rate in benefited schools	Ratio	186.00	2003	P		130.00		100.00	100.00
				A		106.00			
Students benefited by education projects	Students		2008	P	1,260.00	1,155.00		1,155.00	3,570.00
				A	1,260.00	1,155.00			

Resultado: Benefited schools maintained in good condition

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Maintenance plans delivered	Maintainance plans		2008	P	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00
				A	4.00	4.00	5.00		

Resultado: Schools de-shifted in 3 miles radius from new PESP schools

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
de-shifted schools	Schools		2008	P	1.00	4.00		4.00	4.00
				A					

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Civil works					
New schools built (Hellshire; Mansfield)	Schools	1,00			2,00
Schools partially replaced (Red Hills)	Schools	1,00	0,50		1,00
Existing schools expanded (Chester castle; Lucea Primary)	Schools				2,00
Schools fully replaced (Fruitfull Vale; Sheffield)	Schools				2,00
Project management	N/A				
Unallocated					
Unallocated funds	N/A				
