
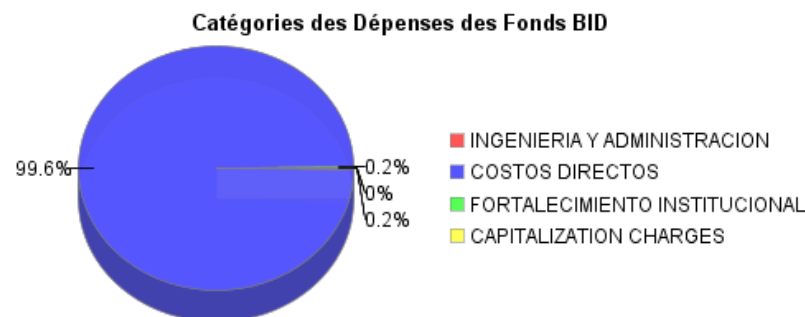
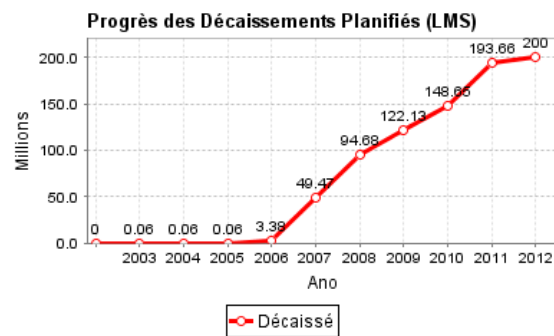



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS				
Secteur:	TRANSPORT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1294/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	200.000.000,00	Initial BID:	200.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	199.999.999,97	Courant BID:	200.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	50,00
Opération(s) Connexe(s):	TC9803504	Solde:	0,03	Cofinancement/Pays:	80.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	280.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012 Validé par le Représentant: 15-oct-2012

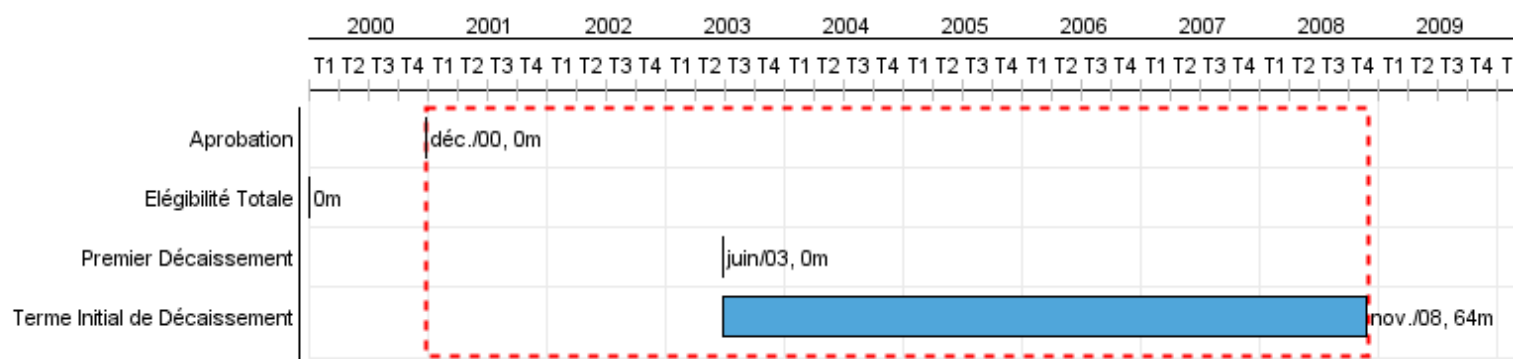

## Progrès Cumulé à 2012

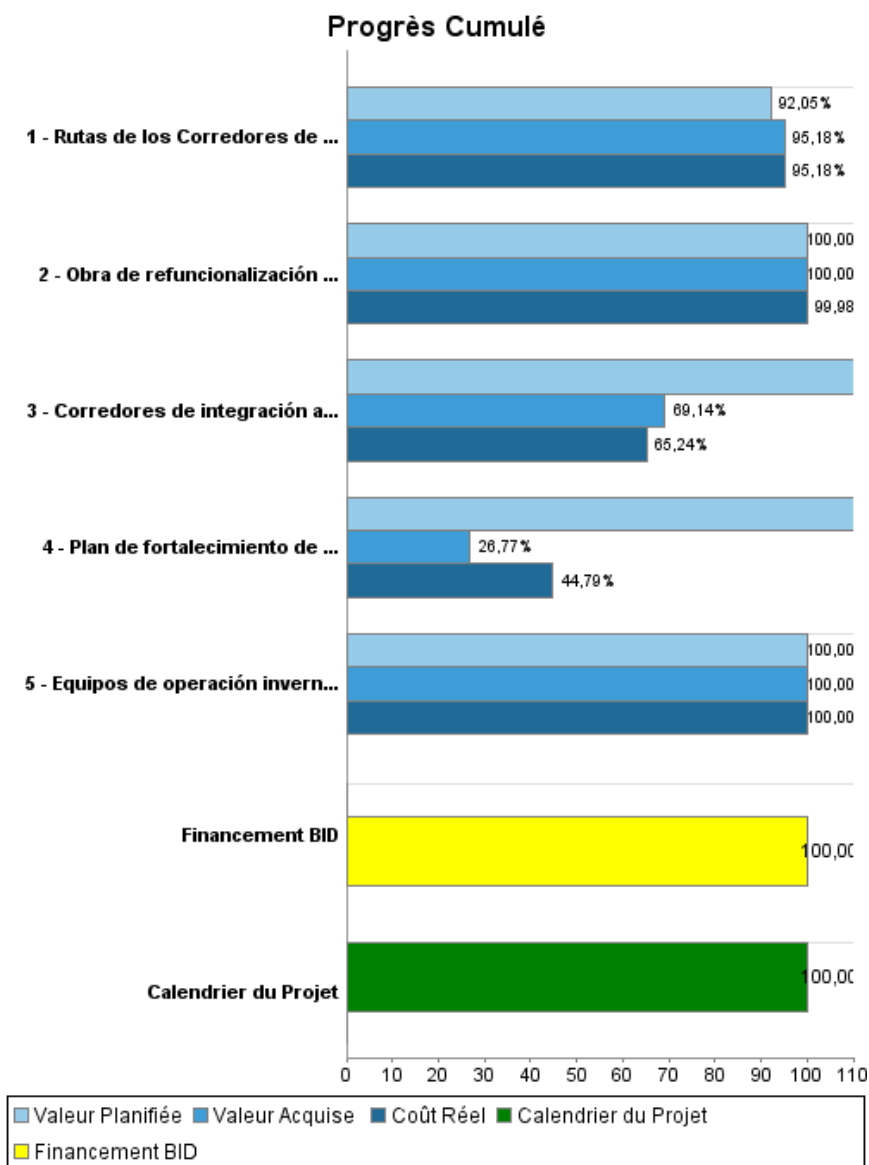

## Résultats

**Résultat:** Nivel de servicio de las rutas y pasos fronterizos intervenidos mejorado.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Costos de Transporte Reducidos	\$/km	1.42		P A	1.01
Tiempo de Viaje Reducido	\$/km	1.30		P A	1.00
Condiciones de Seguridad Mejoradas	Alertas			P A	3.00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>1. Mejoramiento y Rehabilitación de Corredores Viales de Integración.</b>									
Corredores de integración ampliados	Kilómetros	92,00	35,00		242,00	264.658.000,00	86.050.284,00		513.800.000,00
Rutas de los Corredores de integración rehabilitados	Kilómetros				68,00				28.400.000,00
<b>2. Fortalecimiento Institucional</b>									
Plan de fortalecimiento de la capacidad de la Dirección Nacional de Vialidad implementado	Plan				1,00				1.904.000,00
Obra de refuncionalización del campamento de la DNV en Uspallata, Ruta Nacional 7 terminada	Obra				1,00				1.754.000,00
<b>3. Adquisición de equipos de operación</b>									
Equipos de operación invernal adquiridos	equipos				9,00				5.152.391,00
<b>4. Ingeniería y Administración</b>									
Ingeniería y Administración	N/A								19.500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>264.658.000,00</b>	<b>86.050.284,00</b>		<b>570.510.391,00</b>
