
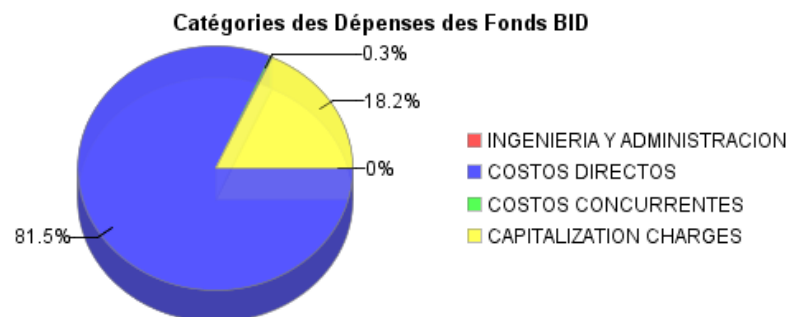




Rapport Résumé

| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | | Coût Total et Source de Financement | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Agence d' Exécution (EA): | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.E.S.P. | | | | |
| Secteur: | WATER AND SANITATION | | | | |
| Numéro(s) de Prêt(s): | 1199/OC-CO | Montant Courant Approuvé: | 25.090.000,02 | Initial BID: | 38.600.000,00 |
| Étape: | Approved | Montant Décaissé à ce Jour: | 25.090.000,02 | Courant BID: | 25.090.000,02 |
| Type d' Opération: | LON - Loan Operation | % Décaissé: | 100,00 | Pari Passu: | 49,06 |
| Opération(s) Connexe(s): | TC9607419 | Solde: | | Cofinancement/Pays: | 10.959.345,00 |
| Sous-Type de l'Opération: | ESP - Specific Investment Operation | | | Estimation Initiale: | 49.559.345,00 |
| | | | | Période d'Amortissement (mois): | 240 |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|--|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R) | () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 26-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012 |

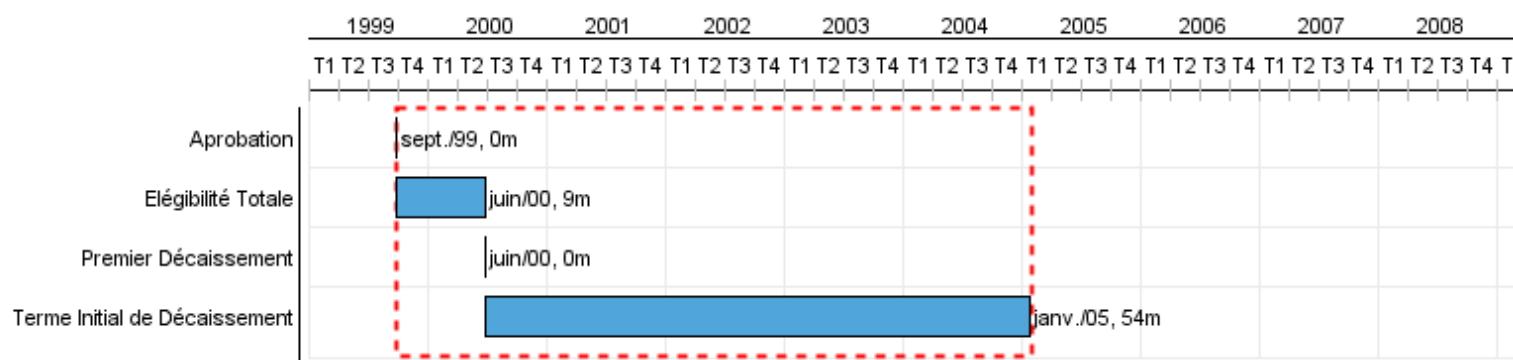

Progrès Cumulé à 2012

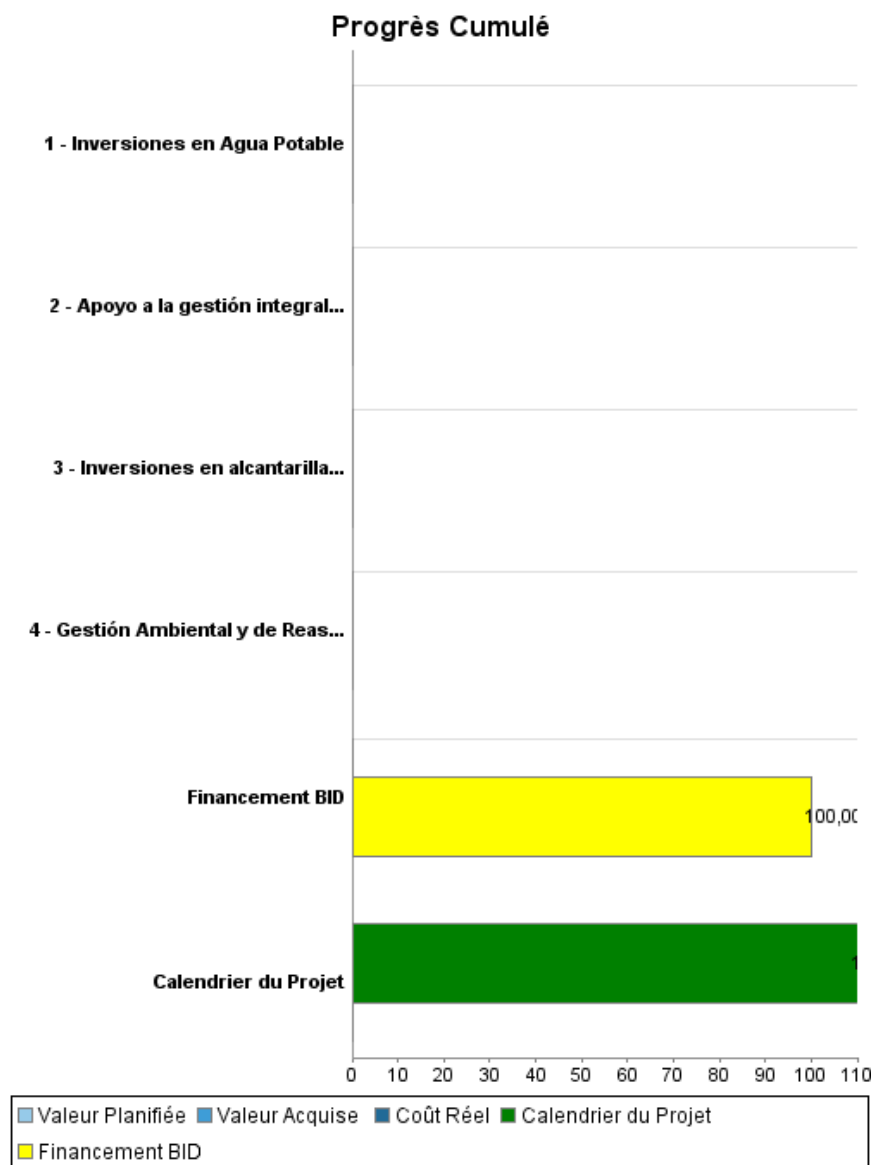

Résultats

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Pereira, proporcionando servicios de agua potable y saneamiento eficientes y de alta calidad bajo un esquema empresarial operativo y financieramente sustentable. |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2006 | 2008 | 2009 | Fin du Projet |
|--|-------------------------|---------------|---------------------|---|--------|--------|--------|---------------|
| 1.1 A. Cobertura de agua potable. | % de cobertura | 98.39 | | P | 96.87 | | 99.00 | 99.00 |
| | | | | A | | 99.04 | 100.00 | |
| 1.1.B. Cobertura de alcantarillado. | % de cobertura | 94.63 | | P | 93.25 | | 96.00 | 96.00 |
| | | | | A | | 94.58 | 96.88 | |
| 1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos | % Índice de continuidad | 99.61 | | P | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| 1.2.A. Continuidad del Servicio | | | | A | | 99.36 | 99.38 | |
| 1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos | % | 25.00 | | P | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| 1.2. B. Generación Interna de Caja | | | | A | | 25.00 | 25.00 | |
| 1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos. | % Margen | 61.34 | | P | 57.50 | | 56.00 | 56.00 |
| 1.2.C. Margen de Operación | | | | A | | 56.15 | 58.83 | |
| 1.2 Niveles eficientes de gestión para la EAAP en términos financieros y operativos. | % | 99.28 | | P | 97.00 | | 96.65 | 96.65 |
| 1.2.D. Eficiencia de Recaudo. | | | | A | | 98.17 | 99.20 | |
| 1.3 Capacidad de almacenamiento de agua potable. | *1000 M3 | | | P | 3.20 | | 8.20 | 8.20 |
| | | | | A | | 8.30 | 8.30 | |
| 1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas. | % | 38.00 | | P | 42.00 | | 75.00 | 75.00 |
| 1.4.A. Quebradas o ríos saneados | | | | A | | 71.00 | 90.00 | |
| 1.4 Porcentaje de quebradas afluentes de los ríos que cruzan la ciudad saneadas y aguas residuales de los sistemas Otún y Consota interceptadas. | % | 19.00 | | P | | | 70.00 | 70.00 |
| 1.4.B. Aguas Residuales Interceptadas. | | | | A | | 49.80 | 88.00 | |
| 1.5 Agua no contabilizada (IANC). | % | 36.72 | | P | 34.00 | | 30.00 | 30.00 |
| | | | | A | | 31.68 | 29.94 | |
| 1.6 Familias marginadas de la zona suroccidental de la ciudad con servicios de agua potable. | % | 100.00 | | P | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| | | | | A | | 100.00 | 100.00 | |

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|--|-----------------|----------|------|-----------------|------------|-----------|------|----------------|-----------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Inversiones en alcantarillado realizadas. | | | | | | | | | |
| Inversiones en alcantarillado realizadas. | | | | | | | | | |
| Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas | | | | | | | | | |
| Gestión Ambiental y de Reasentamiento concluidas | | | | | | | | | |
| Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira | | | | | | | | | |
| Apoyo a la gestión integral de Aguas y Aguas de Pereira | | | | | | | | | |
| Inversiones en Agua Potable | | | | | | | | | |
| Inversiones en Agua Potable | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
