
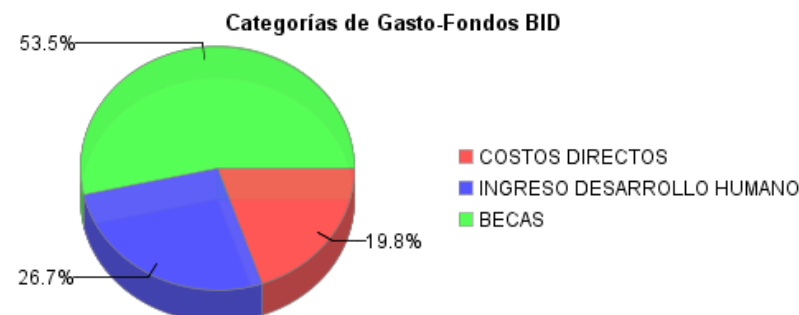
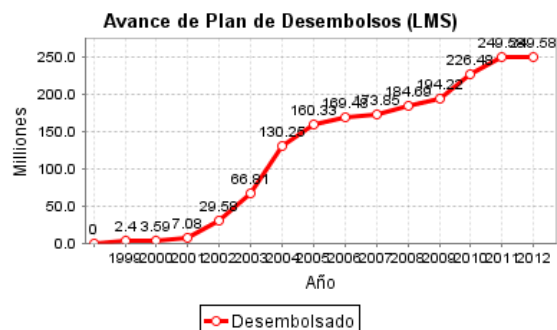



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	COMITE EJECUTOR MATANZA-RICHUELO		
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número(s) de Préstamo:	1059/OC-AR	Monto Aprobado Actual:	249.579.963,99
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	249.579.963,99
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	AR0217	Saldo:	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	250.000.000,00
		Actual BID:	249.579.963,99
		Pari-passu:	50,00
		Co-financiamiento/País:	250.000.000,00
		Estimado Original:	500.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	150

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B(R) ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 26-sep-2012 Validado por Representante de País: 15-oct-2012

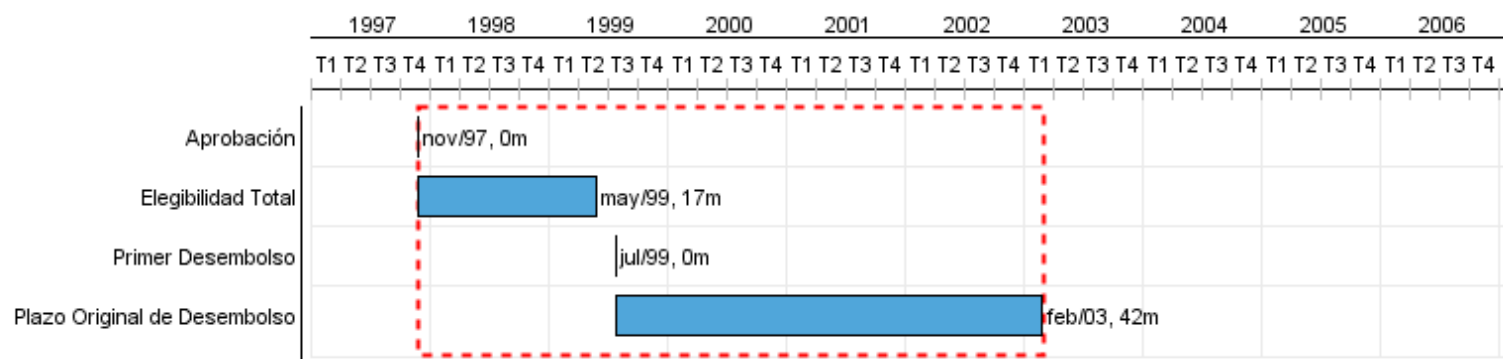

## Progreso Acumulado al 2012

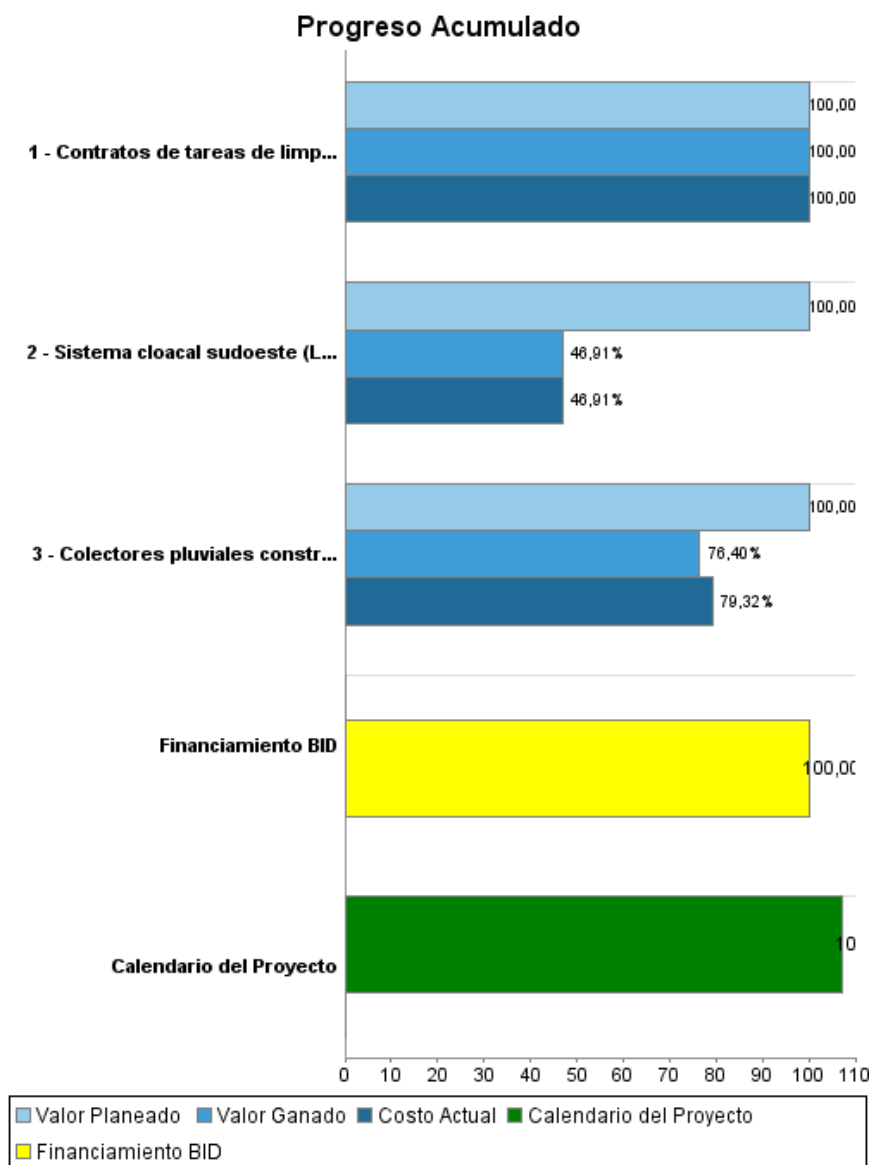

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Cobertura de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo incrementada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	Fin de Proyecto
Hogares con servicio de saneamiento nuevo	Hogares		2006	P A		49,000.00

<b>Resultado:</b>	Riesgo de inundaciones reducido
-------------------	---------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	Fin de Proyecto
Habitantes beneficiados por las obras de drenaje pluvial	habitantes		2006	P A		427,000.00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Obras de drenaje urbano</b>									
Colectores pluviales construidos	km				32,30				28.946.000,00
<b>Limpieza de márgenes</b>									
Contratos de tareas de limpieza de márgenes finalizados	Contratos				1,00				1.451.000,00
<b>Saneamiento cloacal</b>									
Sistema cloacal sudoeste (LaFerrere) construido	Sistemas				1,00				59.498.000,00
<b>Administración, supervisión y costos financieros</b>									
Administración, supervisión y costos financieros	N/A								668.000,00
Estudios y consultorías realizadas	N/A								432.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>90.995.000,00</b>
