
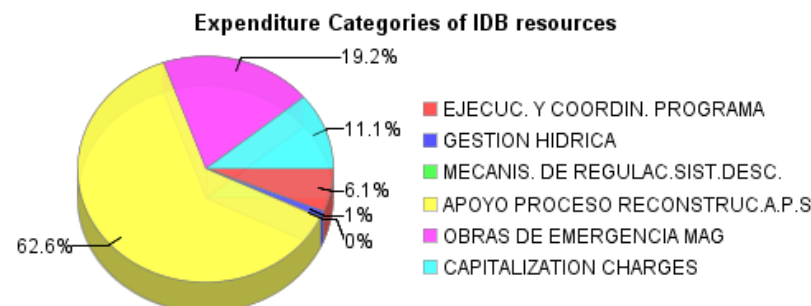




## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	COMISION COORDINADORA DE REFORMA SECTORIAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	1102/OC-ES	Current Approved Amount:	41.575.465,57	Original IDB:	43.700.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	41.575.465,57	Current IDB:	41.575.465,57
Operation Type:	LON - Loan Operation	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	73,50
Related Operation(s):	TC9911141	Balance:		Co-Financing/Country:	11.300.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	55.000.000,00
				Amortization Period (months):	162

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2012 Validated by Country Representative: 28-sep-2012

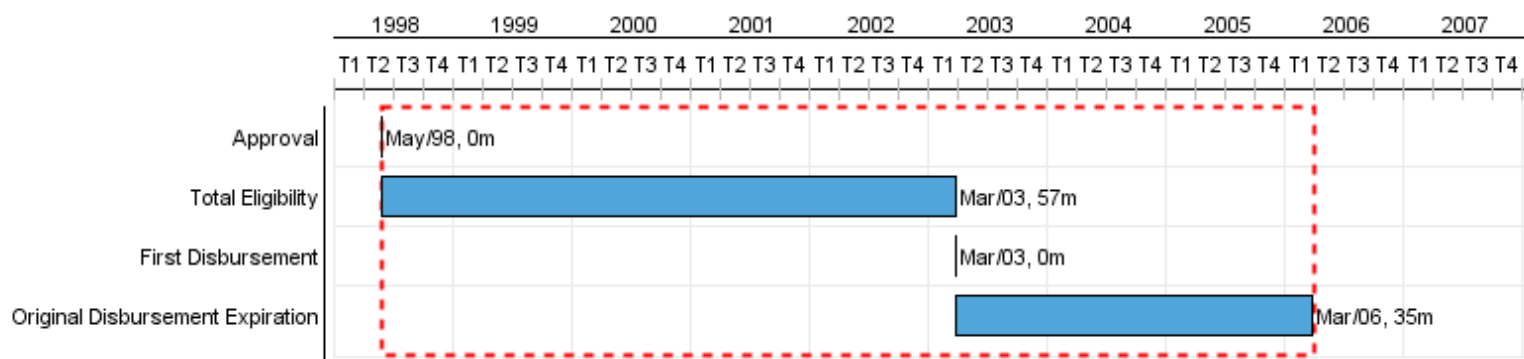

## Accumulated Progress as of 2012

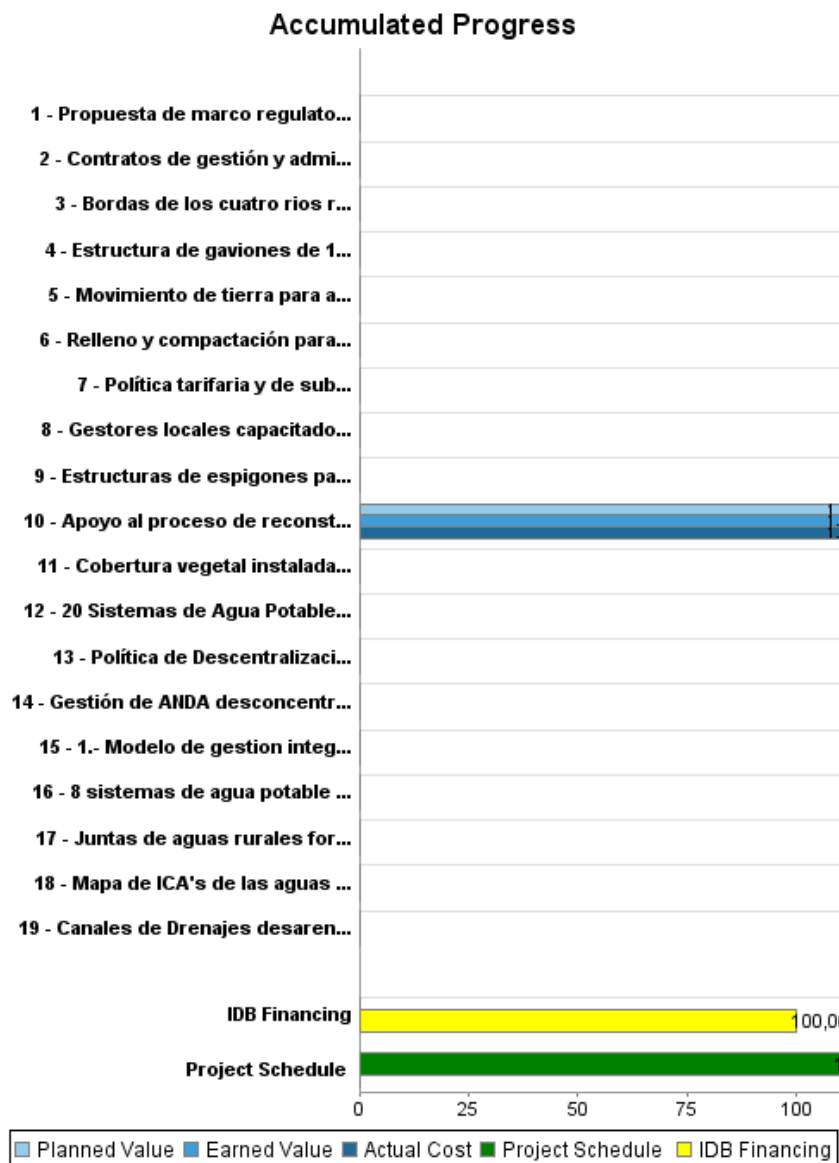

## Outcomes

**Outcome:** Mejorar los niveles de cobertura y calidad de los servicio de agua potable, por medio de la prestación del servicio por empresas descentralizadas Sostenibles

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	End of project
Empresas descentralizadas operando sistemas de agua potable cumplen con indices de sostenibilidad financiera y de eficiencia en la continuidad de la prestación del servicio de AP, publicado por la unidad de contratos de gestión y/o administración de s	Empresas		1998	P	12.00	16.00	16.00
				A	15.00	15.00	

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>1.- Gestión Hídrica en apoyo a la reconstrucción de sistemas de agua potable y saneamiento descentralizados funcionando</b>									
1.- Modelo de gestion integral de cuenca hidrografica implentado y operando en dos microregiones en donde existen Empresas descentralizadas	U.				2,00				
Mapa de ICA's de las aguas superficiales y subterráneas publicado y actualizado de dos microregiones en donde existen empresas descentralizadas	U.				2,00				
Gestores locales capacitados en gestión de recursos hídricos en empresas descentralizadas	U.				6,00				
<b>2. Mecanismos Reguladores desarrollados y operando en los sistemas de agua potable y saneamiento reconstruidos y descentralizados.</b>									
Propuesta de marco regulatorio y tarifario para la prestación de servicios de las APS	Propuesta presentada				1,00				
Contratos de gestión y administración para la prestación de los servicios de agua potable implementados con empresas descentralizadas	Contratos de administración				10,00				
Política tarifaria y de subsidios operando en empresas de APS descentralizadas	contratos de administración que incorporan las regulaciones del rubro de tarifas y subsidios				10,00				
Política de Descentralización y desconcentración de ANDA aprobada	documento de política aprobado				1,00				
<b>Obras de Emergencia del MAG</b>									
Bordas de los cuatro rios rehabilitados y/o reconstruidas	metros lineales				9.500,00				
Canales de Drenajes desarenados y limpiados	metro lineal				33.500,00				
Cobertura vegetal instalada para proteger taludes de bordas	metros cuadrados				36.250,00				

# PROGRESS MONITORING REPORT

ES0068 - Water and Sewer Program

2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 17/09/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Movimiento de tierra para ampliación de sección hidráulica de ríos	metros cúbicos				40.000,00				
Relleno y compactación para estabilización de bordas	metros cúbicos				10.366,00				
Estructura de gaviones de 1mt x 1mt x 1mt instalados	metro lineal				13.176,00				
Estructuras de espigones para protección de las bordas	Espigones				46,00				
<b>Apoyo al proceso de reconstrucción de sistemas de agua potable</b>									
Apoyo al proceso de reconstrucción de sistemas de agua potable	%				100,00				1.416.040,43
8 sistemas de agua potable rurales rehabilitados	No. de sistemas rurales rehabilitados				8,00				
20 Sistemas de Agua Potable rehabilitados y ampliados en empresas descentralizadas	No. de sistemas intervenidos				20,00				
Gestión de ANDA desconcentrada en aquellos sistemas no descentralizados	%				100,00				
Juntas de aguas rurales fortalecidas	Juntas de Agua				8,00				
<b>TOTAL</b>									<b>1.416.040,43</b>
