
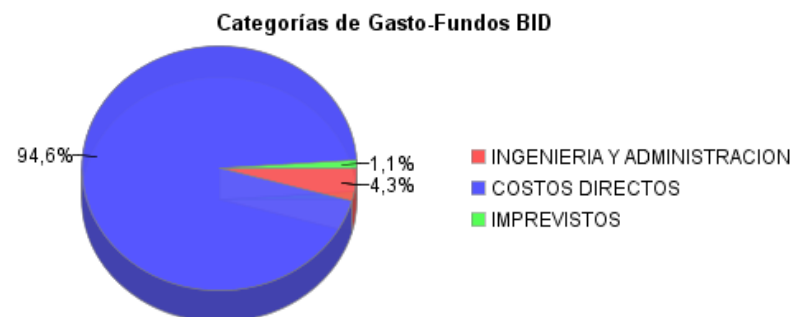
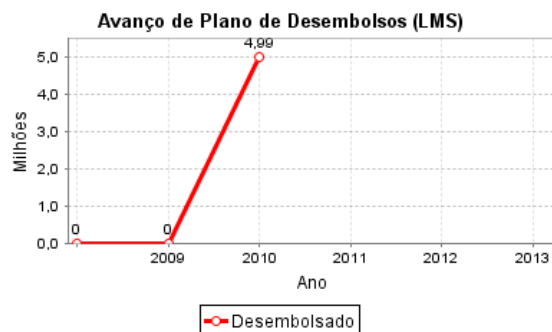



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Administradora Boliviana de Carreteras		
Sector: TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS		
Número da Operação: 1940/BL-BO	Atual: 21.000.000,00	Original BID: 21.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 6.015.624,66	Corrente BID: 21.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 28,65	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: BO-T1065	Saldo: 14.984.375,34	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 21.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 28, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011

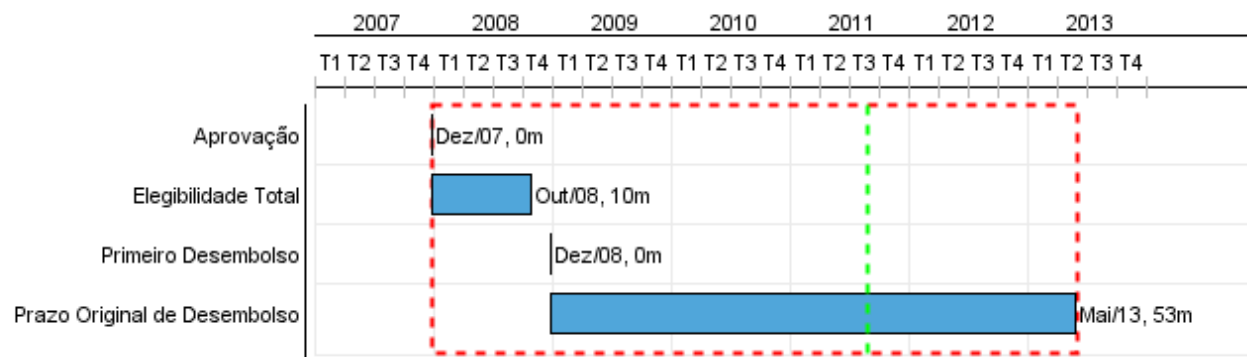

Progresso Acumulado até 2010

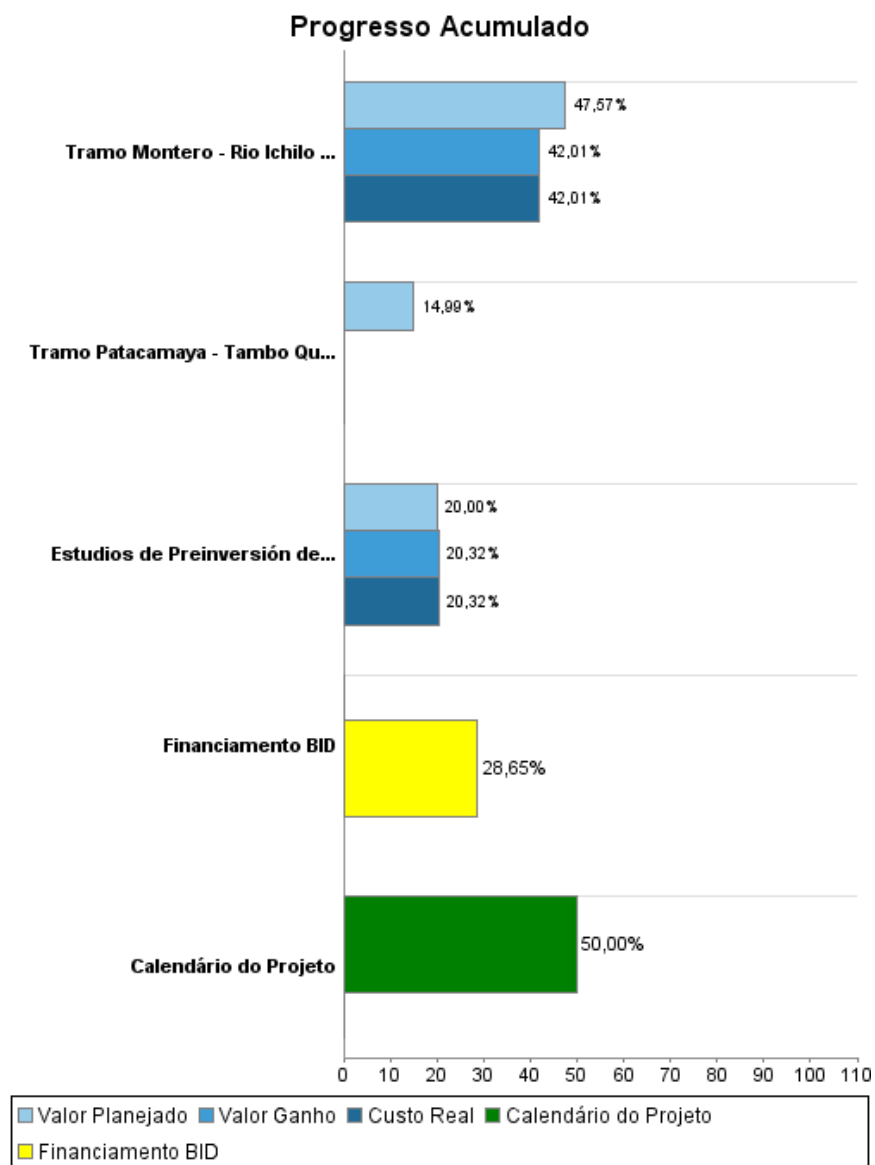

Resultados

Resultado:	Patrimonio vial del pais preservado
-------------------	-------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Promedio anual del Indice de servicio reportado mensualmente por las superviciones	Porcentaje	50,00	2009	P A	90,00	90,00	90,00
Cobertura de kilometros pavimentados	km/km2	5,00	2010	P A	5,00		5,00

Resultado:	Incremento de la seguridad vial en los tramos intervenidos por el programa.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Incremento de la seguridad vial	Porcentaje promedio	50,00	2010	P A			90,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Obras de mantenimiento vial por estándares									
Tramo Montero - Rio Ichilo - Ivirgarzama - Puerto Villarroel - Mantenimiento por Estándares y Obras obligatorias	Kilómetros				219,00	5.483.562,00	4.842.510,00		11.526.200,00
Tramo Patacamaya - Tambo Quemado - Mantenimiento por Estándares y Obras obligatorias	Kilómetros				188,00	1.218.750,00			8.130.000,00
Componente 2. Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión de la ABC									
Componente 3. Ingeniería y Administración									
Estudios de Preinversión de proyectos que posibiliten replicar la modalidad al resto de la red ejecutados	Estudios				2,00	30.000,00	30.480,00		150.000,00
TOTAL						6.732.312,00	4.872.990,00		19.806.200,00
