
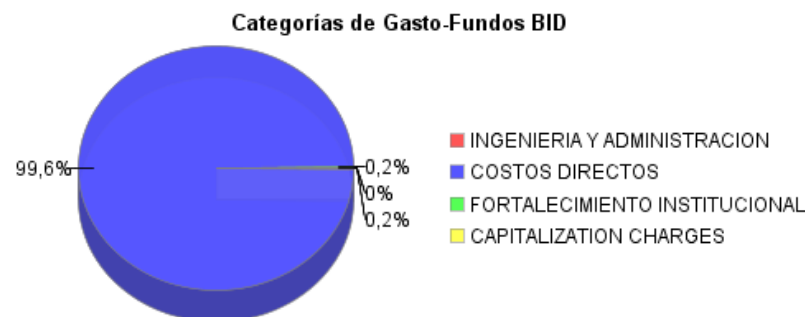
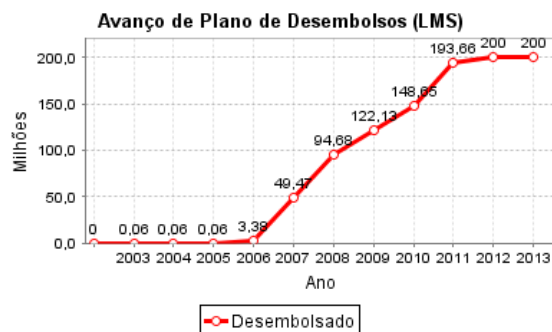



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS		
Sector:	TRANSPORT		
Número da Operação:	1294/OC-AR	Atual:	200.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	199.999.999,97
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	100,00
Operação Relacionada:	TC9803504	Saldo:	0,03
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation		
		Original BID:	200.000.000,00
		Corrente BID:	200.000.000,00
		Pari-passu:	50,00
		Cofinanciamento/País:	200.000.000,00
		Original Estimado:	400.000.000,00
		Período de Amortização (meses):	162

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013

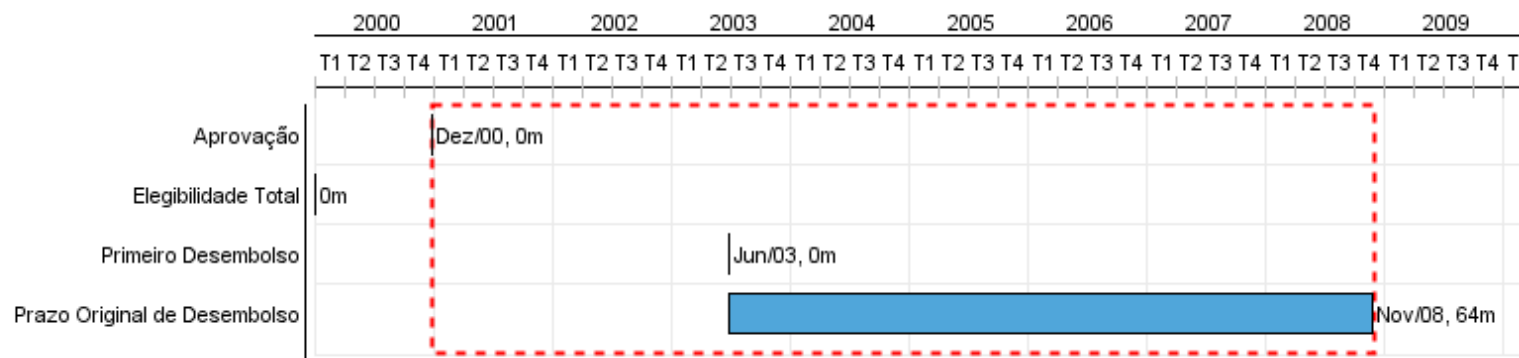

Progresso Acumulado até 2012

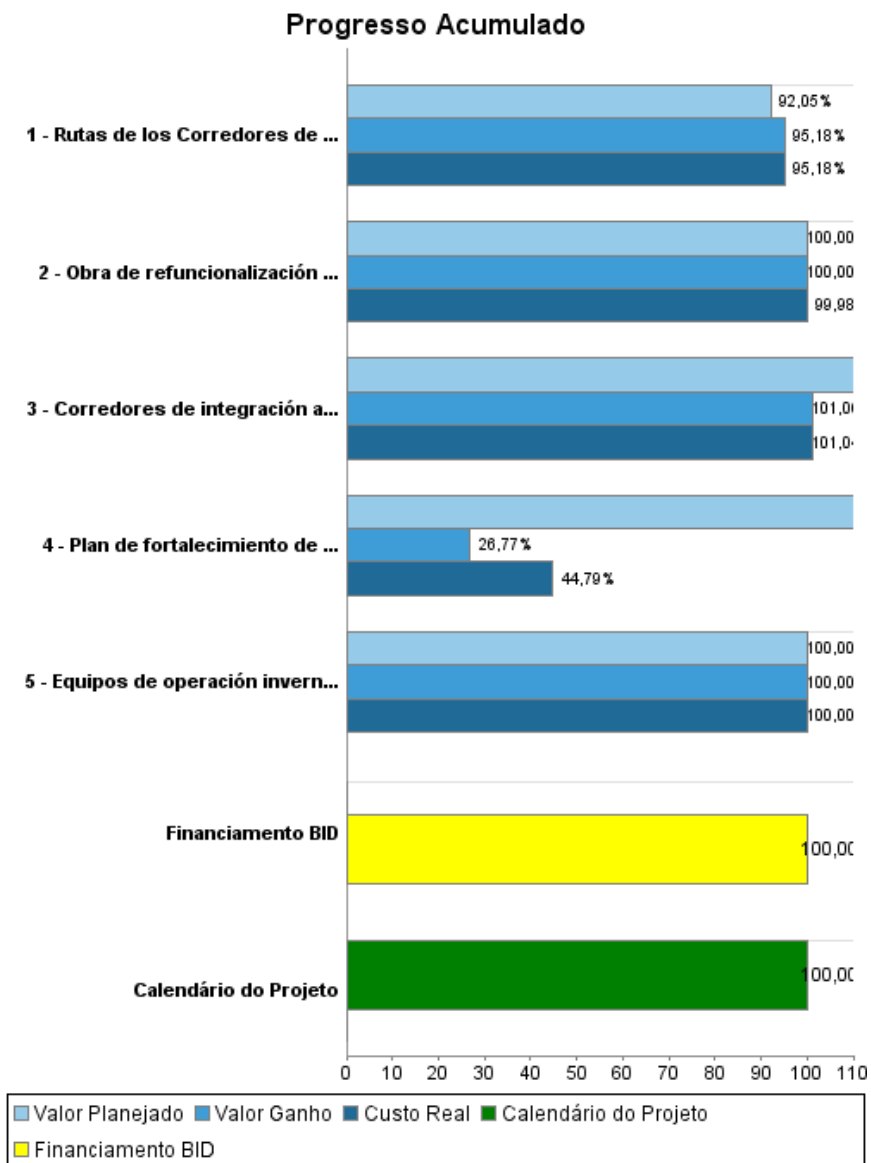

Resultados

Resultado:	Nivel de servicio de las rutas y pasos fronterizos intervenidos mejorado.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Costos de Transporte Reducidos	\$/km	1,42		P A	1,01
Tiempo de Viaje Reducido	\$/km	1,30		P A	1,00
Condiciones de Seguridad Mejoradas	Alertas			P A	3,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Mejoramiento y Rehabilitación de Corredores Viales de Integración.									
Corredores de integración ampliados	Kilómetros	92,00	92,00		242,00	264.658.000,00	270.000.000,00		513.800.000,00
Rutas de los Corredores de integración rehabilitados	Kilómetros				68,00				28.400.000,00
2. Fortalecimiento Institucional									
Plan de fortalecimiento de la capacidad de la Dirección Nacional de Vialidad implementado	Plan				1,00				1.904.000,00
Obra de refuncionalización del campamento de la DNV en Uspallata, Ruta Nacional 7 terminada	Obra				1,00				1.754.000,00
3. Adquisición de equipos de operación									
Equipos de operación invernal adquiridos	equipos				9,00				5.152.391,00
4. Ingeniería y Administración									
Ingeniería y Administración	N/A								19.500.000,00
TOTAL						264.658.000,00	270.000.000,00		570.510.391,00
